ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-1-254с. 92

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 700 КУБ М

АЛЬБОМ 6

ПМ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

25610-06

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-1-254 с. 92

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 700 КУБ.М

АЛЬБОМ 6

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1 ПЗ	Пояснительная записка
ТХ	Оборудование технологическое, электротехническое, автоматики
АЛЬБОМ 2 КМ	Конструкции металлические
АЛЬБОМ 3 КЖ	Основания и фундаменты
АЛЬБОМ 4 ТИ1	Тепловая изоляция
АЛЬБОМ 5 ТИ2	Основные положения по монтажу теплоизоляционных конструкций
АЛЬБОМ 6 ПМ	Основные положения по монтажу металлических конструкций
АЛЬБОМ 7 СО	Спецификации оборудования
АЛЬБОМ 8 ВМ	Ведомости потребности в материалах
АЛЬБОМ 9 С	Сметы

Разработан
ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖОМ
главный инженер института /И.С. Гольденберг/
главный инженер проекта /А.В. Рохин/

Утвержден и введен в действие
протоколом Сантехниипроекта от 19 октября 1992 года № 35

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

© АО ЦИТП 1993

25610-06 2

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
6	Ведомость оборудования, инструмента и материалов для производства сварочных работ резервуара	
7	График производства работ	
8	Схема строительного генерального плана	
9	Общий вид резервуара	
10	Монтаж днища резервуара	
12	Разметка днища	
13	Подъем рулона стенки резервуара	
16	Установка монтажной стойки	
18	Развертывание полотнища стенки резервуара	
21	Монтаж покрытия	
24	Замыкание вертикального монтажного стыка стенки резервуара	
26	Демонтаж монтажной стойки	
27	Монтаж площадок обслуживания и ограждений резервуара	
28	Испытания резервуара	
31	Сварка днища	
32	Сварка стенки	
34	Сварка крыши	
36	Сварка люков, патрубков и ограждений	

1. Общая часть

Типовой проект „Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута ёмкостью 700 куб.м выполнен по плану типового проектирования Госстроя СССР на 1991г., тема ТП 7-3-13 в соответствии с заданием, утвержденным Сантехниипроектом.

Стадия разработки – рабочий проект.

В типовом проекте:

альбом 6 – „Основные положения по монтажу металлических конструкций"

"содержит технологические схемы монтажа и сварки резервуара ёмкостью 700куб.м из элементов, поступающих на монтаж с завода-изготовителя.

1.1. В основу альбома 6 при разработке настоящего проекта положены следующие материалы:

1) задание на проектирование, утвержденное Сантехниипроектом;

2) альбом 2 „Конструкции металлические."

1.2. Альбом 6 разработан на основе положений следующей нормативно-технической документации:

1) СНиП 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие конструкции";

2) СНиП III-4-80* „Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве."

2. Поставка металлоконструкций

2.1. Металлоконструкции резервуара емкостью 700 куб.м с щитовой крышей поставляют на монтажную площадку с завода-изготовителя в следующем виде:

1) полотнища днища, стенки – свёрнутыми в рулон на каркасе или шахтной лестницы;

2) площадки обслуживания – сварными транспортабельными секциями; крыша – щитами;

3) люки, патрубки – с ответными фланцами (заглушками) и комплектом болтов.

3. Приемка основания и требования к нему

3.1. При приемке основания проверяют:

1) общее состояние основания, соответствие его проекту, наличие актов на скрытые работы;

2) правильность разбивки осей резервуара на основании, шахтной лестницы, наличие репера, определяющего центр основания;

3) соответствие толщин, технологического состава гидроизолирующего слоя и степень его уплотнения;

4) обеспечение отвода поверхностных вод от основания.

3.2. Разность отметок любых несмежных точек основания 20 мм.

3.3. Устройство проектного бетонного поддона вокруг основания следует выполнять после монтажа металлоконструкций резервуара.

4. Требования к монтажной площадке

4.1. До начала монтажа металлоконструкций резервуара должны быть выполнены следующие работы:

1) построено и принято основание под резервуар;

2) устроены временные подъезды (не менее двух) к основанию для транспортировки металлоконструкций;

3) спланирована и уплотнена кольцевая площадка вокруг основания для работы крана и других механизмов.

Площадка должна быть уплотнена до несущей способности, отвечающей паспортным характеристикам применяемого механизма;

4) произведена общая планировка территории монтажной площадки с уклоном для отвода поверхностных вод;

5) подведена электроэнергия для обеспечения работы грузоподъемных механизмов, сварочного оборудования, ручного механизированного инструмента и освещения;

6) уложен трубопровод для подачи и слива воды при гидроиспытании резервуара;

7) устроены площадки для складирования металлоконструкций резервуара и сборки;

8) установлены все временные здания и сооружения, необходимые для нормальной работы производственного персонала.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами

Главный инженер проекта Л.В. Рохин

ГИП САН ТехНИПроекта	Мыскин			ТП 704-1-254 с. 92 ПМ		
Привязан				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб.м.	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Лушонов				РП	1	38
Гл.спец.	Рохин		11.91	Общие данные (Начало)	Госстрой СССР Гипрокоммунстрой г. Москва	
Н.контр.	Панова		11.91			
Инж.	Пак					
Инв. №						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

25610-06 3

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Раздел содержит краткое описание процессов монтажа резервуара в их технологической последовательности.

При разработке проекта производства работ на основании данного альбома монтажные краны и другие механизмы подбираются из условий строительства конкретного объекта.

5.1. Монтаж днища:

1) днище резервуара, поставляемое с завода-изготовителя, разворачивают на основании с помощью двух тракторов;

2) укладывают развернутые полотнища с помощью трактора в проектное положение, ориентируя относительно осей I-III, II-IV.

5.2. Установка монтажной стойки.

Монтажную стойку устанавливают в центре днища резервуара.

Перед установкой стойку собирают с центральным щитом крыши, устанавливают на щите временное кольцевое ограждение, закрепляют расчалки и монтажную лестницу.

Установленную в вертикальное положение монтажную стойку расчаливают тремя расчалками и проверяют ее вертикальность по отвесу.

5.3. Подъем рулона стенки в вертикальное положение.

Рулон с полотнищем стенки поднимают с одной стоянки крана изменением вылета стрелы, при этом нижний конец рулона опирается на грунт.

Кран устанавливают на площадке, имеющей несущую способность не менее 0,5 МПа (5 кгс/см²), с уклоном не более 1° в любую сторону.

Подъем рулона до отклонения производят, чередуя операции:

1) подъем рулона до отклонения грузового полиспаста крана от вертикали на допустимый угол с контролем по рискам на угловом секторе, закрепленном на рулоне;

2) разворотом стрелы крана до отклонения полиспаста на допустимый угол с контролем по отвесу и установленным шнуром.

При достижении рулоном положения неустойчивого равновесия включают в работу тормозной канат, закрепленный на тракторе. Трактором плавно устанавливают рулон в вертикальное положение на грунте. Переместив кран в положение два, устанавливают рулон на днище резервуара.

5.4. Развертывание рулона стенки.

Развертывание рулона стенки резервуара производят с помощью трактора за тяговую скобу.

По мере развертывания рулона монтируют щиты крыши.

Развернув полотнище стенки приступают к сборке и сварке вертикального монтажного стыка.

5.5. Монтаж крыши.

Щиты крыши резервуара устанавливают в процессе разворачивания рулона стенки.

Первый щит устанавливают с кольцевым (проектным) и радиальным (временным) ограждениями.

Последующие щиты крыши устанавливают с кольцевым (проектным) и радиальным на длине 1м (временным) ограждениями.

Перед установкой к подкладным листам настила каждого щита приваривают ловители.

При установке каждого щита в проектное положение опускают его вершину на центральный щит и закрепляют монтажными болтами, а затем опускают основание щита на стенку резервуара, опирая на все ловители.

Высадить на щит и производить расстроповку можно только после приварки его к центральному щиту. Последний щит крыши устанавливают после замыкания и сварки вертикального монтажного стыка стенки резервуара. До установки щитов крыши в проектное положение и в процессе их монтажа необходимо постоянно следить за вертикальностью стенки и монтажной стойки. Контроль производят по отвесам.

5.6. Испытание резервуара.

По окончании всех сборочных и сварочных работ, а также контроля сварных соединений приступают к испытанию резервуара.

На днище резервуара производят контроль всех 100% заводских швов на герметичность.

До начала испытаний выполняют все подготовительные работы:

1) монтируют подводящие трубопроводы для подачи и слива воды;

2) производят нивелировку наружного контура днища, выполняют замеры геометрических размеров и отклонений корпуса резервуара.

Испытания резервуара на прочность и устойчивость производят в следующей последовательности:

1) корпуса на прочность - гидравлическим испытанием наливом воды до проектной отметки и выдержкой под нагрузкой 24 часа;

2) крыши на герметичность - пробным избыточным давлением воздухом 100мм вод.ст.

После проведения прочностных испытаний производят необходимые измерения металлоконструкций и основания резервуара. Допустимые отклонения от геометрических размеров корпуса резервуара даны на соответствующих технологических листах альбома.

6. Общие положения по сварке

Технология сварки резервуара емкостью 700 куб.м. для мазута разработана на основании чертежей альбома 2 и настоящего альбома 6 проекта, СНиП 3.03.01-87.

Металлические конструкции резервуара изготовлены из стали С245 марки ВСт3пс6 и ВСт3пс2 по ГОСТ 380-88*.

Сварные монтажные соединения элементов резервуара выполнять ручным электродуговым способом электродами марки ЦОНИ-13/45 типа Э42А по ГОСТ 9467-75 диаметром 3и4мм.

6.1. Подготовка узлов резервуара к сварке

6.1.1. Перед сборкой необходимо проверить:

1) качество изготовительных конструкций внешним осмотром;

2) соответствие металла требованиям проекта (по сертификатам и маркировке на стальных листах);

3) отсутствие расслоений на кромках;

4) соответствие собираемых элементов монтажной схеме, проектным размерам и геометрической форме;

5) правильность подготовки кромок под сварку.

Обнаруженные отклонения должны быть устранены.

6.1.2. В случае возникновения необходимости подгонки листовых элементов по месту обрезку производить механическим способом или газовой резкой

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с.92

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:				ТП 704-1-254 с.92	ПМ
Инж.-стр.	Ларионов			Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб.м.	Стадия: РП; Лист: 2; Листов: 1
Гл. спец.	Розин		11.91	Общие данные (продолжение)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва
Инв.№	Инж. Ларионов				

с последующей зачисткой шлифмашинками.

6.1.3 Сборку конструкций производить с использованием сборочных приспособлений в соответствии с настоящим проектом и с помощью прихваток. Минимальная длина прихватки должна быть не менее 30÷50 мм. Расстояние между прихватками не более 400÷500 мм. Катет шва прихватки должен быть не менее половины катета шва.

6.1.4. Форма среза кромок и размеры зазоров при сборке сварных соединений показаны на чертежах.

6.1.5. Перед сваркой следует зачистить свариваемые кромки и прилегающие к ним зоны металла на ширину не менее 20 мм от грязи, масла и других загрязнений, осушить от влаги.

6.1.6. После удаления сборочных приспособлений остатки швов в местах их приварки следует зачистить заподлицо с поверхностью основного металла и подрезы глубиной более 1 мм подварить и зачистить.

6.1.7. К сварке резервуара допускаются сварщики не ниже 4 разряда, аттестованные в соответствии с „Правилами аттестации сварщиков", утвержденными Госгортехнадзором СССР, и сварившие контрольные образцы.

6.1.8. Перед началом сварочных работ сварщики должны сварить контрольные пластины из стали ВСт3пс6 и ВСт3пс2 размером 400×200×4 в вертикальном положении с разделкой кромок, тождественной при сварке на монтаже.

6.1.9. Из сваренных контрольных пластин после просвечивания или УЗК изготовить и испытать образцы для механических испытаний по ГОСТ 6996-65:

1) для испытания на статическое растяжение при температуре +20°С - 2 образца (типа XII, XIII или XIV);

2) для испытания на статический изгиб (загиб) при температуре +20°С - 2 образца (типа XXVII, XXVIII).

Временное сопротивление сварных соединений должно быть не ниже минимального значения временного сопротивления основного металла, угол загиба не менее 120°.

При получении неудовлетворительных результатов механических свойств производится повторное испытание удвоенного количества соответствующих образцов.

6.1.10. Все сварочные материалы должны соответствовать стандартам и иметь сертификаты завода-изготовителя.

6.1.11. Сварочные материалы перед сваркой необходимо прокалить:

Электроды марки УОНИ-13/45 при температуре 350°÷370°С в течение 1,5-2 часов.

6.1.12. Электроды после прокалки по вышеприведенному режиму рекомендуется хранить в печи хранения при температуре 70-100°С.

6.1.13. Прихватки выполнить теми же электродами что и сварку. После зачистки прихваток произвести проверку их качества. Дефектные прихватки вышлифовать и выполнить вновь.

6.1.14 При сварке производить тщательную зачистку каждого слоя, остатки шлака между слоями недопустимы.

6.1.15 В стыковых соединениях с разделкой кромок обязательна вышлифовка корня шва перед сваркой с обратной стороны разделки и подварка.

6.1.16 Перед сваркой рекомендуется отработать режимы на пробных пластинах в условиях, тождественных с теми, в которых будет выполняться сварка на монтаже.

6.1.17. Для выполнения сварочных работ электроды выдаются сварщику в количестве, необходимом для полусменной работы. Полученные электроды следует содержать во влагонепроницаемом закрытом пенале. После работы все оставшиеся электроды подлежат возврату на склад и затем эти электроды подвергаются вторичной прокалке, тем же методом для повторного использования.

6.1.18 Удаление прихваток и корня шва, а также снятие усиления, зачистку шва, удаление дефектных мест и т. д. рекомендуется осуществлять с помощью высокооборотных электрических шлифмашинок.

6.1.19. Процесс сварки необходимо вести на стабильном режиме. Допускаемые отклонения принятых значений силы тока и напряжения дуги не должны превышать ±5%.

6.1.20 После окончания сварки электросварщики должны простукать приваренные им клейма на расстоянии 40÷50 мм от оси шва в начале и конце стыка.

6.2. Рекомендации по организации сварочных работ.

6.2.1. Сварочный участок необходимо комплектовать сварочным оборудованием, инструментом и материалами в соответствии с ведомостью.

6.2.2. Сварочными работами должен руководить квалифицированный специалист по сварке.

6.2.3. Для производства сварочных работ необходимо следующий численный состав исполнителей (в одну смену) чел:

1) мастер по сварке - 1
2) электросварщики по ручной дуговой сварке (не ниже 4 разряда) - 2
3) газорезчики (не ниже 4 разряда) - 1
4) оператор по контролю качества сварных швов неразрушающими методами - 1
5) слесарь-монтажник - 1

6.2.4 К началу производства сварочных работ следует:

1) обеспечить объект всей необходимой документацией по сварке;

2) установить силовые пункты питания электроэнергией („сварки") и проверить работу всего сварочного оборудования;

3) в непосредственной близости от места производства сварочных работ установить переносные металлические будки с размещенными в них сварочной аппаратурой и источниками питания;

4) оборудовать кладовую для хранения сварочных материалов и установить в ней печь с температурой до 500° для прокалки и просушки;

5) опробовать оборудование, электроды и подобрать режимы сварки на контрольных образцах;

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Согласовано:						ТП 704-1-254 с. 92 ПМ	
			Нач. отд.	Лаврентьев		Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб.м.	Стадия: РП; Лист: 3; Листов:
			Гл. спец.	Рихин	11.91	Общие данные (Продолжение)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва
			Гл. инж. пр.	Панова	11.91		
Инв. №			Инж.	Пан			

в) оградить свариваемые поверхности конструкций и рабочее место сварщика от атмосферных осадков и ветра;

г) проверить состояние изоляции сварочных кабелей и правильность присоединения их к клеммам источников постоянного тока;

д) проверить арматуру газовых баллонов, рукава для кислорода и горючих газов, а также инструмент для газопламенной обработки металлов.

6.2.5. Сварочные посты должны быть снабжены контрольно-измерительной аппаратурой.

6.2.6. Источники сварочного тока рекомендуется устанавливать в закрытых переносных машинных залах не далее 50 м от места сварки.

6.2.7. Разделку кромок вертикального монтажного стыка производить газовой резкой с применением специальных приспособлений.

6.3. Контроль качества сварных соединений.

6.3.1. Контроль качества сварных соединений должен выполняться в соответствии с требованиями глав 4 и 8 СНиП 3.03.01.-87.

6.3.2. Все 100% сварных швов должны быть подвергнуты внешним осмотрам и измерению шаблонами по ГОСТ 3242-79. При внешнем осмотре рекомендуется применять лупу с 5-10 кратным увеличением.

6.3.3 По внешнему виду швы сварных соединений должны удовлетворять следующим требованиям:

1) иметь гладкую или равномерночешуйчатую поверхность (без наплывов, прожогов, сужений и перерывов) и не иметь резкого перехода к основному металлу.

Угловые швы должны выполняться с плавным переходом к основному металлу;

2) наплавленный металл должен быть плотным по всей длине шва, не иметь трещин и дефектов, выходящих за пределы, указанные в п. 6.4;

3) подрезы основного металла допускаются глубиной не более 0,5 мм при толщине стали от 4 до 10 мм;

4) все кратеры должны быть заварены.

6.3.4. Объём и методы контроля указаны на чертежах.

6.4. Допустимые дефекты швов при радиационном контроле следующие:

6.4.1 Для соединений, доступных для сварки с двух сторон, и соединений на подкладках допускаются непровары в корне шва высотой до 5% толщины свариваемого проката, но не более 2 мм и длиной не более удвоенной длины оценочного участка;

6.4.2 Для соединений без подкладок, доступных для сварки с одной стороны, допускаются непровары в корне шва высотой до 15% толщины свариваемого проката, но не более 3 мм;

6.4.3. Для всех соединений.

Удлиненные и сферические дефекты:

1) одиночные высотой не более 0,8 мм;

2) образующие цепочку или скопление пор высотой не более 0,4 мм и длиной не более длины оценочного участка;

3) удлиненные протяженностью не более 3,75 мм.

4) непровары, цепочки и скопления пор, соседние по длине шва, суммарные в продольном сечении шва с расстоянием между близлежащими концами не менее 200 мм и суммарной площадью на оценочном участке не более 3 мм^2.

Чувствительность контроля радиографией устанавливается по третьему классу согласно ГОСТ 7512-82.

6.4.4 Сварные соединения днищ резервуара должны быть проверены на непроницаемость вакуумированием.

Браковочным признаком является появление воздушных пузырьков воздуха на шве, смоченном мыльным индикаторным составом, при перепаде давлений под вакуумной рамкой 500-600 мм рт. ст.

6.4.5 Непроницаемость сварных соединений стенок резервуара с днищем должна быть проверена керосином или вакуумированием.

Браковочным признаком является проявление пятен керосина на обмыленной поверхности швов.

6.4.6 Сварные соединения покрытия резервуара следует контролировать на герметичность при избыточном давлении до 200 мм вод. ст.

Браковочным признаком негерметичности швов является появление воздушных пузырьков на смоченной мыльным индикаторным составом поверхности швов.

6.4.7. Сварные соединения люков и патрубков на вертикальной стенке резервуара должны быть проверены на герметичность смачиванием керосином до сварки усиливающих колец.

Сварочные соединения люков и патрубков покрытия резервуара должны быть проверены на герметичность при испытании резервуара избыточным давлением по пункту 6.4.6.

6.5. Исправление дефектов сварочных соединений.

6.5.1 Недопустимые дефекты, обнаруженные в сварных швах, устраняются под наблюдением мастера по сварке.

6.5.2. Выявленные неразрушающими методами контроля внутренние дефекты удаляются из швов при помощи шлифмашинок с последующей сваркой и повторным контролем исправленных участков сварного шва.

6.5.3. Исправление одного и того же дефектного места допускается не более 2^{х} раз.

Сведения об исправлении дефектов и количестве исправлений заносятся в сварочный журнал.

6.5.4 Швы неполного сечения должны быть доварены до проектного размера.

6.5.5. Участок шва с порами, непроварами и т. п. удалить на длину дефектного участка плюс 15 мм с каждой стороны и заварить вновь.

6.5.6. В швах с трещинами начало и конец трещины засверлить, удалить на длину дефектного места плюс 15 мм с каждой стороны и заварить вновь.

6.5.7. Дефекты сварных соединений заварить с применением электродов меньшего диаметра и на минимальных режимах сварки, установленных технологическим процессом.

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Альбом 6

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. № 19

Начальник	Петрова		
Гл. спец.	Ратин		11.91
Контр.	Пилова		11.91
Инж.	Ник		

ТП 704-1-254 с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб. м.

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

Общие данные (Продолжение)

Гипронефтемаш монтаж г. Москва

25610-06 6

7. Требования безопасности труда

7.1. Требования безопасности труда при монтаже.

При выполнении монтажных работ необходимо руководствоваться следующими основными положениями:

1) до начала работ необходимо подробно ознакомиться с данным проектом;

2) при перекатывании рулона, как впереди, так и сзади него не должны находиться люди;

3) при подъёме рулона в зоне подъёма (в радиусе 25м) не должны находиться люди. Опасную зону оградить предупредительными знаками;

4) в процессе развертывания рулона стенки люди не должны находиться в непосредственной близости от освобождающегося вала полотнища. Запрещается пребывание людей вблизи каната, с помощью которого производится развертывание;

5) запрещается пребывание людей под поднимаемым грузом и в зоне действия стрелы грузоподъёмного механизма;

6) при подъёме и спуске по лестнице монтажнику необходимо закрепиться предохранительным поясом за скобу ПВУ-2, установленную на верхней части лестницы;

7) все колодцы, лотки траншей и другие коммуникации, находящиеся на пути грузоподъёмных транспортных машин, должны быть ограждены хорошо видимыми указателями;

8) лица, выполняющие работы на высоте трех метров и более, обязаны пользоваться ящиками или сумками для инструмента и крепежных материалов, опускать все необходимые для работы предметы веревкой;

9) вновь изготовленные леса, подмости и т. п. должны быть испытаны и приняты комиссией с участием представителей органов техники безопасности и устанавливаться под наблюдением ответственного лица.

7.2. Требования безопасности труда при сварке.

При выполнении сварочных работ необходимо руководствоваться следующими основными положениями:

1) сварщик перед началом сварочных работ должен пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.3.003-75 и главой СНиП по технике безопасности в строительстве;

2) металлические части основного и вспомогательного электросварочного оборудования (источники питания, сушильные печи и др.) не находящиеся под напряжением, а также сварливаемые изделия должны быть заземлены;

3) присоединение и отключение от сети источников питания дуги и другого оборудования выполняет электрик, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III;

4) при сварке в резервуаре сварщик, кроме обычной рабочей одежды обязан использовать диэлектрические перчатки, галоши и коврик;

5) сварочные кабели, шланги, подведенные к рабочим местам должны быть защищены от возможных повреждений. Сварочные провода должны быть изолированы. Соединять концы сварочного кабеля следует с помощью специальных муфт. Подключение проводов к сварочному оборудованию выполнять через кабельные наконечники;

6) источники сварочного тока должны быть вынесены за пределы резервуара.

7.3. Дополнительные меры по электробезопасности.

7.3.1. При внесении внутрь монтируемого резервуара напряжения 220/380 в необходимо принять дополнительные меры от поражения рабочих недопустимо большим током согласно ПУЭ.

7.3.2 Для снижения токов однофазного замыкания необходимо применять разделяющие трансформаторы, причем каждый трехфазный электроприемник, вносимый внутрь резервуара должен присоединиться к отдельному трансформатору.

7.3.3. Для защиты от двухфазного замыкания необходимо применять быстродействующие отключающие устройства типа УЗКИ или ПЗК.

7.3.4. При невозможности обеспечить выполнение вышеуказанных требований электробезопасности необходимо:

1) освещение внутри резервуара обеспечить светильниками напряжением 12 в, питающимся от трансформаторов с раздельными обмотками первичного и вторичного напряжения. Один из выводов вторичной обмотки должен быть заземлен. Применение автотрансформаторов внутри резервуара запрещается;

2) электроинструмент на напряжение выше 12 в заменить на пневматический.

7.3.5. Все металлические леса, электрооборудование и механизмы, которые могут оказаться под током, должны быть надежно заземлены.

8. Действующие правила техники безопасности

Во всем остальном, неоговоренном в предыдущем разделе, необходимо руководствоваться следующими нормами, правилами и инструкциями по технике безопасности:

1) СНиП III-4-80 „Строительные нормы и правила. Техника безопасности в строительстве";

2) ГОСТ 12.1 046-85 „Нормы электрического освещения строительных и монтажных работ";

3) „Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов";

4) „Типовая инструкция для строительщиков (такелажников, стропальщиков), обслуживающих грузоподъёмные краны;

5) „Руководство по производственной санитарии на строительно-монтажных работах, разделы 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10.

6) ВСН 351-89 „Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов."

Альбом 6

Типовой проект 704-1-25Мс. 92

								ТП 704-1-25Мс. 92			ПМ
Произвел:								Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения нефти емкостью 700 куб. м.	Стадия	Лист	Листов
				Нач. отд.	Лебедев				РП	5	
				Гл. спец.	Рогин		11.91	Общие данные (Окончание)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
				Н. контр.	Попова		11.91				
Инв. №				Утв.	Пол						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

25610-06 7

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Ведомость оборудования, инструмента и материалов для производства сварочных работ.

Номер пп	Наименование	Марка, тип	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Сварочное оборудование				
1	* Сварочный выпрямитель или	ВДМ-1001; ПСМ-1001	шт	1	Либо ВКСМ-1000с РБ-300
	преобразователь				
2	Балластные реостаты	РБ-301	шт	4	В случае применения ВКСМ-1000
3	Устройство для снижения напряжения	УСНП-1	шт	1	ТУ 16-789-184-77
	холостого хода сварочных ист. питания				
	Сварочные кабели и провода				
1	Кабель силовой	КГ3×70+1×25 мм²	м	50	Для подключения машинных помещений
		КГ3×50+1×16 мм²	м	100	Для подключения выпрямителя ВДМ-1001
2	Кабель сварочный	КГ1×35	м	240	
		КГ1×50	м	20	
3	Шнур с резиновой изоляцией	ШРПС2×4+1×1,5 мм²	м	100	Для подключения шлифмашинок
4	Кабельные наконечники	К-7; К-4	шт	10	
5	Клемма заземления	КЗ-9; КЗ-1	шт	10	
	Вспомогательное оборудование и инструмент				
1	Эл. печь для прокалки сварочных	СНОП 3,5.3,5.3,5/3 м	шт	1	
	материалов на 500°С				
2	Электрические высокооборотные	ИЭА-1400; Ш-230	шт	2÷4	Или Ш-178; ИЭ-2102А
	шлифмашинки				
3	Круги (диски) абразивные, армированные	Д-230мм; Д-180мм	шт	300	δ 3,6 мм
4	Электродержатель на 500А	ЭД-12; ЭЗР-4	шт	4	ГОСТ 14651-78 * Е
5	Щитки для защиты электросварщика	НН	шт	4	ГОСТ 12.4.035-78
6	Очки защитные	ОД	шт	2	ГОСТ 12.4.013-85Е
7	Светофильтры	С-2; С-3	шт	20	ОСТ 21-6-87
8	Стекла покровные (простые)	ТС-3	шт	50	ГОСТ 111-78

* Примечание: Допускается использование других источников питания дуги, имеющих крутопадающую вольтамперную характеристику.

Продолжение

1	2	3	4	5	6
9	Щетка стальная		шт	10	ОСТ 21-6-87
10	Молоток для очистки от шлака		шт	4	ГОСТ 111-78
11	Набор шаблонов для проверки швов		шт	4	
12	Слесарный инструмент		компл.	1	
13	Клейма сварщиков		шт	4	
14	Пенал для электродов		шт	4	
15	Коврик резиновый, диэлектрический		шт	4	
16	Лупа 10-ти кратного увеличения		шт	2	
17	Вакуум-камера с вакуум-насосом	РВН-20	шт	1	
	на 600 мм. рт. ст.				
	Газорезательная аппаратура				
1	Резак для пропан-бутановой смеси	"Ракета-1"	шт	1	Кировоградский завод „Автогенмаш"
2	Резак для ручной кислородной резки	"Маяк-1"	шт	1	Кировоградский завод „Автогенмаш"
3	Горелка ацетиленовая	ГАО-2-12	шт	1	Кировоградский завод „Автогенмаш"
4	Редуктор пропан-бутановый	ДПП-1-65	шт	2	ГОСТ 6268-78*
5	Редуктор кислородный	ДКП-1-65	шт	1	ГОСТ 6268-78*
6	Рукав резиновый (кислородный)	III-9-20	м	40	ГОСТ 9356-75*
7	Рукав резиновый (пропан-бутановый)	I-9-63	м	40	ГОСТ 9356-75*
8	Баллон для кислорода	40-150А	шт	5	ГОСТ 949-73*
9	Баллон для пропан-бутана	3-50	шт	3	ГОСТ 15860-84
	Сварочные материалы				
1	Электроды металлические	УОНИ 13/45, 2 гр. качества	кг	46,2	ф 3,0 мм
			кг	59,0	ф 4,0 мм
2	Рентгеновская пленка	РТ-4м или РТ-5	п.м.	3	В пересчете на 35мм кинопленки
			шт.	8	размером 300×400

Привязан:				ТП 704-1-254 с. 92	ПМ
Инв. №	Нач. отд.	Ларионов		Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб. м	Стадия: РП; Лист: 6; Листов:
	Гл. спец.	Рожин	11.91		
	Гл. спец.	Чернышов		Ведомость сварочного оборудования	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва
	Гл. инж.	Петрова	11.91		
Инв. №	Инж.	Фунина			

Обоснование §§ЕНиР	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Норма времени чел.-ч.	Затраты труда чел.-дн. / чел.-дн.	Численность рабочих чел.	Продолжительность, дн.	Рабочие дни 5	10	15	20
5-1-1	Сортировка металлоконструкций (15% от общей массы)	т	15,78	0,65	10,27 / 1,25	3	0,5				
5-2-1	Монтаж днища	Резервуар	1	5,9	5,9 / 0,72	3	0,3				
22-1-6, К=1,4	Сварка днища	10м	1,05	1,1	1,62 / 0,2	2	0,1				
*Таблицы 2,16	Контроль сварных швов радиографией - 0,5 м, стальные - вакуумированием	1м	0,5 / 10	2,37 / 8,82	9,4 / 1,2	1	1,2				
5-2-2	Установка рулона стенки на днище в вертикальное положение	Резервуар	1	8,9	8,9 / 1,1	4	0,3				
5-2-3	Установка центральной монтажной стойки	Стойка	1	2,8	2,8 / 0,34	4	0,1				
5-2-4	Развертывание рулона стенки	Резервуар	1	42	42 / 5,15	5	1				
22-1-6 К=1,4	Сварка двухстороннего таврового шва	10м	3,28	2,2	10,1 / 1,23	2	0,7				
*Таблицы 15,16	Контроль двухстороннего таврового шва керосином и вакуумированием	1м	32,8	0,1 / 0,82	49,3 / 6	1	6				
5-2-4	Монтаж щитов покрытия	Резервуар	1	36,5	36,5 / 4,45	5	0,9				
22-1-6; 22-1-2 К=1,4; К=1,5	Сварка покрытия резервуара	10м	9,92	4,6; 0,15	51,6 / 4,5	2	2,3				
5-2-4	Соединение вертикальной кромки	Резервуар	1	17	17 / 2,1	5	0,5				
22-1-2; 22-1-9 К=1,4; К=1,5	Сварка вертикального монтажного стыка	10м	0,75 / 0,15	22,2; 8	18,68 / 1,05	2	0,5				
*Таблица 2	Контроль сварного шва 100% длины радиографией	1м	9,0	2,37	21,33 / 2,6	1	2,6				
22-1-6, К=1,4	Сварка люков и патрубков в стенке	10м	1,05	1,5	2,21 / 0,27	2	0,2				
*Таблица 15	Контроль сварных швов керосином	1м	5,6	0,1	5,32 / 0,5	1	0,5				
22-1-6 К=1,4; К=1,5	Сварка люков и патрубков в покрытии	10м	2,22	4,6	21,4 / 2,6	2	1,3				
5-2-13	Установка ограждений, площадок на крыше	Резервуар	1	6,6	6,6 / 0,8	3	0,3				
22-1-6, К=1,25 К=1,4; К=1,5	Сварка ограждений и площадок на крыше	10м	7,2	0,11	21 / 2,6	2	1,3				
5-2-3 К=0,7	Демонтаж центральной монтажной стойки	Стойка	1	2,8	2 / 0,24	2	0,2				
*Таблица 16	Контроль сварных швов люков и патрубков в покрытии, швов в покрытия на герметичность при гидроиспытании	1м	10,5	0,2	2,1 / 0,3	1	0,3				
5-2-6	Испытание резервуара	Резервуар	1	37,9	37,9 / 4,62	2	2,3				
	Прочие неучтенные работы (10% от общего объема работ)	Резервуар	1	36,2	36,2 / 4,4	2	2,2				

График движения рабочей силы

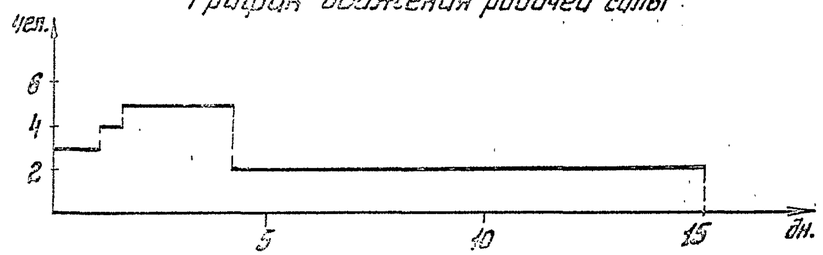

Технико-экономические показатели

1. Общие затраты труда — 37,7 чел. дн.
2. Общая продолжительность сооружения резервуара — 15 дн.
3. Средняя численность рабочих $\frac{37,7}{15}$ = 3 чел.

Примечания

1. График составлен на основании действующей нормативной документации.
2. График рассчитан на работу в одну смену, кроме рентгеноконтроля, который производится во вторую смену, а испытание резервуара - круглосуточно.

* Нормативы для планирования работ по контролю качества сварных соединений.

Разработал					Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 т.б. м³	Стадия: РП; Лист: 7; Листов:
		Нач. отд.	Пусенков			
		Архит.	Розгин		График производства работ	Управление строительного контроля г. Москвы
		Инж.	Попова			
Инж. №			Инж.			

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

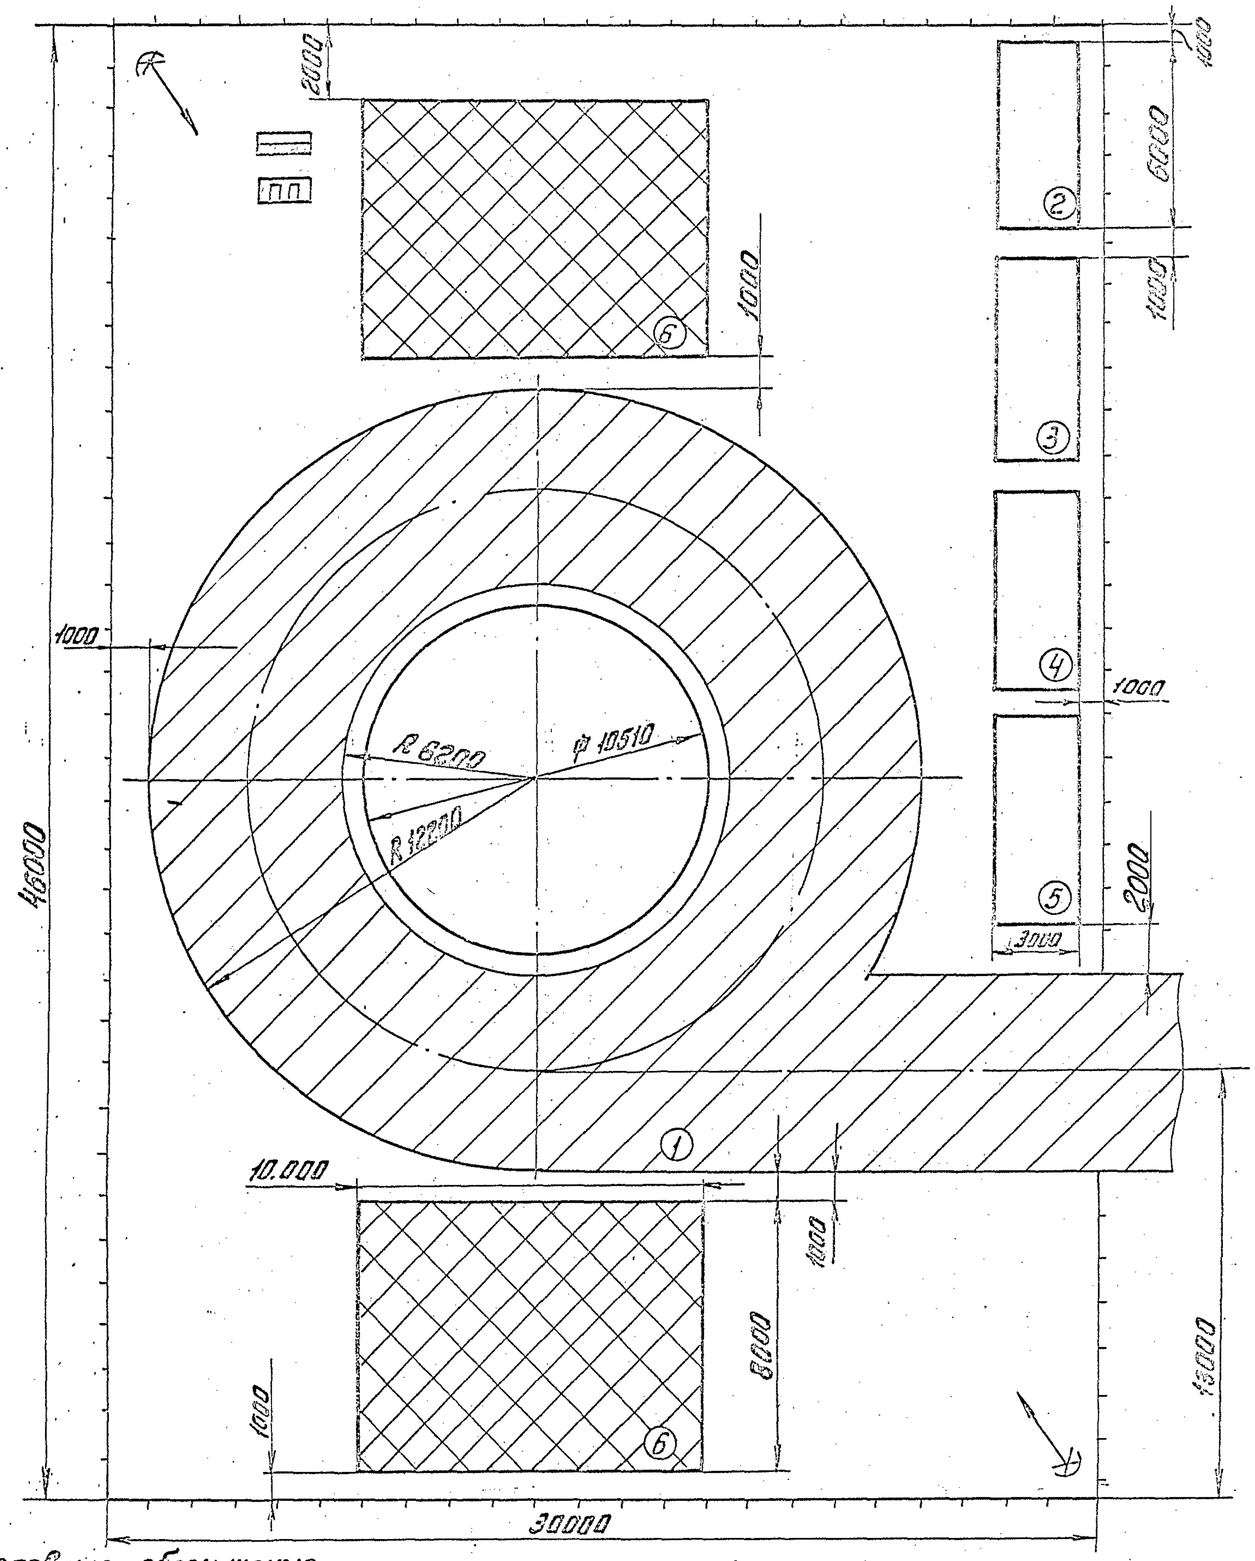

Технические требования

До начала монтажных работ необходимо выполнить следующие работы:

1. Установить временный забор и вывесить предупреждающие знаки по периметру монтажной площадки;
2. Произвести устройство площадок для временного складирования поступающих конструкций с несущей способностью 4 кгс/см²;
3. Произвести устройство площадки для работы монтажного крана из железобетонных плит с несущей способностью в соответствии с ВСН 234-88 не менее 4 кгс/см², а уклон не более 1°;
4. Установить инвентарные здания для рабочих и ИТР, занятых на монтаже;
5. Установить прожекторные мачты со светильниками.

Ведомость временных сооружений и площадок для временного складирования конструкций.

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Краткая характеристика	Примечание
1	Площадка для работы крана	шт.	1	$S_{пл.}=380 м^2$	
2	Прорабская	-"-	1	$S_{пл.}=18 м^2$	Инвентарные здания ММСС СССР
3	Раздевалка для рабочих	-"-	1	$S_{пл.}=18 м^2$	
4	Комната приема пищи	-"-	1	$S_{пл.}=18 м^2$	
5	Склад	-"-	1	$S_{пл.}=18 м^2$	
6	Площадка для складирования металлоконструкций	-"-	2	$S_{пл.}=80 м^2$	

Условные обозначения:

- площадка для работы крана из ж/б плит
- площадка для складирования металлоконструкций
- временный забор для ограждения монтажной площадки
- прожектор
- ПП пожарный пост
- распределительный электрощит

Провер.				ТП 704-1-254с. 93	ПМ
Нач.отд.	Лапонов			Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 тыс. т.	Стадия Р П, Лист 9, Листов
Н.контр.	Панова		11.91	Схема строительного генерального плана	Гипронефтеспецстрой г. Москва
Гл.инж.	Чернова				
Инв. №					

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254с. 93

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

25610-06 10

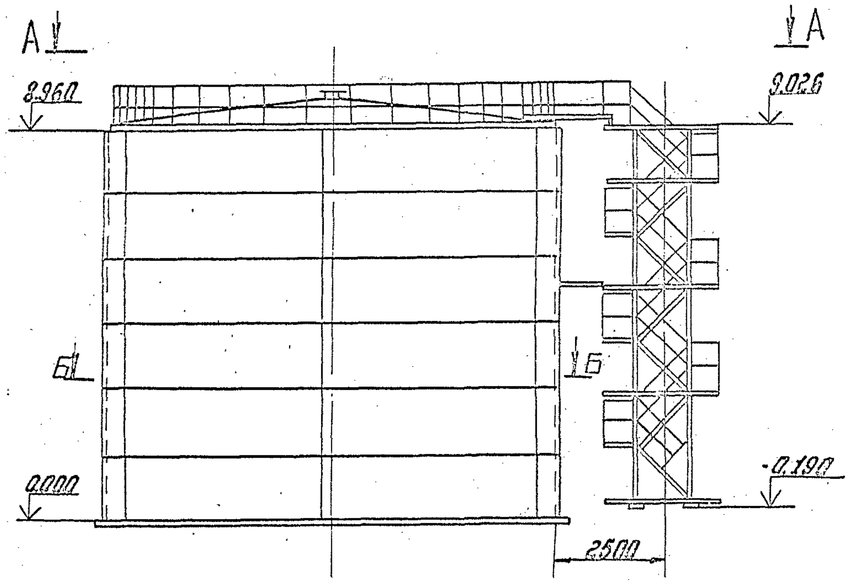

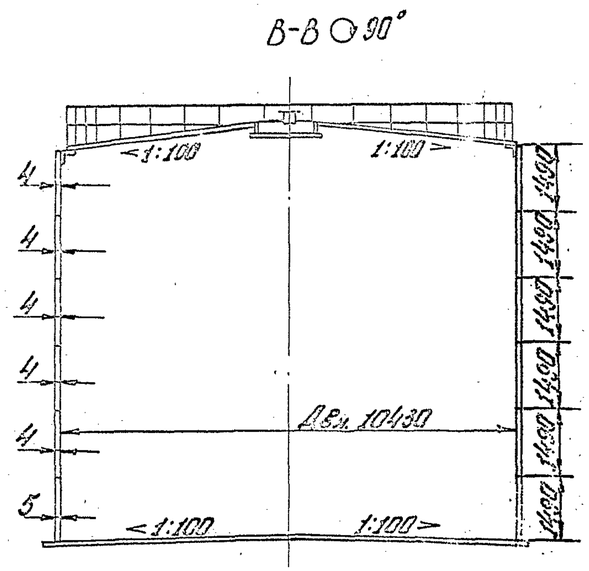

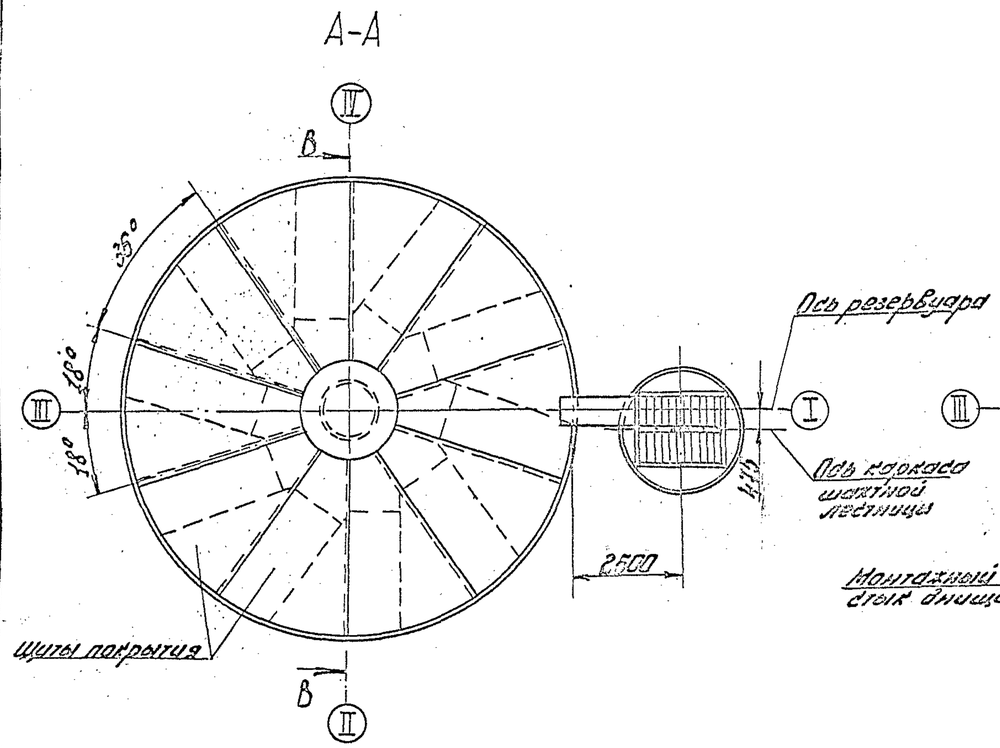

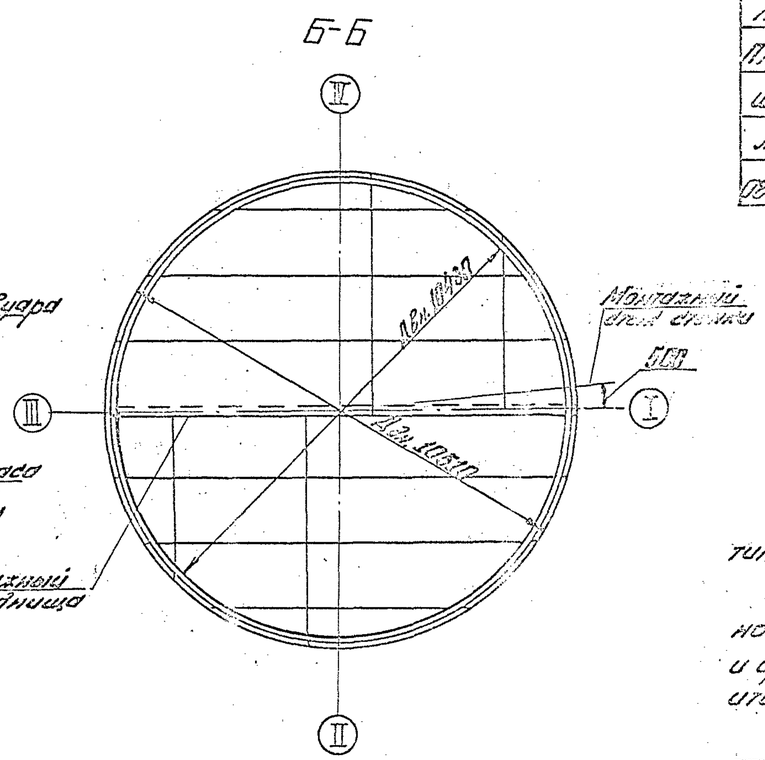

Основные монтажные механизмы — Таблица 1

Наименование работ	Необходимый механизм	Кол.
1. Монтаж днища	Трактор С-100 или тракторная лебедка ЛТ-16/1250	2
2. Подъём рулона стенки	Кран МКГ-25БР Трактор С-100	1 1
3. Развертывание стенки	Трактор С-100 АПП-12	1 1
4. Монтаж покрытия	Кран МКГ-25БР Трактор С-100	1 1
5. Установка и демонтаж монтажной стойки	Кран МКГ-25БР	1

Основные монтажные элементы резервуара — Таблица 2

Наименование	Вид поставки м/констр.	Кол., шт.	Масса, кг
Днище	Полотнище	2	2,77
Стенка	Полотнище	1	9,73
Покрытие	Щит	12	4,35
Площадки и ограждение	Комплект	1	0,89
Шахтная лестница	Комплект	1	2,59
Люки-лазы	Комплект	1	0,71
Общая масса резервуара			21,04

Указания

1. Механизмы, указанные в табл. 1, являются оптимальными для данных операций.

2. При разработке проекта производства работ на основании данного альбома монтажные краны и другие механизмы подбираются из условий строительства конкретного объекта.

Привязан:					ТП 704-1-254 с. 92	ПМ
		Нач. отд.	Ларионов		Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м.	Стадия: РП; Лист: 9; Подпись:
		Гл. спец.	Рогин	11.91	Общий вид резервуара	Гипроспецмонтаж г. Москва
		Гл. инж.	Пилибит	11.91		
Инв. №		Нач.	Пой			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема 1. Разворачивание полотнищ днища

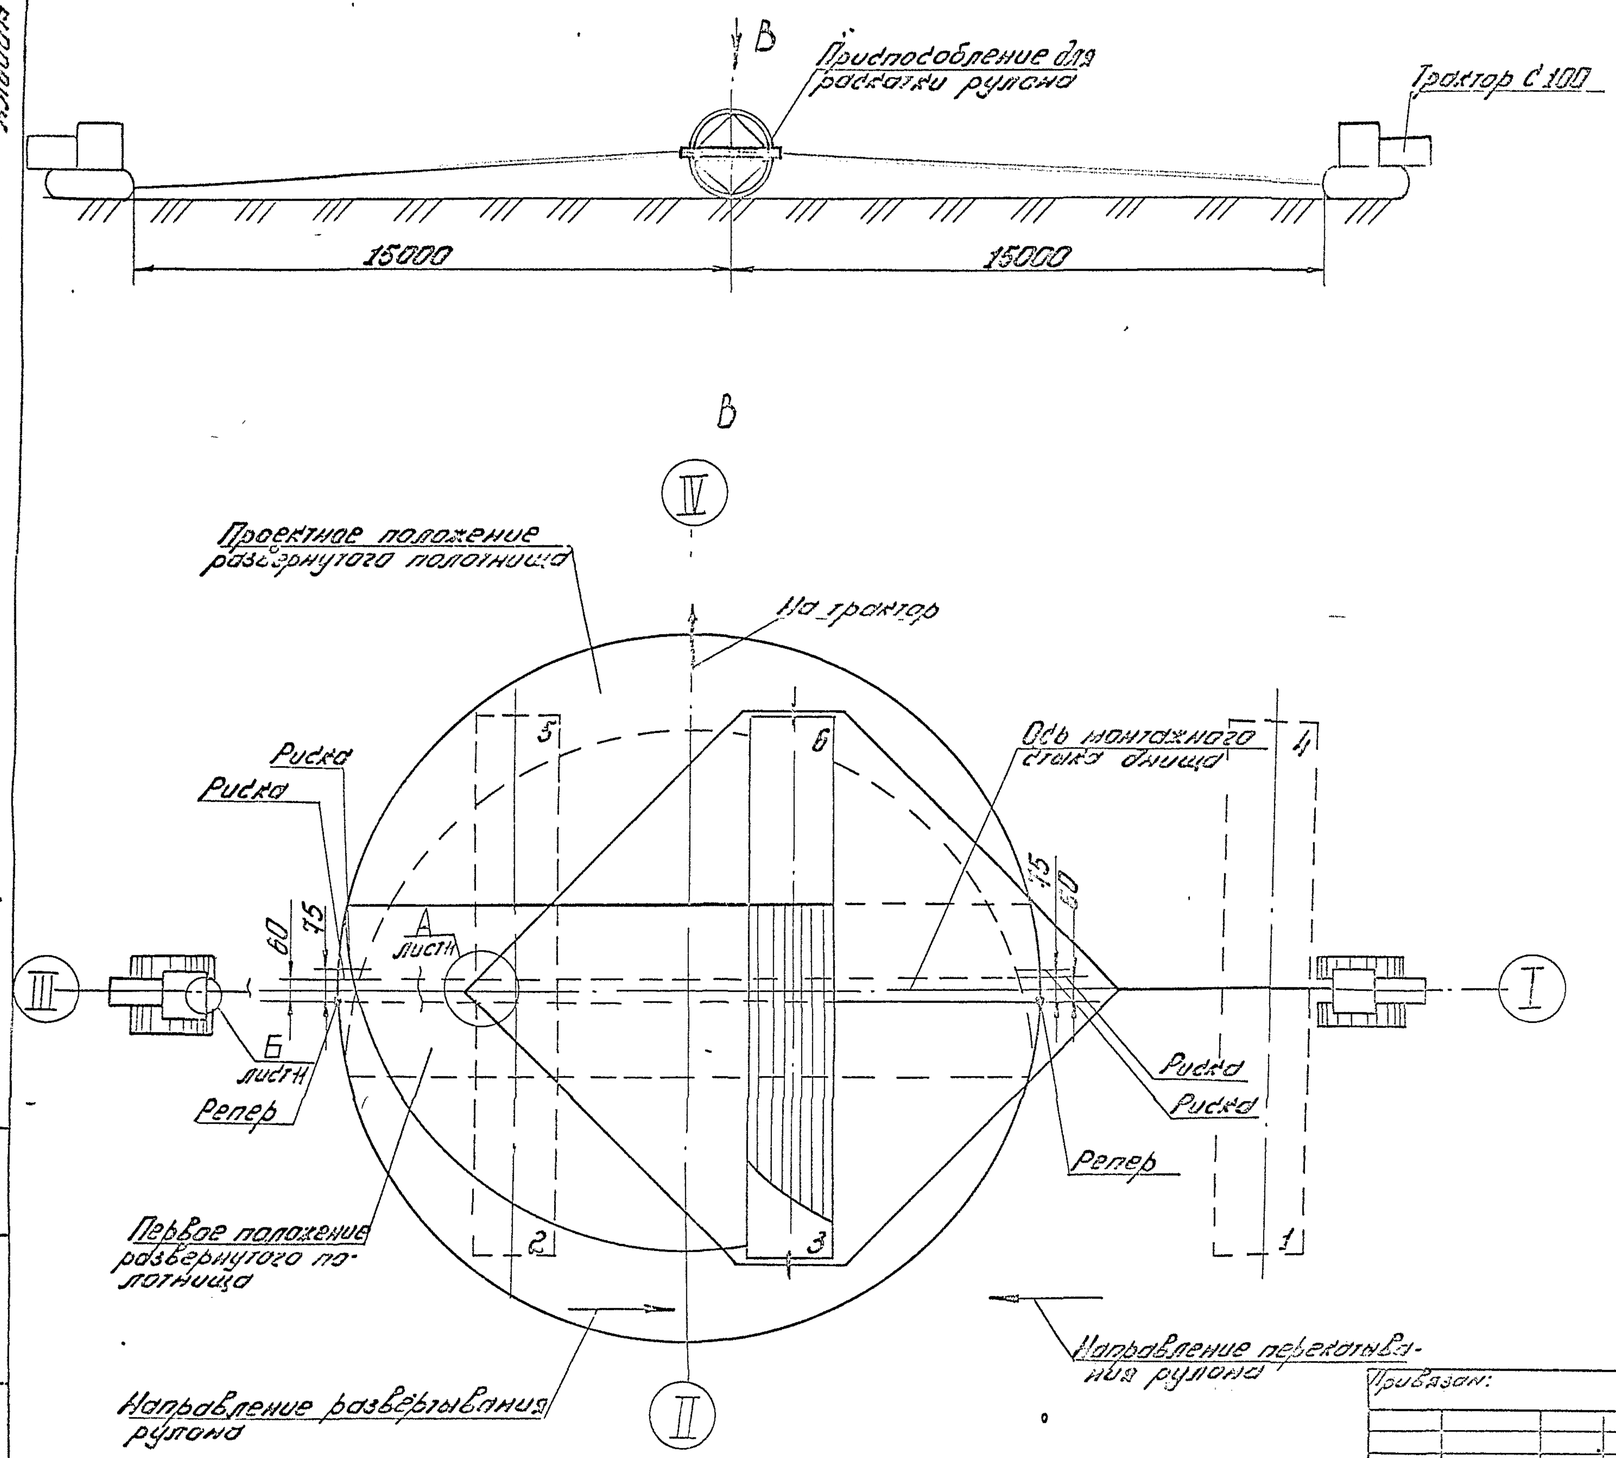

Порядок работ

1. Произвести строповку рулона (схема 1, вид В, узел А, узел Б).

2. Установить рулон в исходное положение для развертывания (положение 2) (перпендикулярно оси монтажного стыка днища) при этом начальный участок полотнища должен быть прижат рулоном (схема 2).

3. Перерезать планки, удерживающие кромки полотнища и перекатывая рулон, развернуть первый элемент днища. Перекатить рулон в положение 4.

4. Перетащить развернутое полотнище с помощью трактора в проектное положение (схема 3) и уложить его таким образом, чтобы продольная кромка довтала до струнай, натянутой между реперами (вид В), а середина продольной кромки находилась на оси II-IV.

5. Нанести на кольцевых участках развернутого полотнища риски, первую на расстоянии 60 мм - для укладки полотнища, вторую на расстоянии 75 мм - для контроля величины нахлёста.

6. Перекатить рулон в положение 5 и произвести операции, указанные в п.п 2;3.

7. Уложить второе полотнище, проверить проектные размеры днища и произвести прихватку элементов между собой швом Н1-Δ4-20/100

Привязан:				ТП 704-1-254 с. 92 ПМ			
Инв. №				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб. м.	Стадия	Лист	Листов
					РП	10	
				Монтаж днища резервуара (начало)	Гипронефтеспецстрой		
Нач. отд.	Лурье						
Гл. инж. пр.	Панова		11.91				
Гл. спец.	Рохин		11.91				
Нач. отд.	Чистова						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

А (1:10) лист 10

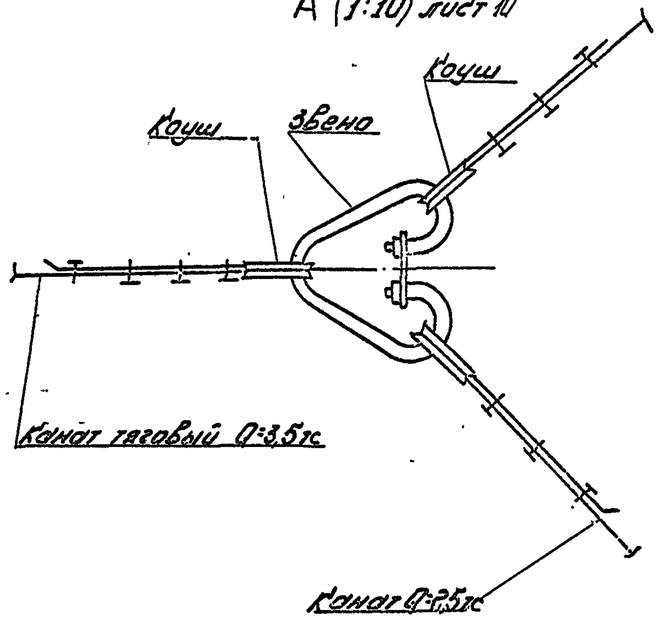

Схема 2. Положение рулона перед срезкой планок

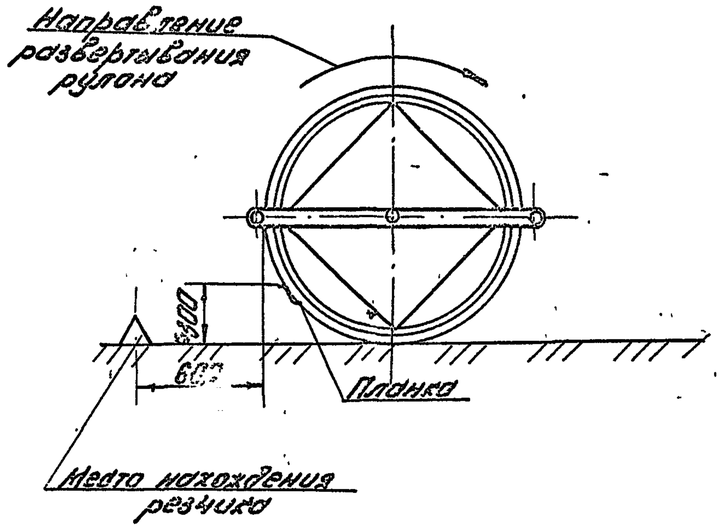

Схема 3. Крепление каната трактора к полотнищу днища при укладке его в проектное положение

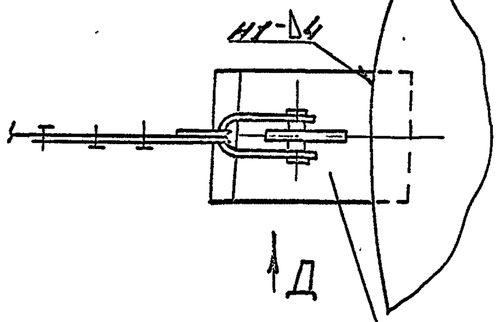

Приспособление для перетаскивания полотнищ

Б (1:10) лист 10

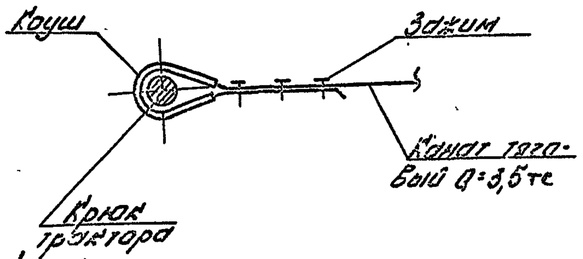

Схема 4. Крепление канатов трактора к приспособлению для раскатки рулона

Д (1:5)





Порядок работ (продолжение)

8. Произведти сварку монтажного стыка днища.

9. Произведти проверку всех заводских и монтажных швов на плотность.

Требования безопасности труда

1. Срезку скрепляющих планок производить при натянутых канатах приспособления.

2. Оставлять рулон в стадии развертывания на длительный срок (обеденный перерыв, окончание смены) запрещается.

3. Рулон, не находящийся в стадии развертывания, должен быть закреплен 2 мя клиньями с каждой стороны.

4. Перед началом работ четко отработать систему сигнализации между бригадиром и трактористами.

5. Команды на перекатывание рулонов дает только руководитель работ.

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан:				ТП 704-1-254 с. 92 ПМ	
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м.	Стадия: РП; Лист: 11; Листов:
Инв. №	Начальн.	Ларионов		Монтаж днища резервуара (окончание)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва
	Н. конт.	Попова	11.91		
	Гл. спец.	Рогин	11.91		
	Вед. инж.	Чеснова			

25610-06 13

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Схема 1.

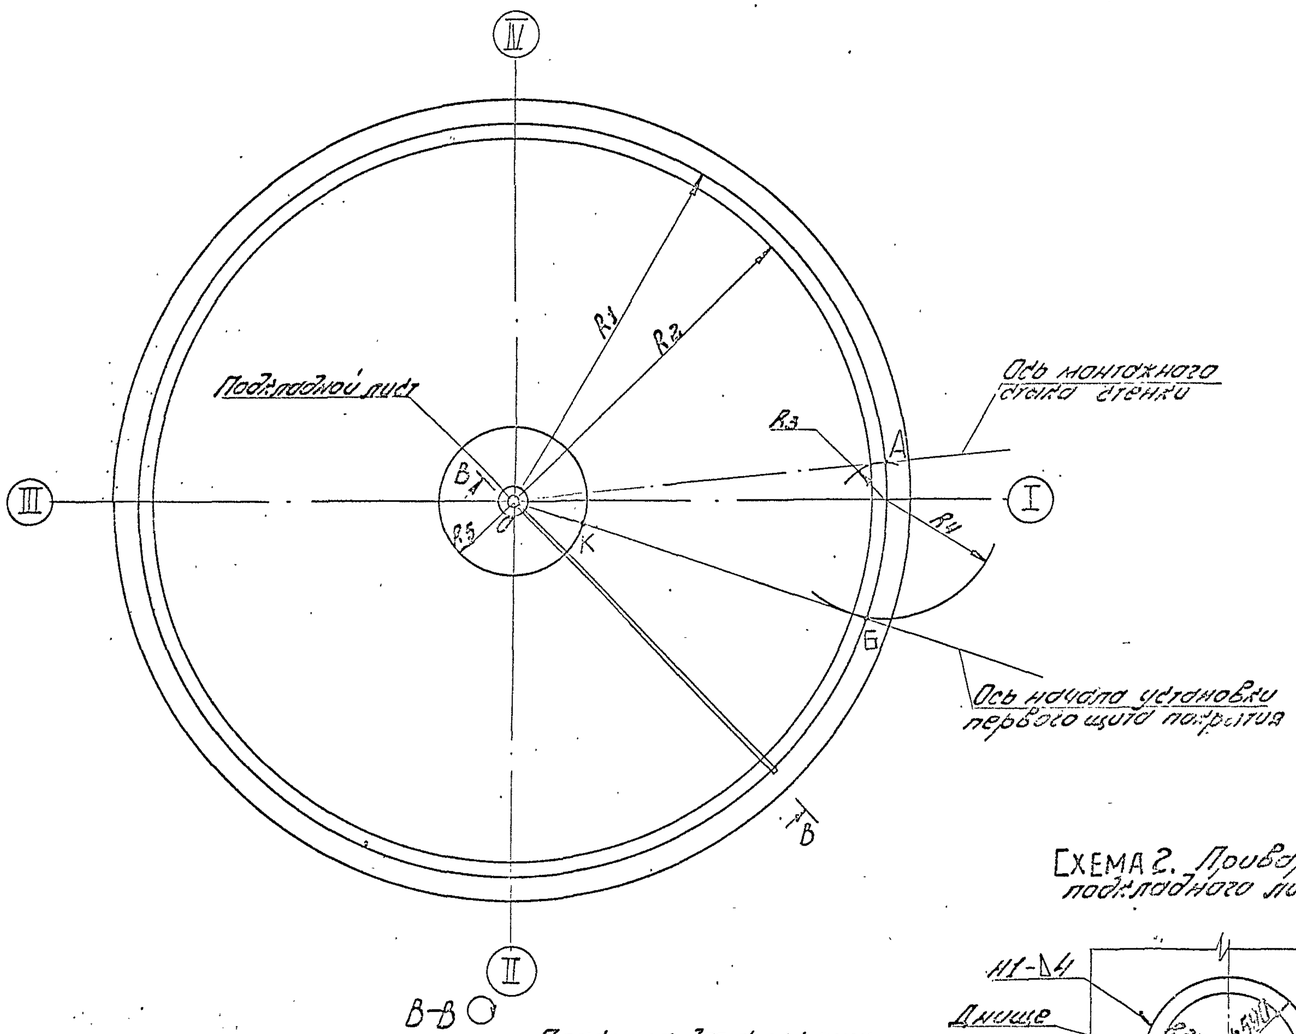

Схема 2. Приварка подкладного листа

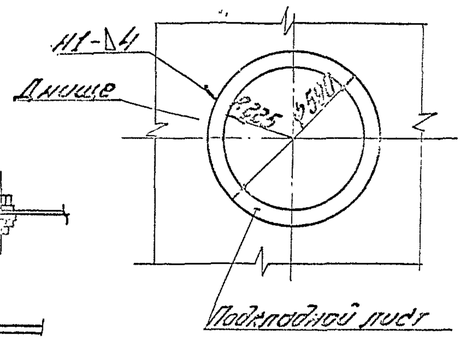

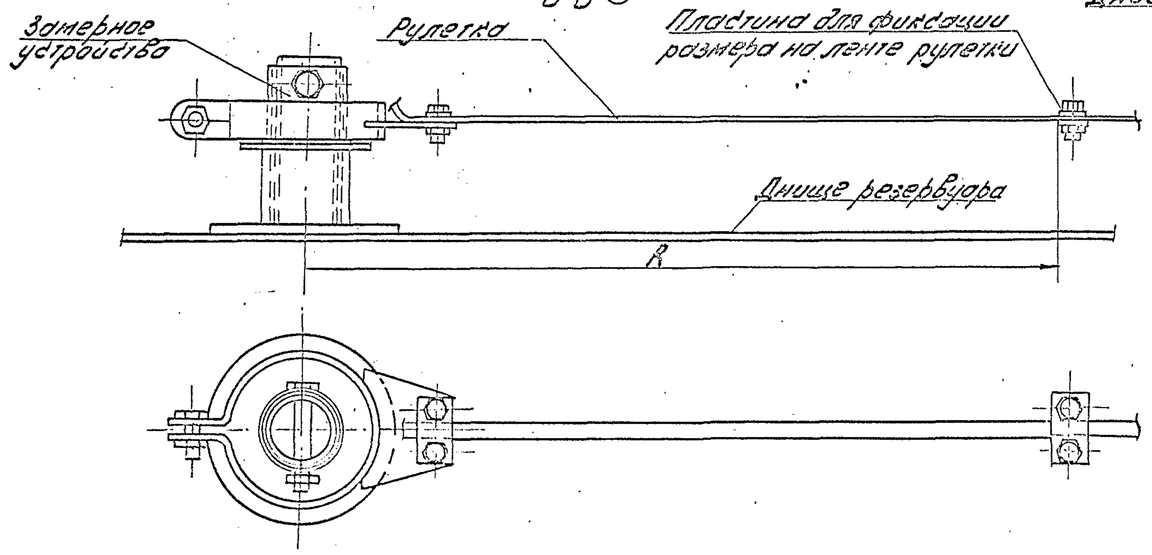

Порядок работ

1. Нанести оси I-III, II-IV и центр „О" на днище резервуара.

2. В центре подкладного листа просверлить отверстие ∅ 10 мм.

3. Установить и приварить в центре днища резервуара подкладной лист.

4. Приварить в центре днища на подкладном листе стойку замерного устройства.

5. С помощью замерного устройства на днище нанести кольцевые риски радиусами:

R_1 = 5220 мм - для приварки ограничительных уголков;

R_2 = 5015 мм - для проверки вертикальности стенки;

R_5 = 1000 мм - для контроля вертикальности стойки.

6. Отметить радиусом R_3 = 500 мм на кольцевой риске R_1 точку „А" ось вертикального монтажного стыка стенки.

7. Отметить радиусом R_4 = 1833 мм на кольцевой риске R_1 точку „Б" - начало установки первого щита внутрисварочного покрытия.

8. На кольцевой риске R_5 = 1000 мм отметить точку „К" - место укладки первого щита покрытия и для ориентации стойки при ее установке.

9. На подкладном листе нанести риску R = 225 мм для приварки ловителей (схема 2).

Указания

1. Все риски и точки, указанные на схеме 1, должны быть отмечены кернением.

2. Подкладной лист с отмеченным на нем центром резервуара оставить на все время его эксплуатации.

3. Приварку подкладного листа к днищу резервуара производить электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.
Сварной шов выполнять по ГОСТ 5264-80.

Привязан:				ТП 704-1-254 с. 92 ПМ				
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб.м.	Стадия	Лист	Листов	
			Гл. инж. проекта	Лорванов				
			Гл. спец.	Рахин			РП	12
			Н. контр.	Попова				
Инв. №			Инж.				Гипронефтеспецмонтаж г. Москва	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Схема 1. Установка рулона перед подъемом.

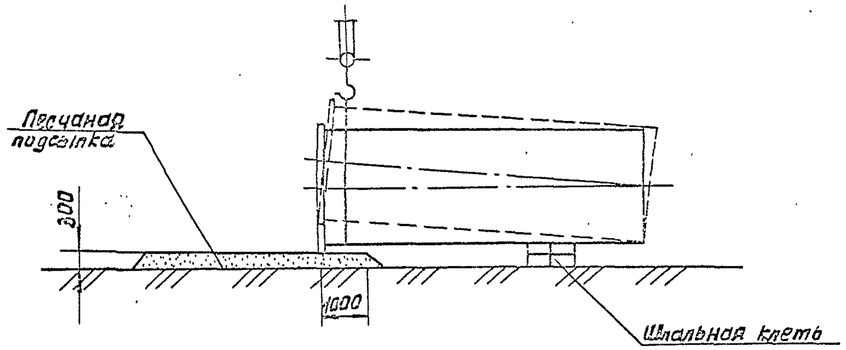

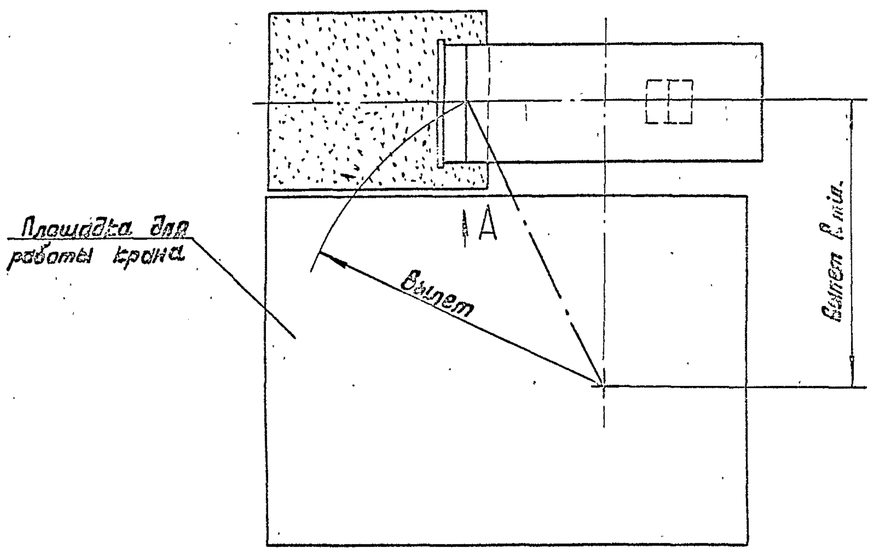

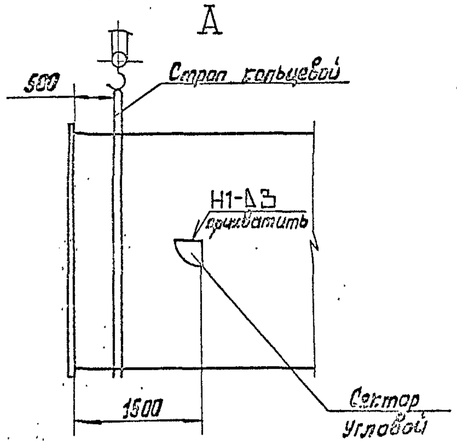

Схема 2. Крепление трубы жесткости к крану

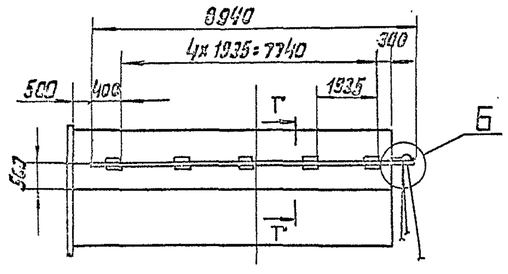

Схема 3. Строповка рулона.



В-В

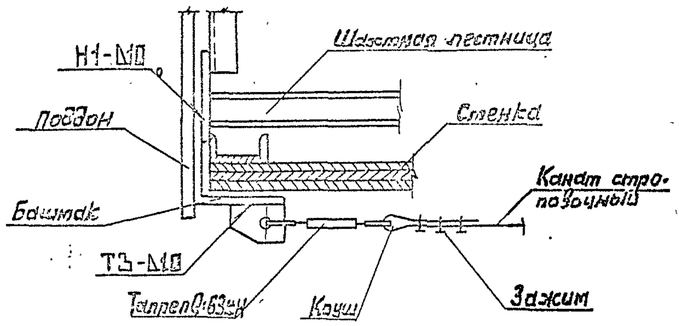

Б (1:10)

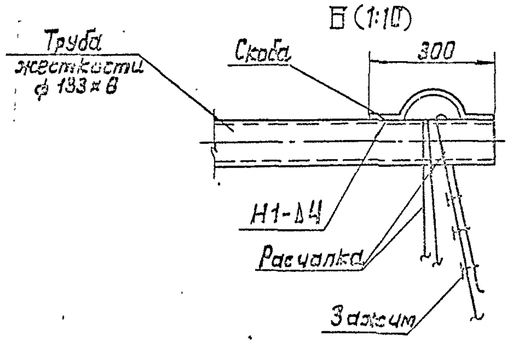

Г-Г (1:10)

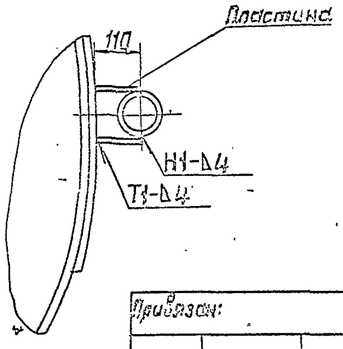

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Подготовительные работы.

1.1. Подготовить площадку для установки и перемещения крана, а также площадку для укладки рулона с последующей установкой его в вертикальное положение, обеспечив:

1) горизонтальность площадки (допустимое отклонение не более 1°);

2) несущую способность площадки не менее 0,5 МПа (5 кг/см²). Проверку производить ударником ДОРНИИ. В случае необходимости площадку укрепить гравием или железобетонными дорожными плитами с песчаной подсыпкой толщиной 50-100 мм.

1.2. Отметить места установки рулона перед подъемом, I и II стоянки крана (схема 4).

1.3. Уложить рулон краном с помощью кольцевого строп на песчаную подсыпку и шпальную клеть в исходное положение перед подъемом (Схема 1. Вид А).

1.4. Разметить угловой сектор согласно схемы 7 и укрепить его на рулоне (Вид А).

1.5. Установить опорный башмак и произвести строповку рулона (Схема 3. В-В).

1.6. Установить и закрепить на нижнем торце рулона поддон согласно схемы 6.

1.7. Установить трактор на продольной оси рулона (схема 4).

1.8. Согласно разметки (схема 8) установить шнур для контроля поворота стрелы крана.

1.9. Установить кран в исходное положение I (схема 4). На стреле крана на расстоянии 8м от оси рулона подвесить отвес (схема 5).

1.10. Приподнять верхний конец рулона на 100-150 мм и выдержать в таком положении в течении 10 минут, после чего опустить и осмотреть такелажную оснастку, при отсутствии неисправностей - продолжить подъем.

2. Подъем рулона стенки.

2.1. Подъем рулона стенки в вертикальное положение осуществлять краном с одной стоянки поэтапно:

I этап. Подъем рулона полиспастом крана с одновременным контролем допустимого отклонения полиспаста от вертикали по соответствующей риске на угловом секторе. Подъем прекратить, когда стрелка совместится с очередной риской на угловом секторе.

Привязан:				ТП 704-1-254 с. 92			ПМ
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения товарной емкостью 10 куб. м.	Стадия	Лист	Листов
		Нач.отд.	Лерманов		РП	13	
		Гл.спец.	Рахин		Подъем рулона стенки краном (начала)	Сипронефтеспецмонтаж г. Москва	
		Нач.гр.	Левина				
Инв №		Инж.	Дьячек				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 6

Схема 4. Подъем рулона стенки.

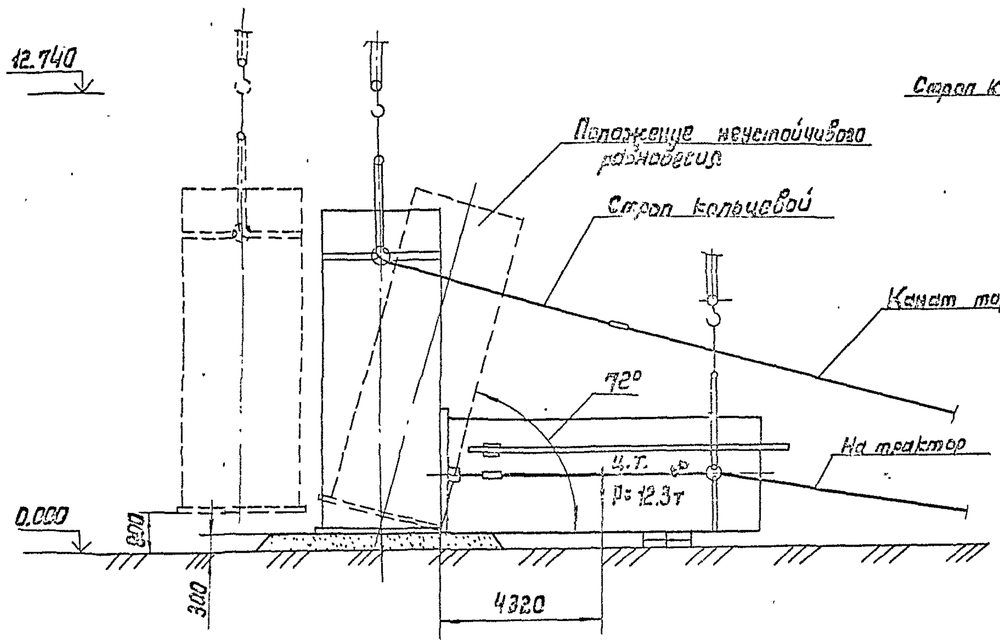

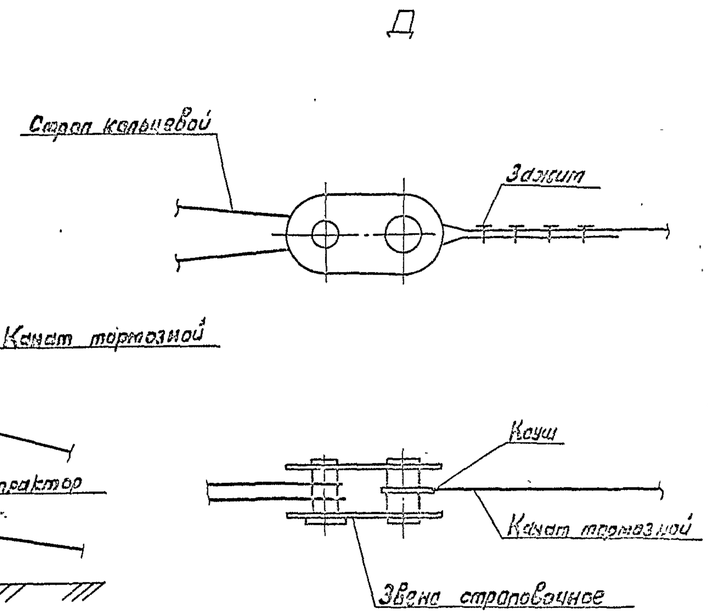

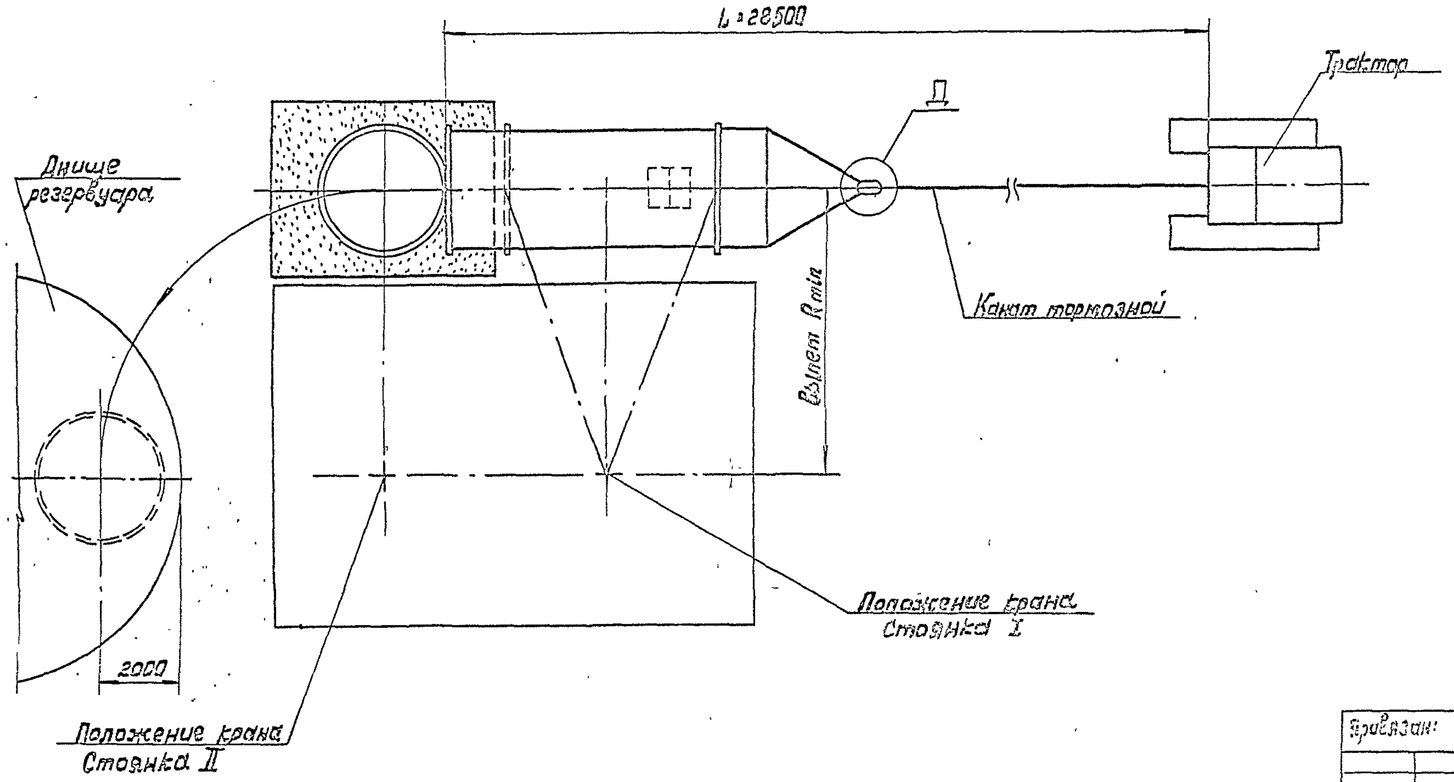

ПОРЯДОК РАБОТ /продолжение/

II этап. Поворот стрелы крана с изменением вылета на очередной угол, соответствующий расстоянию между реперами. Контроль производить на отвесу.

2.2. В процессе подъема рулеводитель монтажа попеременно дает команду крановщику на очередной этап подъема рулона, прекращая его после получения сигнала от наблюдателя, стоящего напротив углового сектора. После этого он дает сигнал крановщику на поворот стрелы крана до следующей риски.

2.3. При достижении рулоном угла наклона 80° канат тормозного трактора должен иметь провисание. На дальнейших этапах подъема провисание каната уменьшить до минимума. При достижении рулоном угла наклона α° кр.72, соответствующего положению неустойчивого равновесия, включить в работу тормозной канат, натяжение грузового полиспаста крана ослабить.
Переместить трактор установить рулон в вертикальное положение (схема 4).

3. Установка рулона стенки резервуара.

3.1. Установить кран на II стоянку согласно схемы 4.

3.2. Поднять рулон на 100-150 мм, выдержать в этом положении 10 минут, опустить его и осмотреть такелажную оснастку. При отсутствии неисправностей продолжить подъем на 500 мм выше днища резервуара и поворотом стрелы плавно установить рулон на днище.

3.3. Произвести расстроповку рулона.

УКАЗАНИЯ

1. Учитывая трудности определения неустойчивого равновесия из-за отсутствия точных данных (силы ветра и др.), после достижения рулоном угла наклона 60° следует уделить особое внимание контролю за провисанием тормозного каната во избежание рывка при включении в работу тормозного трактора.
2. Сварку производить по ГОСТ 5264-80, электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-75.

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					

						ТП 704-1-254 с. 92	ПМ
Привязан:							
			Нач. отд.	Ларионов		Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения нефти и нефтепродуктов 700 куб.м.	Стадия: РП; Лист: 14; Листов:
			Гл. спец.	Резин	11.91	Подъем рулона стенки крана (продолжение)	ГИПРОСПЕЦНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва
			Рук. гр.	Белова	11.91		
Инв. №			Инж.	Данилов			

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Схема 5

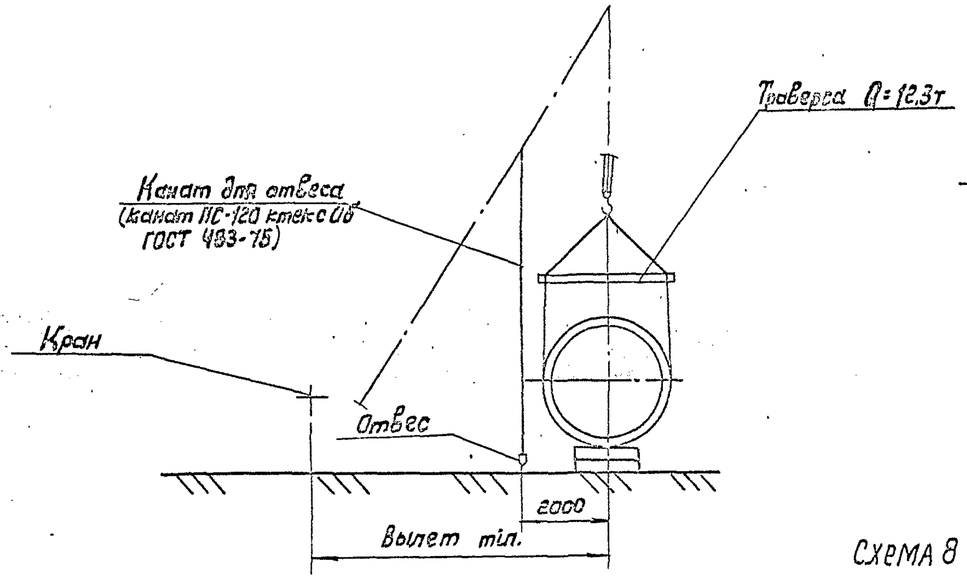

Схема 6. Крепление рулона к поддону

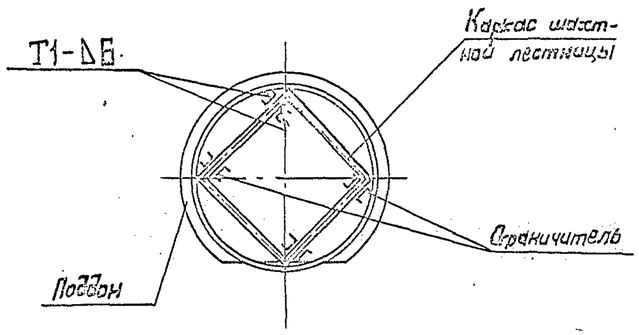

Схема 8 Разметка шнура для поворота стрелы

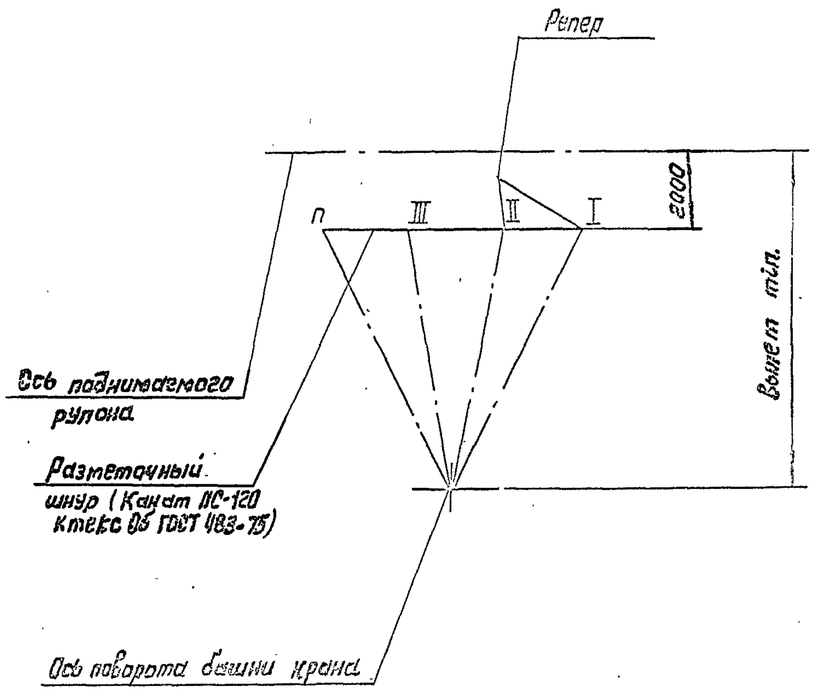

Схема 7. Разметка углового сектора резервуара

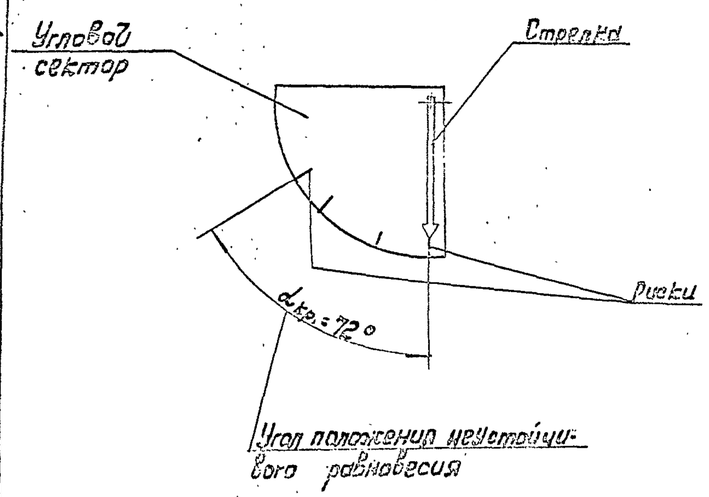

Требования безопасности труда

1. Подъем рулона запрещается производить в гололедицу при сильном тумане, снегопаде или ветре более 10 м/с.
2. Перед подъемом необходимо проверить исправность крана. Площадка для передвижения и маневрирования крана должна полностью просматриваться.
3. Руководитель подъема должен постоянно находиться в поле зрения машиниста крана, который должен видеть его сигналы, а также слышать команду. Команды машинисту крана и трактористу подает только руководитель подъема.
4. При подъеме рулона стенки в вертикальное положение в зоне подъема (в радиусе L от нижнего края рулона и под канатом) не должны находиться люди.
6. Опасную зону оградить сигнальным стоечным ограждением согласно ГОСТ 23407-78.

Привязан				ТП 704-1-254 с. 92			ПМ
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения нефти емкостью 100 тыс. м³	Стадия	Лист	Листов
			Гл. инж. проекта Ромов		РП	15	
			Нач. отд. Данилова	Подъем рулона стенки краном (окончание)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва		
Инв. №			Инж. Яшина				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

25610-06 17

Альбом 6

Схема 1. Строповка монтажной стойки

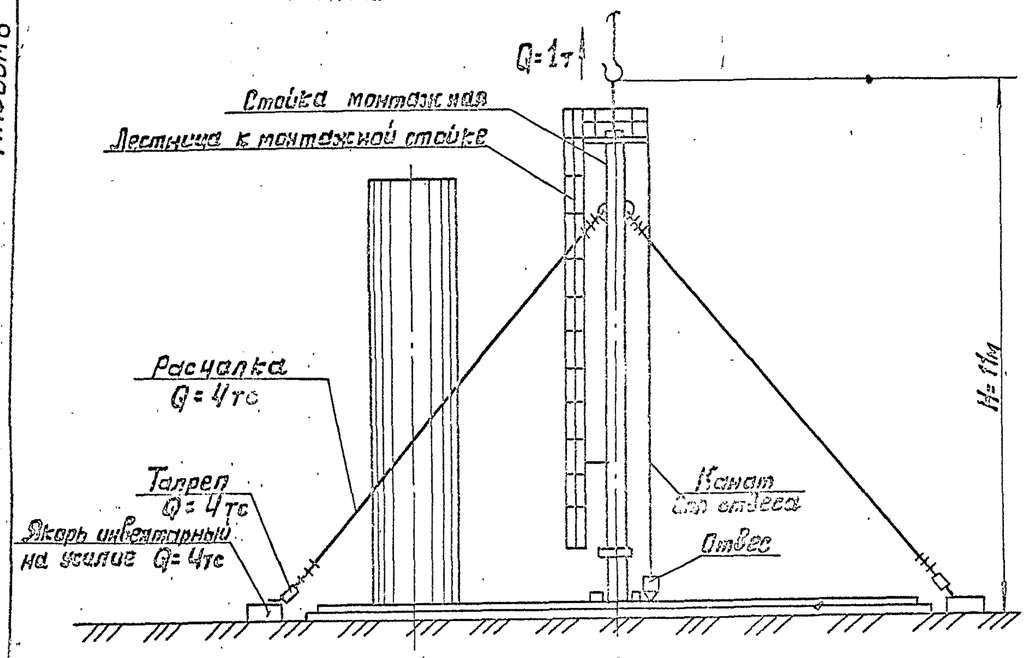

Схема 2. Крепление низа стойки к днищу.

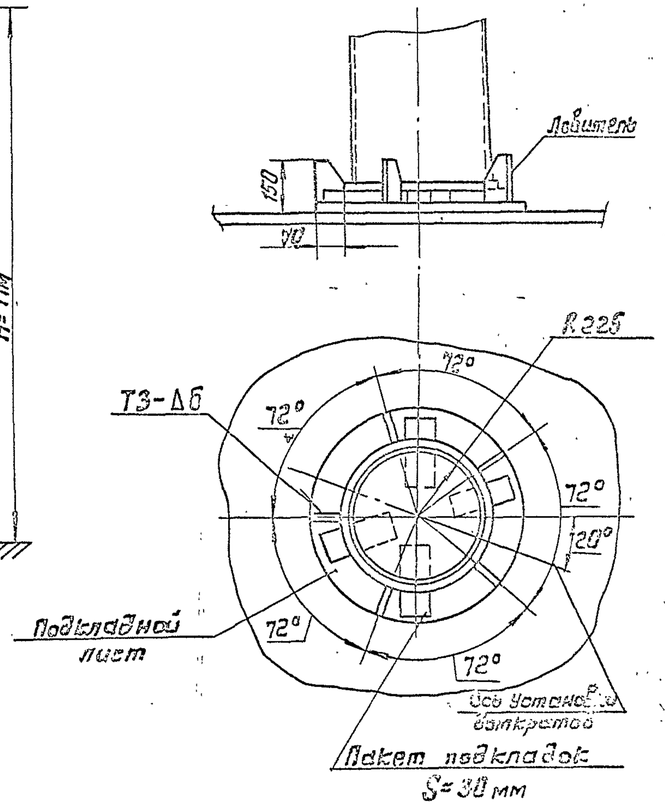

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Приварить по риске R=225мм ловители для установки монтажной стойки (схема 2).

2. Уложить на подкладной лист между ловителями пакет подкладок высотой 30мм для установки монтажной стойки.

3. Произвести сборку стойки (схема 3):

1) собрать центральное кольцо крыши на крестовине стойки, зафиксировать его косынками, приварив их стойке;

2) приварить три кронштейна для крепления отвесов (схема 3) и закрепить к ним отвесы, один из кронштейнов приварить около устанавливаемой лестницы;

3) установить лестницу;

4) установить на центральном кольце временное ограждение;

5) прикрепить расчалки (схема 5).

Установить кран в исходное для подъема положение и произвести строповку стойки (схемы 1,3).

Произвести подъем стойки в вертикальное положение, следя за отклонением полиспаста крана, которое должно быть не более 3°, затем поворотом стрелы установить стойку таким образом, чтобы отвес, расположенный у лестницы, совпал с точкой „К", нанесенной на днище.

Закрепить стойку расчалками (схемы 1, 4), проверив вертикальность стойки по отвесам.

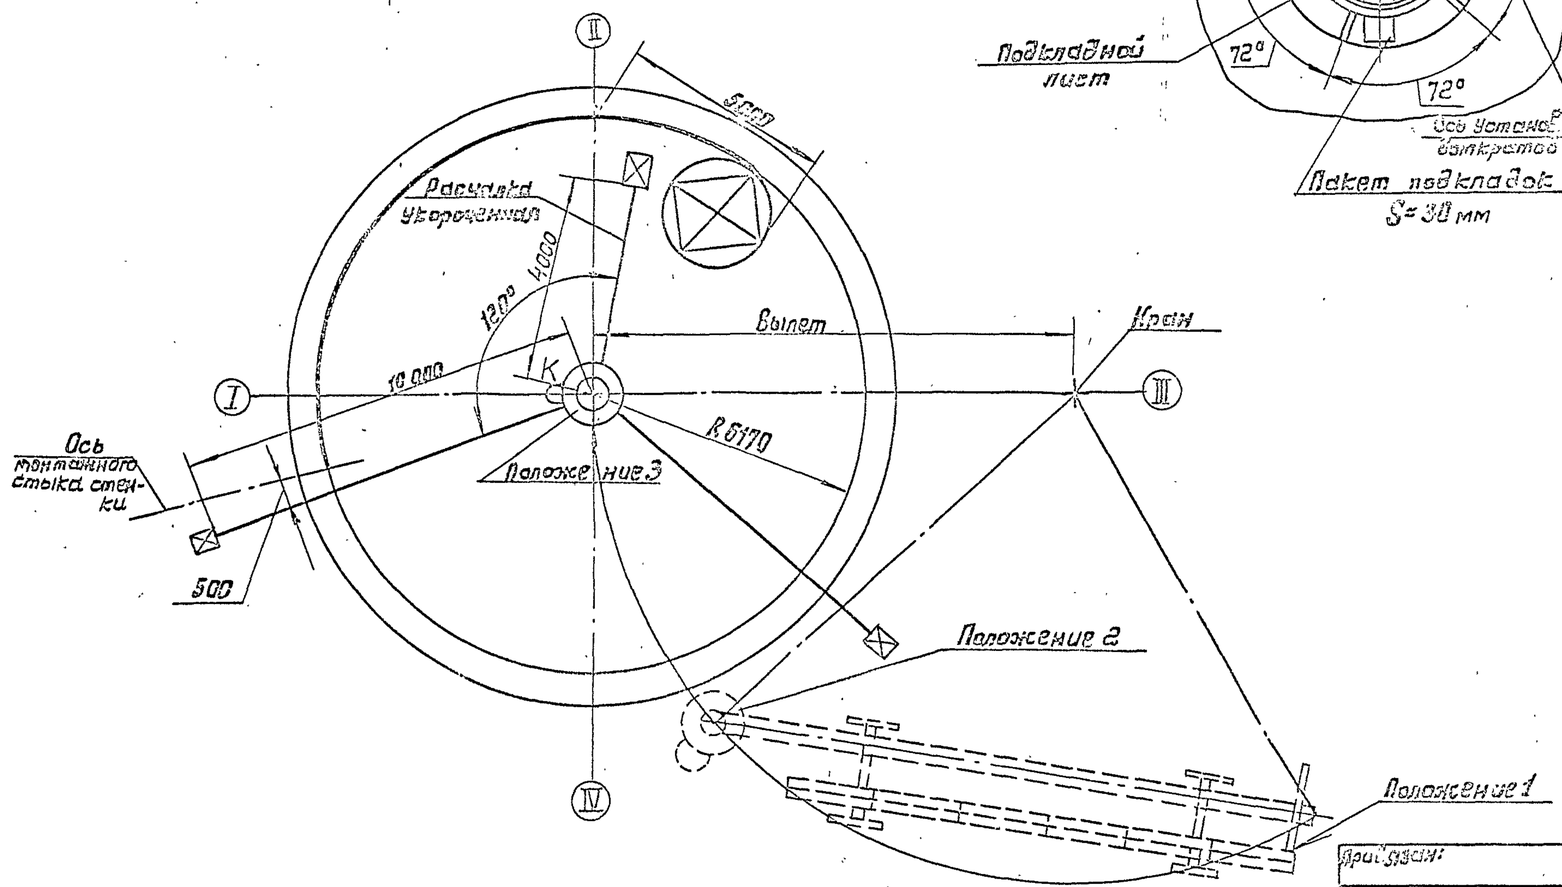

Типовой проект 704-1-254с 92

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

					ТП 704-1-254с. 92		ПМ
Разработан:					Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения сжатого воздуха емкостью 700 куб.м.	Стад. РП	Лист 16	Листов
			Нач. отд.	Ларионов			
			Гл. спец.	Рохин			
			Контр.	Панова			
Инв. №			Инж.	Пак	Установка монтажной стойки (начало)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва	

25610-06 18

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254с 92

Схема 3. Сборка и строповка стойки

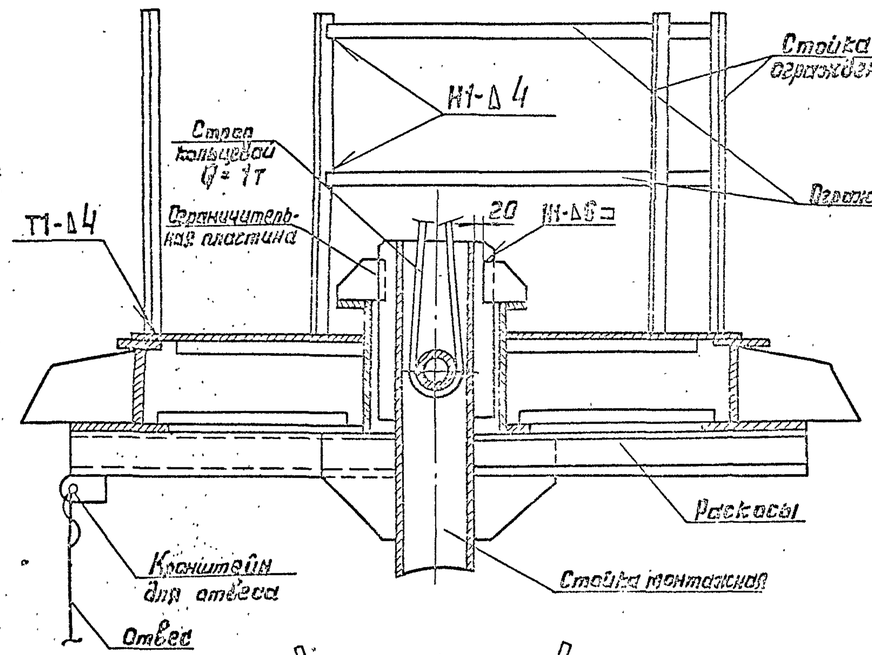

Схема 4. Крепление расчалок к якорям

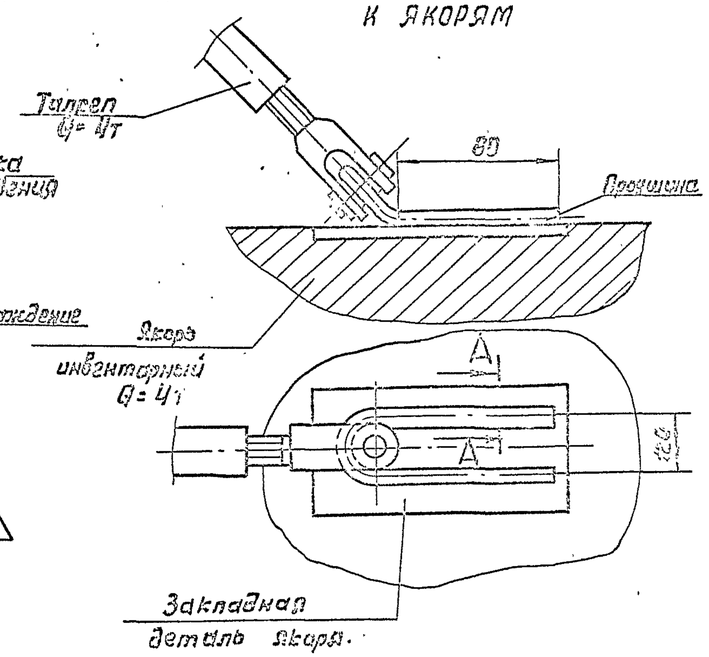

А-А (1:1)



Схема 5. Крепление расчалки к монтажной стойке.

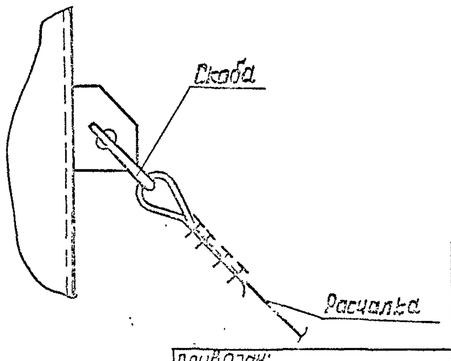

Указания

1. Установку монтажной стойки производить после развертывания первого участка полотнища стенки.
2. По мере развертывания полотнища стенки и установки щитов крыши длинные расчалки стойки удалять.
3. Данный лист рассматривать совместно с листом „Развертывание полотнища стенки резервуара" (стр. 19).

Привязан:				ТП 704-1-254с 92			ПМ
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м.	Стадия	Лист	Листов
					РП	17	
			Нач.отд. Ларионов	Установка монтажной стойки (окончание)	Гипрогазтеспецмонтаж г. Москва		
			Гл.спец. Рохин	11.91			
			Н.контр. Попова	11.91			
Инв. №			Инж. Пак				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

25610-06 19

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

А-А

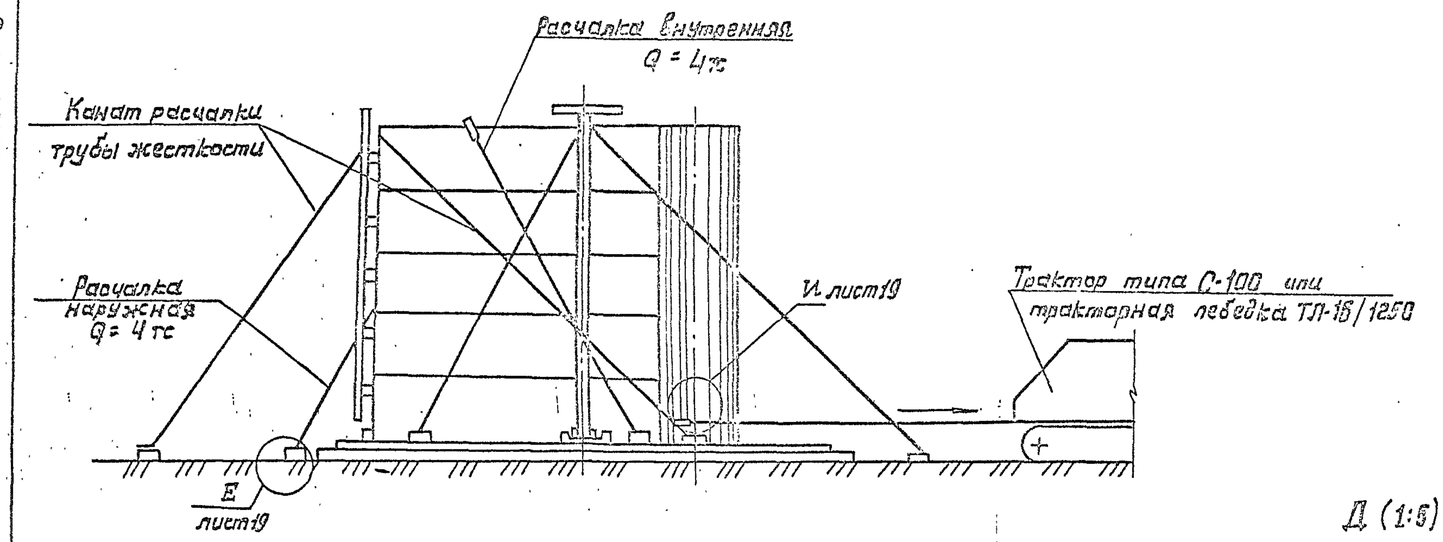

Схема 1. Расположение оснастки при развертывании рулона.

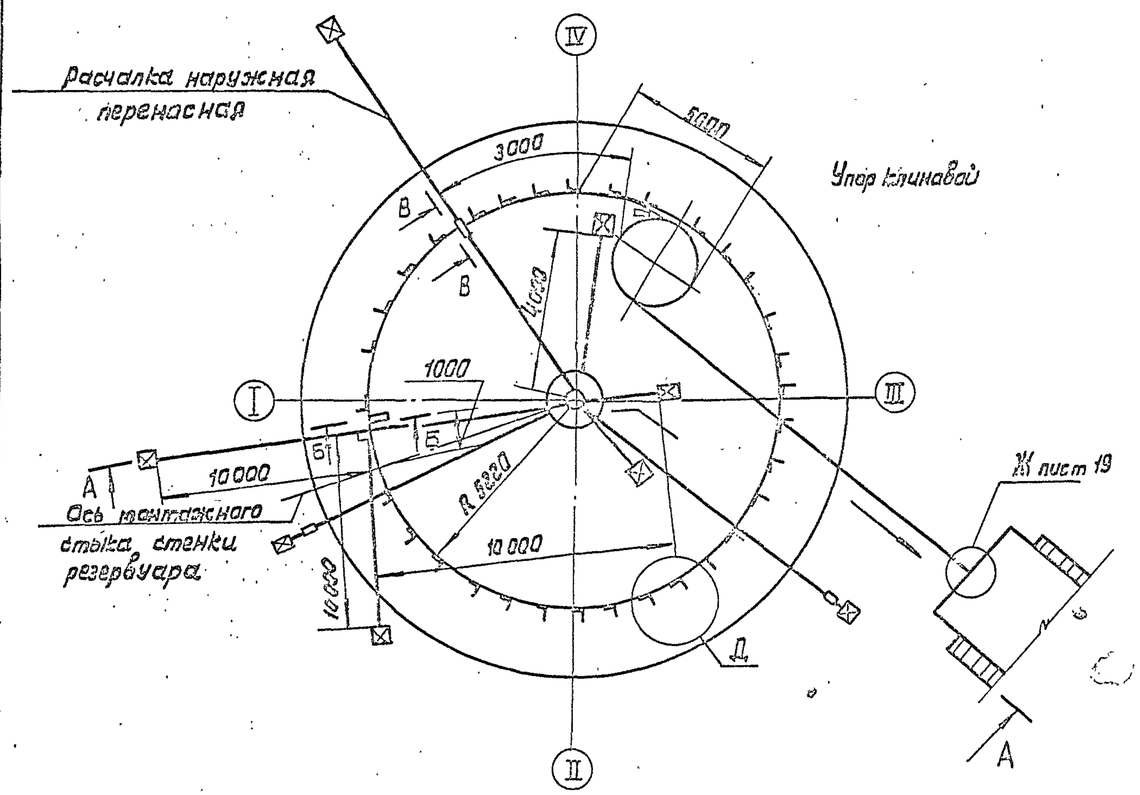

Д (1:5)

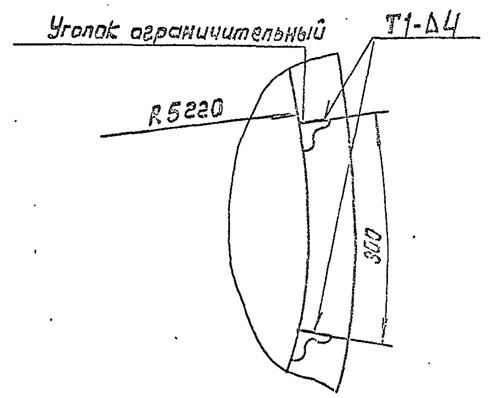

Б-Б (1:2)

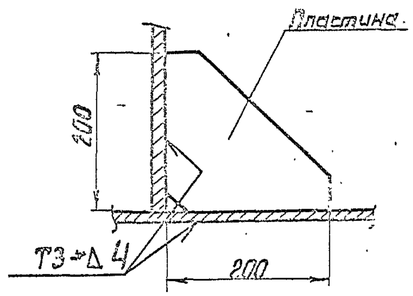

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Приварить на днище по кольцевой риске R = 5220 мм. ограничительные уголки с шагом 300 мм. (узел Д).
2. Установить рулон на днище так, чтобы после срезки удерживающих планок вертикальная кромка расположилась согласно разметке (стр. 13).
3. До срезки удерживающих планок для предотвращения самопроизвольного распушивания рулона обтянуть несколькими витками каната (удлиненная расчалка трубы жесткости), прикрепить его к крюку трактора (узел Ж) и натянуть.
4. Произвести срезку удерживающих планок с автогидроподъемника АГП-12. (схема 5). До срезки двух нижних планок приварить к рулону тяговую скобу с канатом для развертывания рулона.

   Последние планки срезать стоя на днище со стороны, противоположной развертыванию.
5. Ослабляя натяжение каната дать возможность рулону распушиться.
6. Начальный участок полотнища временно закрепить к днищу приваркой косынки (сеч. Б-Б) на расстоянии 1000 мм. от вертикальной кромки.
7. Проверить вертикальность начальной кромки полотнища по отвесу, закрепленному к трубе жесткости, и зафиксировать полотнище в этом положении тремя расчалками.
8. Закрепить тяговый канат на трактор и развернуть часть полотнища, достаточную для установки начального щита и монтажной стойки с укороченной одной расчалкой, между рулоном и полотнищем установить клиновой упор. Развернув первый участок полотнища, произвести установку монтажной стойки (стр. 17)

Привязан:				ТП 704-1-254 с. 92			ПМ
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения нефти и нефтепродуктов 700 куб. м.	Стадия	Лист	Листов
	Нач. отд.	Ларчанов			РП	18	
	Гл. спец.	Рохин	11.91	Развертывание полотнища стенки резервуара (начало)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва		
	Н. контр.	Панова	11.91				
Инв. №	Инж.	Пак					

25610-06

И лист 18

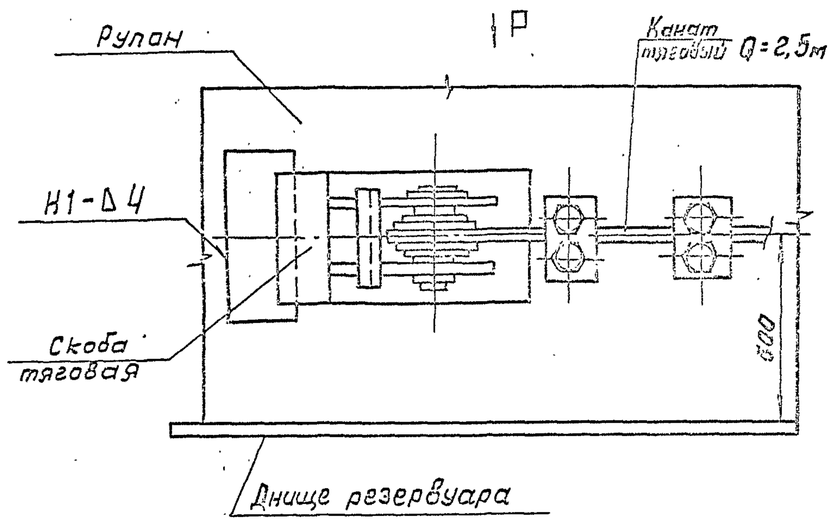

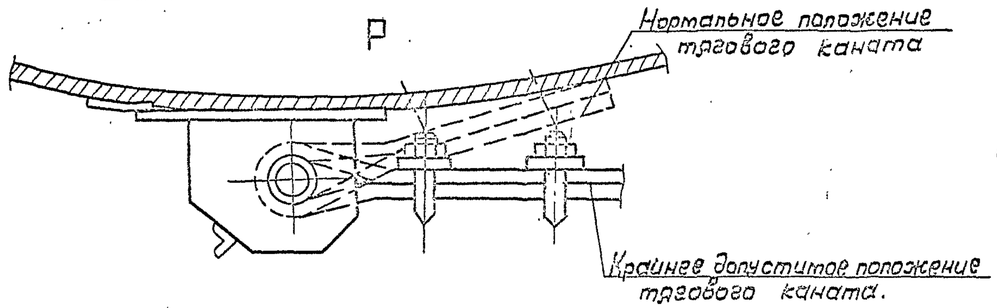

В-В

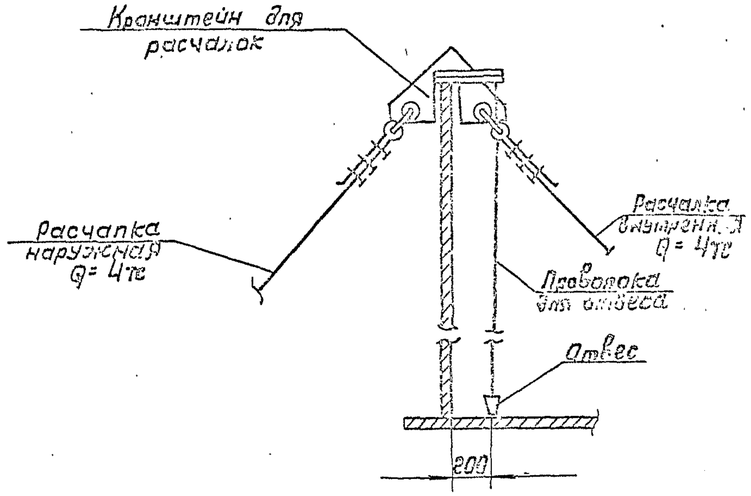

Ж лист 18



ПОРЯДОК РАБОТ (продолжение)

9. По мере развертывания полотнища производить приварку стенки к днищу швом 3-40/400 (в местах неплотного прилегания стенки к ограничительным уголкам производить прижатие с помощью клина или реечного домкрата (схема 2) и установку щитов покрытия. По мере подгонки и приварки стенки к днищу производить прихватку стенки сплошным проектным швом (стр. 33.)

10. После установки начального щита развернуть следующий участок полотнища, повторяя вышеуказанные операции.

11. При развертывании рулона и установки щитов покрытия перемещение расчалки монтажной стойки укатать и переставить якоря на днище.

УКАЗАНИЯ

1. Приварку монтажных приспособлений к днищу и стенке резервуара производить электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.

Сварной шов выполнять по ГОСТ 5264-80.

2. Длина переносных расчалок принимается при установке первого щита покрытия.

Схему установки расчалок см. стр. 22.

Схема 2. Прижатие полотнища стенки к ограничительным уголкам

1) домкратом

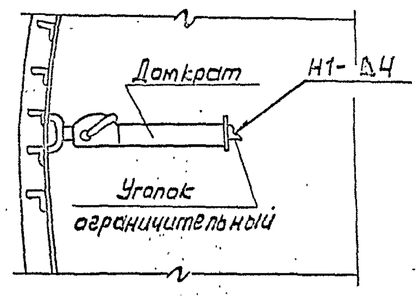

2) клином

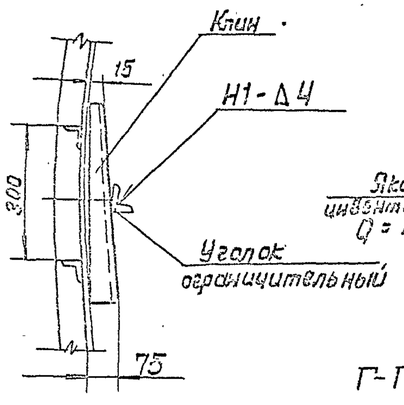

Е лист 18

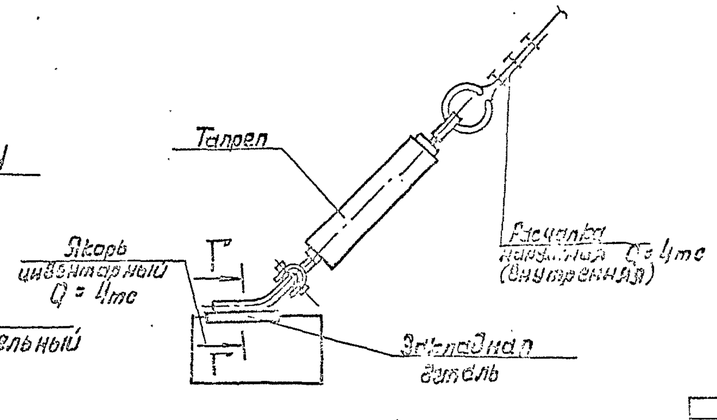

Г-Г



Привязан						ТП 704-1-254 с. 92			ПМ
				Нач. сект.	Ларионов			Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб. м.	Стадия: РП	Лист: 19	Листов:
				Гл. спец.	Рахин		11.91	Развертывание полотнища стенки резервуара (продолжение)	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва		
				Инженер	Попова		11.91				
Инв. №				Инж.	Пик						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема 3. Рулон перед срезкой планок

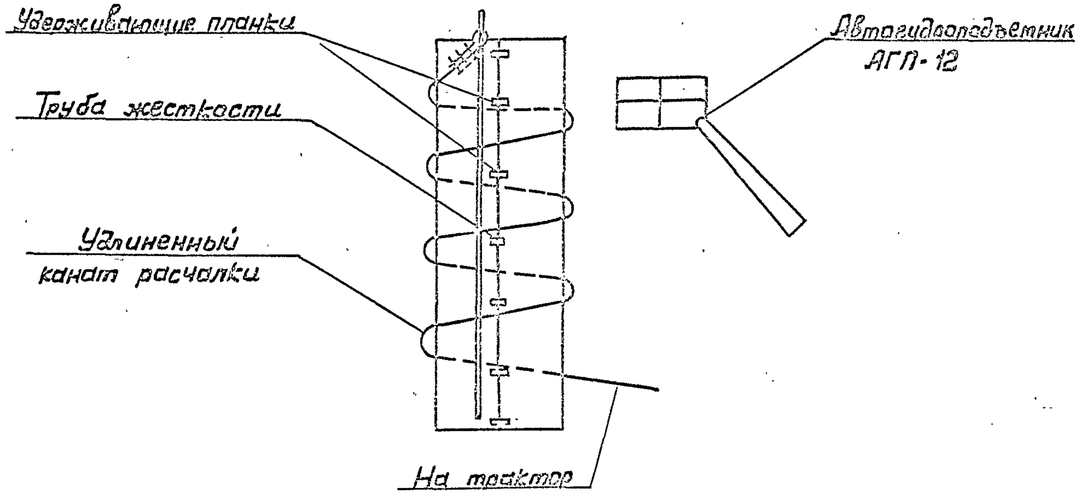

Схема 4. Начало развертывания полотнища стенки резервуара

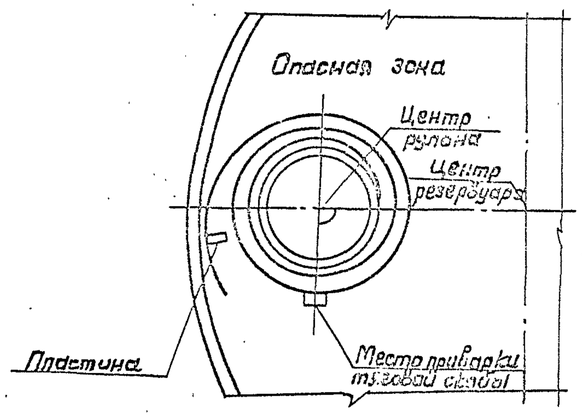

Схема 5. Промежуточное положение при развертывании полотнища стенки.

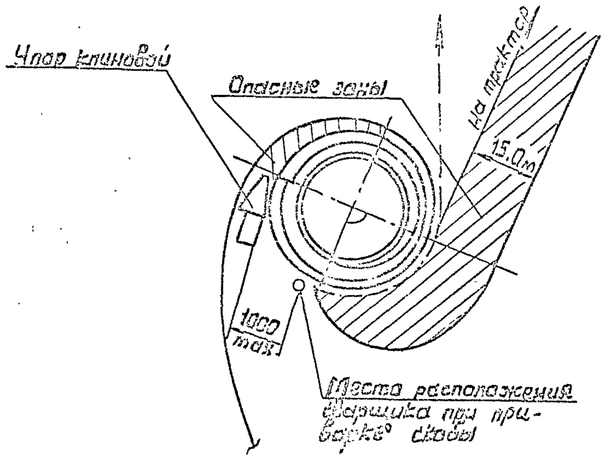

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

1. До срезки удерживающих планок обмотать рулон удлиненной (наставленной) расчалкой, закрепленной к трубе жесткости (схема 3). Срезку планок производить с автогидроподъемника АГП-12.

2. После срезки планок ослабить канат, идущий на трактор, давая возможность рулону распушиться.

3. Для развертывания начального участка полотнища приварить тяговую скобу (схема 4), предварительно приварив ограничительную пластину (сеч. Б-Б).

4. До срезки тяговой скобы, не ослабляя тягового каната, установить клиновой упор между рулоном и развернутой частью стенки. Вершина клинового упора должна находиться на прямой, проходящей через центры резервуара и рулона (схема 5).

5. Ослабить натяжение тягового каната до прижатия рулона к клиновому упору и погашения упругих деформаций полотнища.

6. Приварить вторую тяговую скобу с канатом и снять первую.

7. Сварной шов тяговой скобы не должен работать на излом, т.е. развертывание производить до положения тягового каната по касательной к рулону.

8. Приварку скобы должен производить квалифицированный сварщик, имеющий удостоверение.

9. Запрещается пребывание людей в зоне между развернутой частью полотнища и рулоном и в зоне развертывания рулона (схема 5). Сварщик должен располагаться на расстоянии не менее 1м от клинового упора.

Бригадир должен отработать систему связи и сигнализации, располагаясь на расстоянии 6 м. от развертываемого рулона.

10. Оставлять рулон, находящийся в стадии развертывания (в обеденный перерыв или по окончании смены), допускается после установки клинового упора в рабочее положение.

					ТП 704-1-254 с.92		ПМ	
Нач.отд.	Ларионов			Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 тыс.т.	Стадия	Лист	Листов	
Гл.инж.	Резник		11.91	Развертывание полотнища стенки резервуара (окончание)	РП	20		
Гл.спец.	Ленкова		11.91		Гипронефтеспецмонтаж г. Москва.			
Инж.I кат.	Гай							

Инв.№

Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№подл.

Типовой проект 704-1-254 с.92 Альбом 6

25610-06 22

СХЕМА 1. Монтаж начального щита.

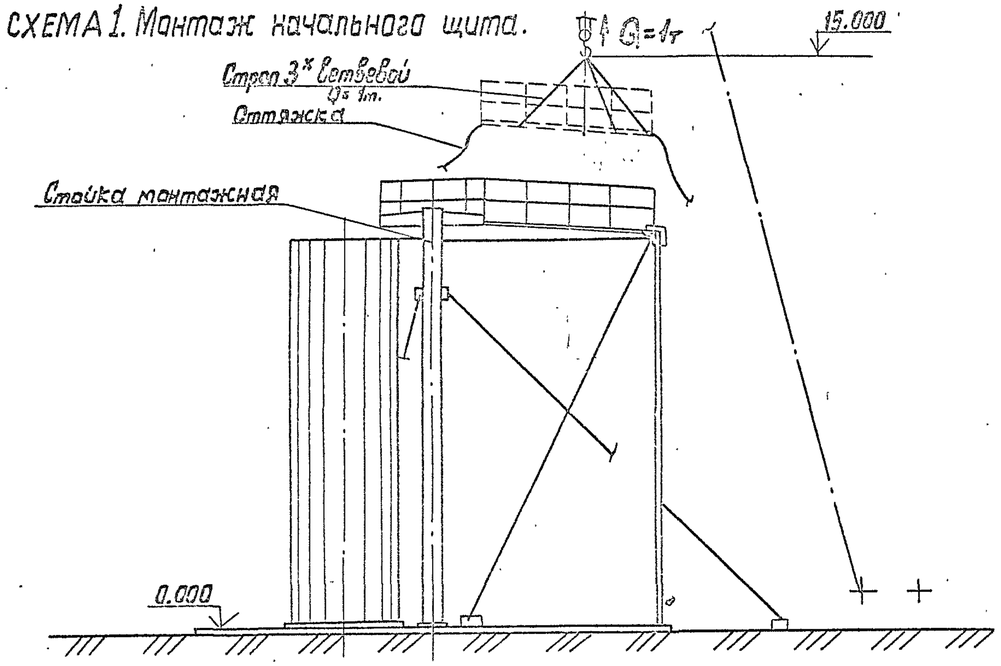

СХЕМА 2. Расположение расчалок при установке первого щита.

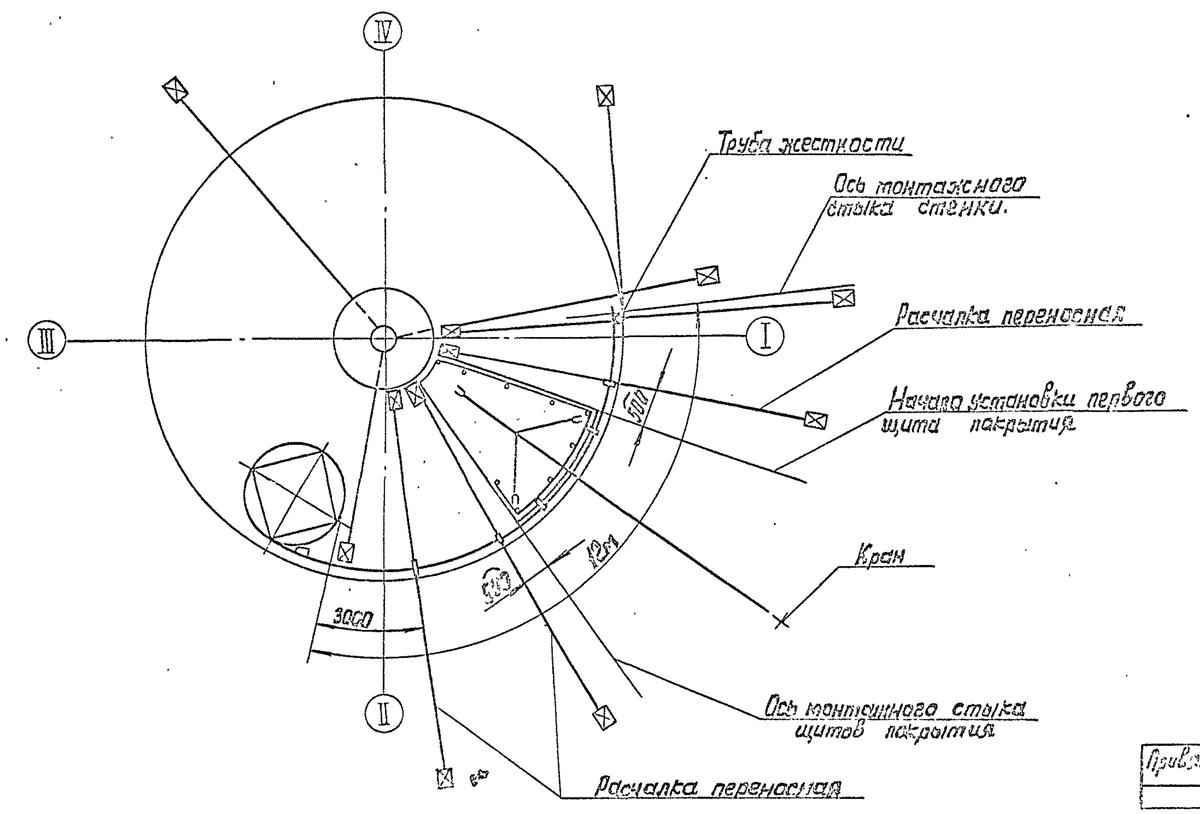

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Подготовительные работы.

1.1. Полотнище стенки развернуть и приварить на участке, указанном на схеме 2.

На развернутом участке полотнища отметить ось начала установки первого щита покрытия (схема 3).

1.2. Установить монтажную стойку. Проверить по отвесам вертикальность монтажной стойки (3 отвеса).

1.3. На каждом щите установить и приварить согласно разметке:

1) ловители (схема 3, сеч. Г-Г, сеч. Д-Д);
2) проектное кольцевое ограждение (сеч. Б-Б);
3) на начальном щите - радиальное ограждение (сеч. А-А);
4) радиальное ограждение на длине 1м.

1.4. Закрепить на концах щита пеньковые оттяжки (сеч. А-А).

1.5. Проверить качество швов приварки строповочных скоб и при необходимости усилить.

1.6. Установить кран для монтажа первого щита.

2. Монтаж первого щита крыши.

2.1. Установить кронштейн с расчалками и отвесом в зоне установки начального щита на расстоянии 500мм от отметки оси монтажного стыка щитов (схема 2).

2.2. Проверить вертикальность стенки по отвесам.

При необходимости отрегулировать положение полотнища талрепами расчалок.

2.3. Произвести строповку первого щита покрытия 3х ветвевым стропом за заводские скобы.

2.4. При помощи крана поднять щит и, направляя его с помощью оттяжек, опустить вершиной на центральный щит. Закрепить начальный щит на центральном щите монтажными болтами, находясь за кольцевым ограждением центрального щита.

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

					ТП 704-1-254 с. 92 ПМ		
Привязан					Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб.м.	Стадия	Лист	Листов
			Нач.отд.	Варчаков		РП	21	
			Гл.спец.	Рахин	11.91	Монтаж внутто-сварного покрытия (начало)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва	
			Нач.сектор	Панова	11.91			
Инв.№			Инж.	Бек				

25610-06 23

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Схема 3. Монтаж последующих щитов покрытия.

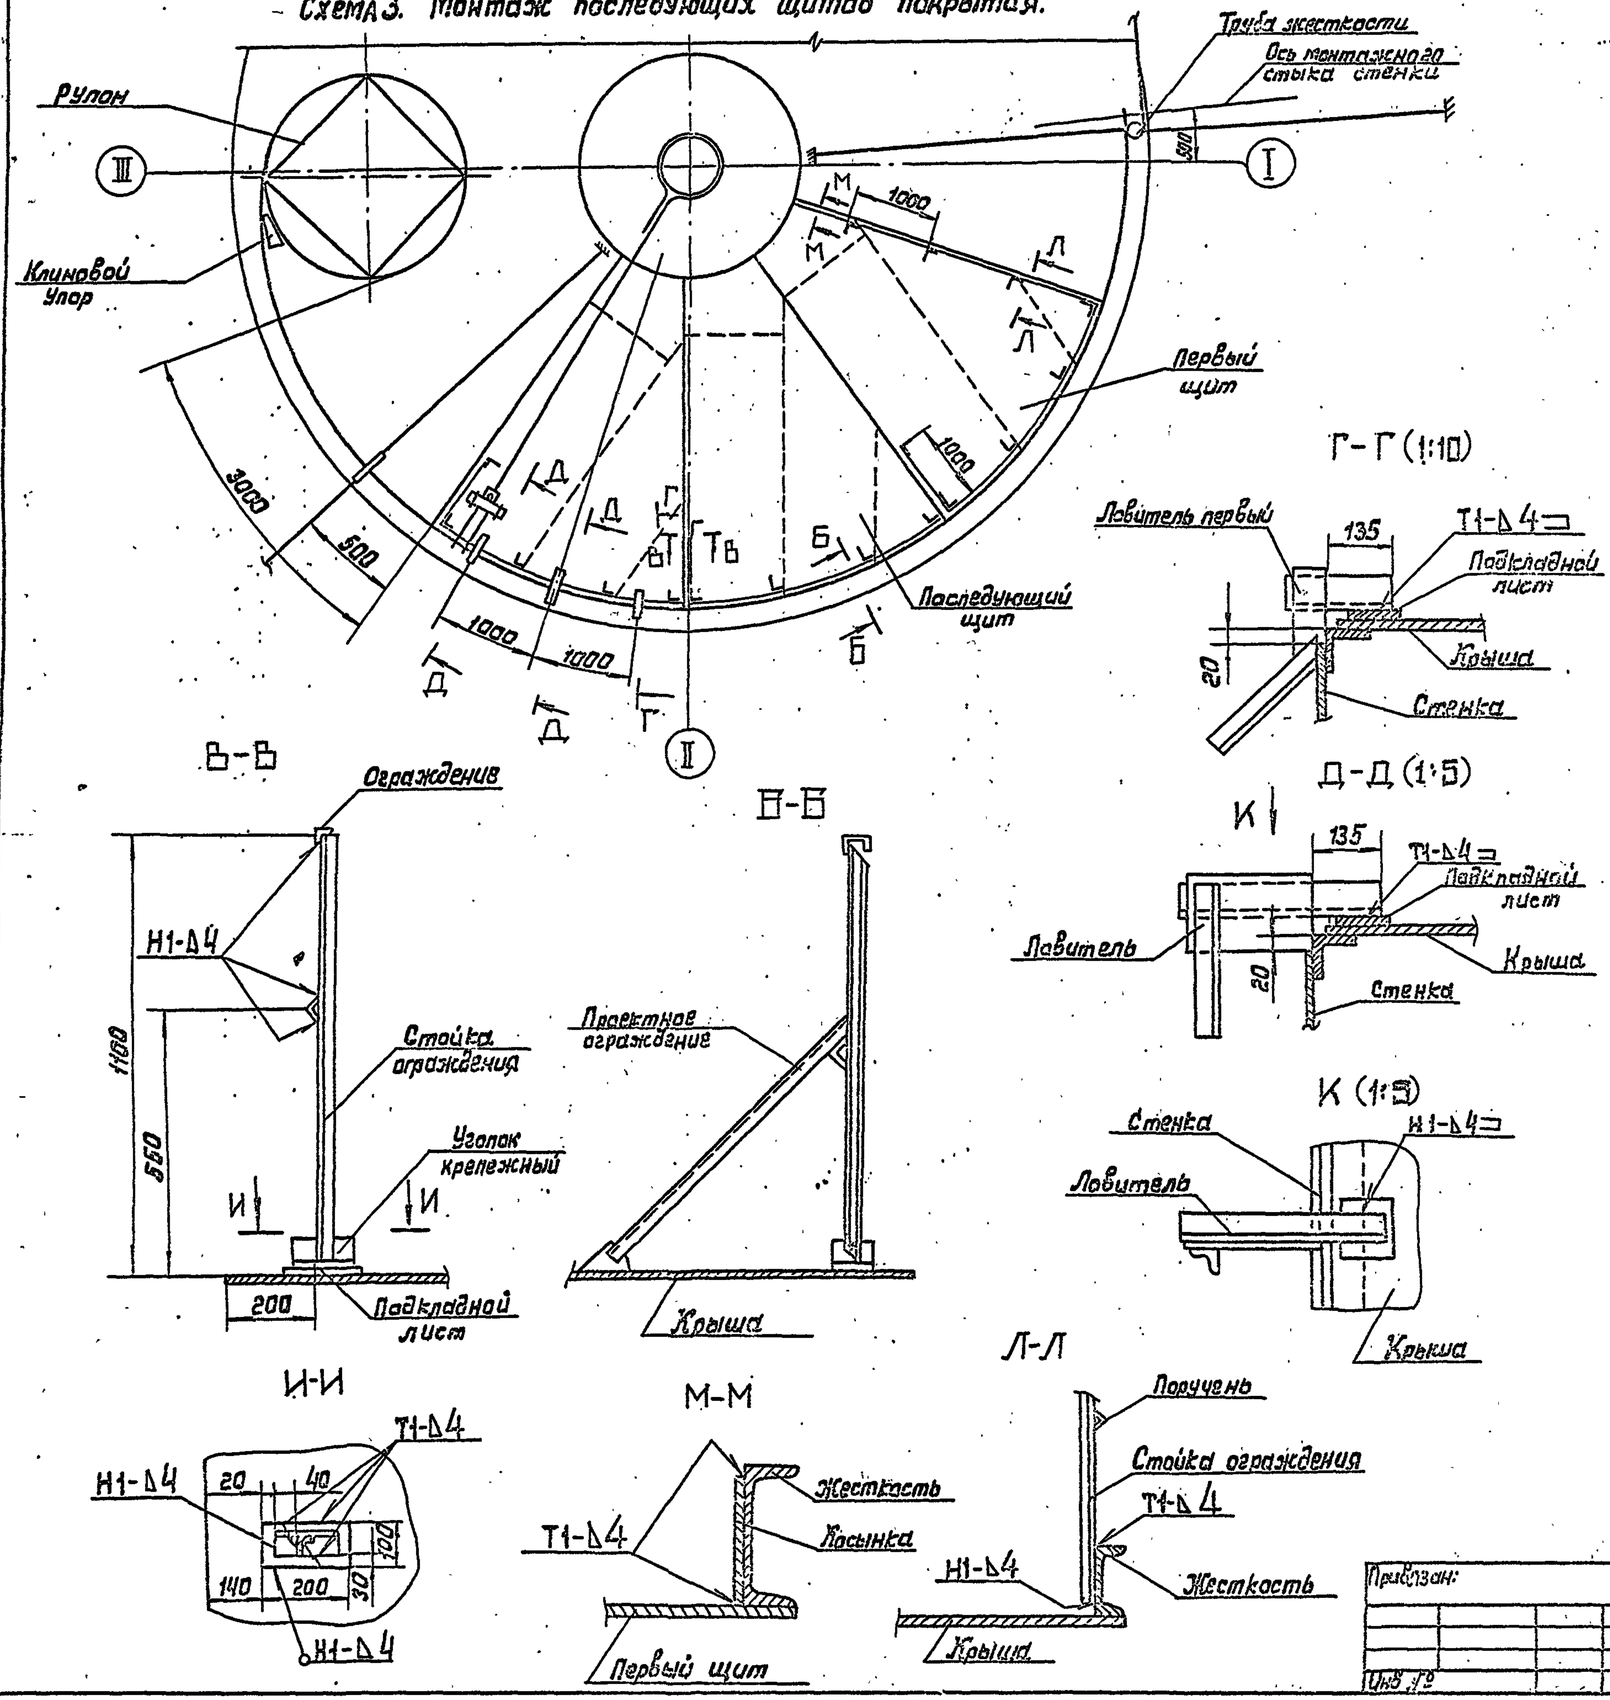

ПОРЯДОК РАБОТ (продолжение)

2.5. Спустить основание щита, оперев его на стенку всеми ловителями. Проверить проектное положение начального щита по отметкам.

2.6. Снять нагрузку с крана, не расстропливая щит.

2.7. Приварить щит к центральному кольцу сплошными проектными швами.

2.8. Произвести подгонку и приварку щита к стенке прерывистым швом 4-100/200 по всей длине.

В местах неплотного прилегания произвести прижим кромки полотнища стенки с помощью приспособления для прижима стенки к щиту и рычажной лебедки, закрепленной на патрубке центральной монтажной стойки (схема 3, вид Н).

2.9. Расстропить щит и освободить кран.

3. Монтаж последующих щитов.

3.1. Монтаж остальных щитов вести по мере разворачивания и приварки стенки с отставанием от рулона на 3м.

При установке и подгонке очередного щита крыши перетащать рулон стенки запрещается.

3.2. Поднять щит краном и установить его в проектное положение, собрав с центральным щитом на монтажных болтах, и оперев на стенку всеми ловителями. Проектный нахлест с начальным щитом должен составлять 40мм.

3.3. Снять нагрузку с крана, ослабив зетви строп.

3.4. Приварить щит к центральному кольцу сплошными проектными швами, стоя на центральном щите.

3.5. Сварить радиальный монтажный стык между щитами прерывистым швом 4-100/200, стоя на ранее установленном и приваренном щите. Подогнать и приварить щит к стенке.

После этого расстропить щит и освободить кран.

3.6 Остальные щиты монтировать аналогичным образом.

3.7. Сварить всю крышу сплошными проектными швами согласно технологии сварки.

Привязан:					ТП 704-1-254 с. 92			ПМ
Инв. №				Нач. отд.	Ларионов		Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб.м.	Стадия: Р.П. Лист: 22 Листов:
				Гл. спец.	Рогин			
				Н. контр.	Панова		Монтаж знуто-сварного покрытия (продолжение)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №		Инж.	Пак			

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Схема 4. Прижим стенки к щиту покрытия

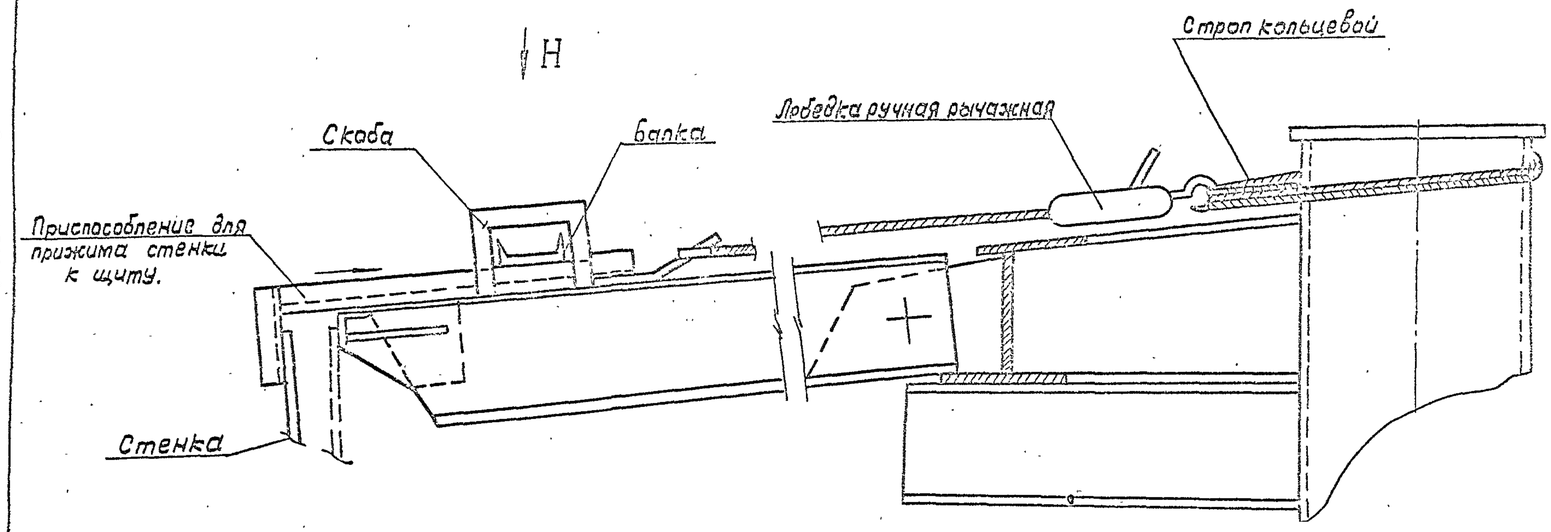

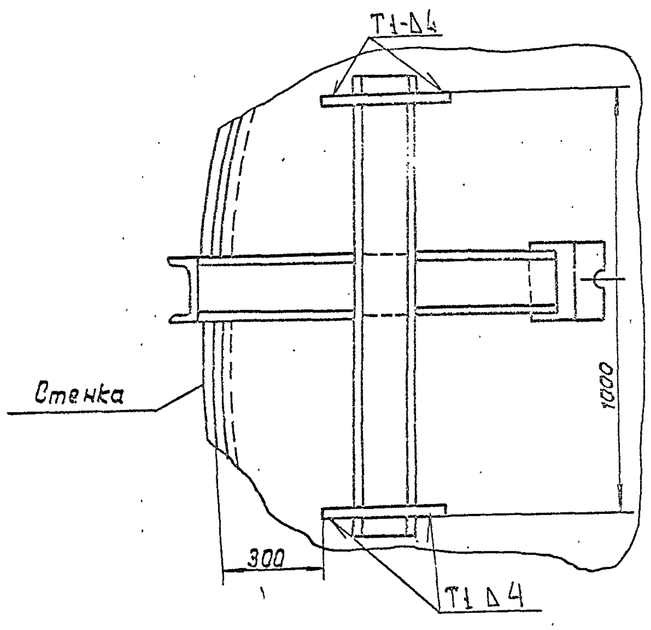

УКАЗАНИЯ

1. Выход и работа людей на щите разрешается только после приварки его к центральному кольцу и надежного опирания на стенку всеми повителями.
2. На щите разрешается находиться не более 2 х человек одновременно.
3. Срезку повителей разрешается производить только после приварки крыши к стенке по всему периметру кольца.
4. При подгонке и приварке:

щита к центральному кольцу - рабочий должен закрепиться монтажным поясом за конструкцию центрального щита;

начального щита к стенке - рабочий должен закрепиться к верхней кромке стенки (приварив проушину) с помощью ПВУ-2 (предохранительное верхолазное устройство);

радиальных стыков между щитами - рабочий должен находиться на ранее установленном и приваренном щите, закрепившись к нему с помощью ПВУ-2;

промежуточных щитов к стенке резервуара - рабочий должен закрепиться к ранее установленному щиту с помощью ПВУ-2.

5. При установке и подгонке очередного щита покрытия перемещать рулон стенки запрещается.

Привязан:					ТП 704-1-254 с. 92 ПМ			
			Нач.отд.	Ларионов		Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб.м.	Стадия	Лист	Листов
			Гл.спец.	Рохин	11.91		РП	23	
			Нач.сект.	Панова	11-91	Монтаж гнуто-сварного покрытия (окончание)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
Инв.№			Инж.	Пак					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

25610-06 25

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Схема 1 Установка приспособления для замыкания и подмостей

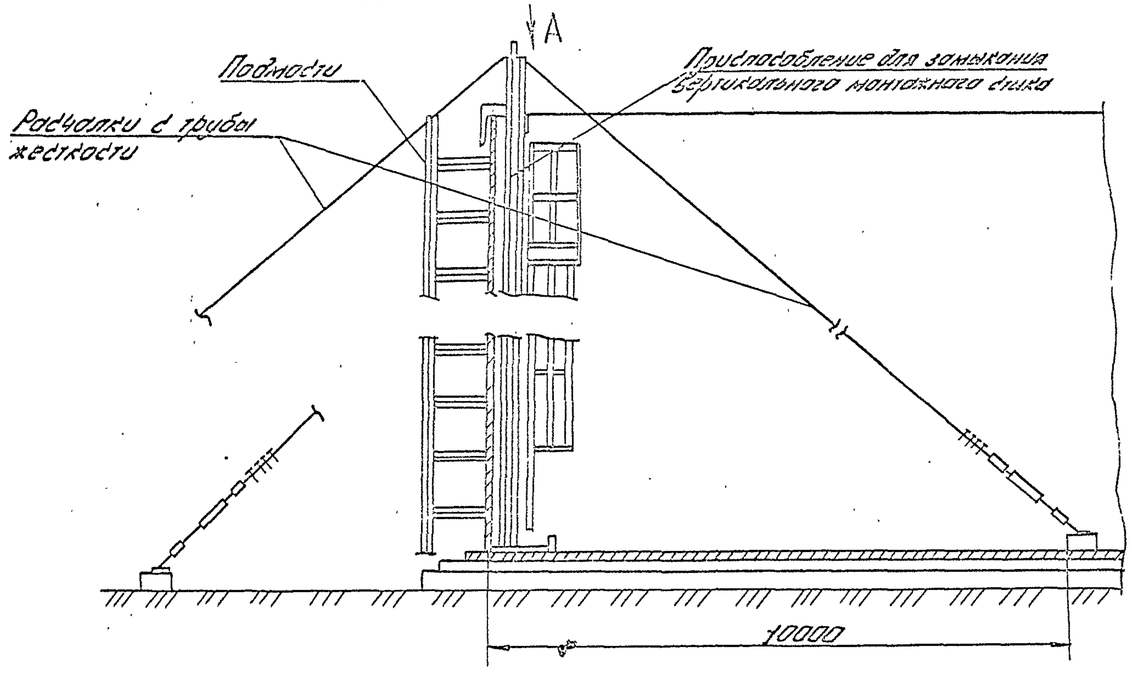

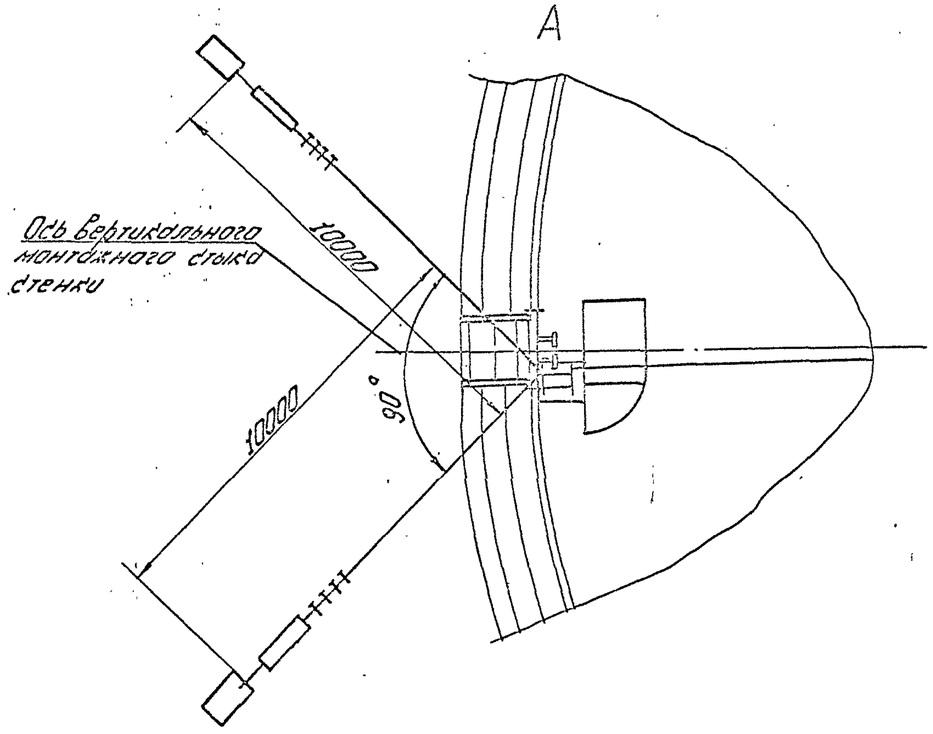

Е (1:5) лист 25

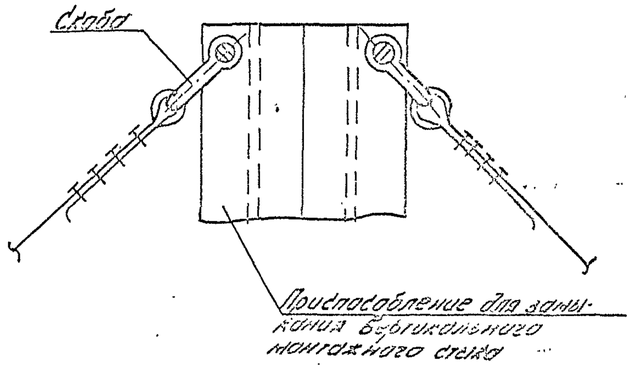

Порядок работ

1. До замыкания вертикального монтажного стыка стенки завести внутрь резервуара приспособление для замыкания вертикального монтажного стыка.

2. Выверти домкратами концевые участки полотнища стенки за контрольную риску R 5220 мм (радиус резервуара наружный) на величину, равную 9мм (1,5 толщины нижнего пояса стенки).

Зафиксировать смежные кромки в этом положении приварными пластинами (сеч. Г-Г).

3. Установить в исходное положение приспособление для замыкания, закрепить подпятник, приварив ограничители (сеч. Б-Б, сеч. Д-Д).

Проверить по отвесам вертикальность приспособления и зафиксировать это положение расчалками (схема 1 вид Е, вид Д).

4. Произвести выравнивание стенки в зоне стыка с помощью винтов приспособления (сеч. В-В).

Стык выставить вертикально, контроль производить по отвесу.

5. Установить с наружной стороны подмости.

6. Произвести срезку нахлёста стыка, выдерживая прямолинейность реза и зачистку кромок под сварку.

7. Произвести сборку стыка на прихватках (при необходимости принять стяжные приспособления) и его сварку.

				ТП 704-1-254 с. 92 ПМ			
Привязан:				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для сжижения мощностью емкостью 100 куб.м.	Стадия	Лист	Листов
			Гл. инж.	Абрамов		РП	24
			Гл. инж. пр.	Розин	11.91	Замыкание вертикального монтажного стыка стенки резервуара (начало)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва
			Инж.	Рязова	11.91		
Инв. №			Инж.	Пик			

25610-06 26

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Схема 2. Строповка приспособления для замыкания

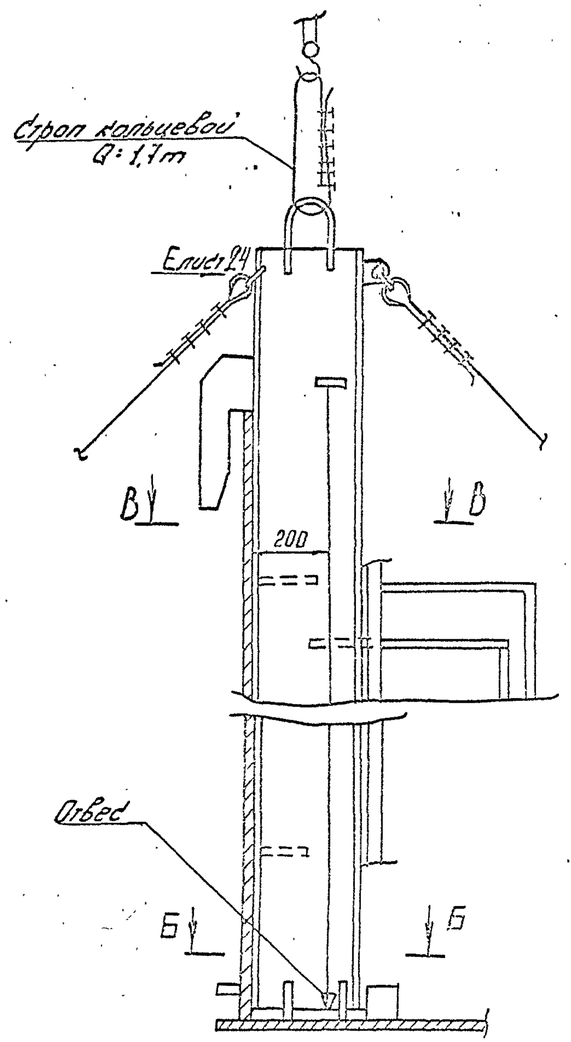

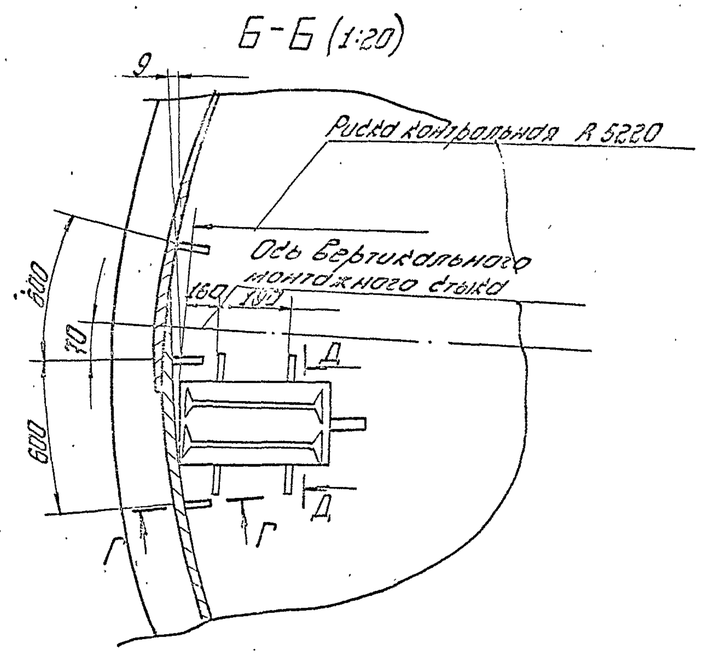

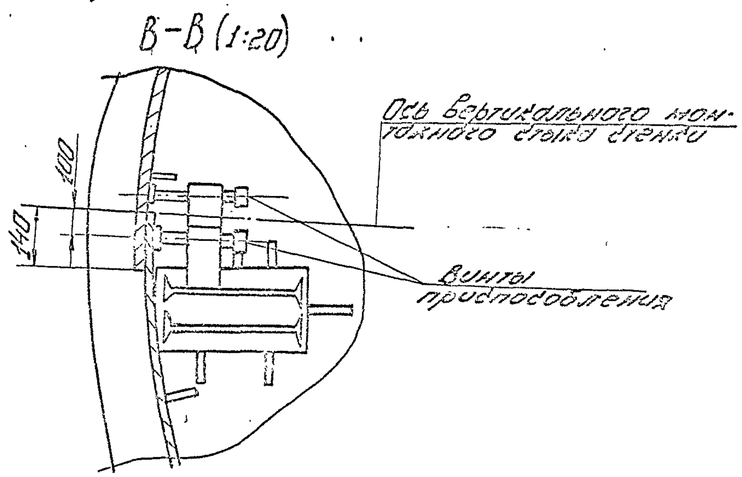

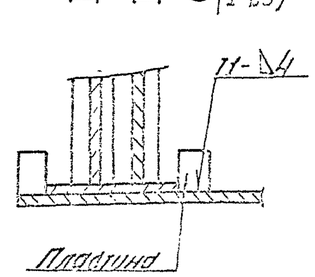

Указания

1. Расположение вертикального монтажного стыка стенки уточнить с учетом фактического состояния кромок полотнища.
2. При расчаливании приспособления для замыкания стыка использовать расчалки с демонтированной трубы жесткости.
3. Приварку монтажных приспособлений к стенке и днищу резервуара производить электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.

Сварной шов выполнять по ГОСТ 5264-80.

Схема 3. Установка стяжного приспособления

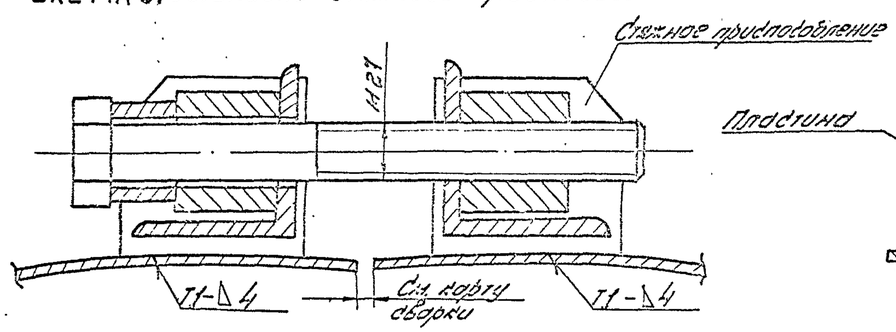

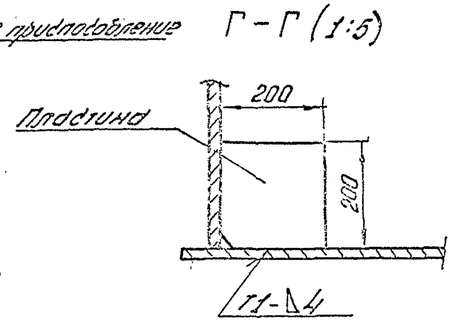

Привязан:						ТП-704-1-254 с. 92		ПЛ
						Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения этилена емкостью 100 куб.м.	Стадия	Лист	Листов
			Н. контр.	Иванов			РП	25	
			Гл. спец.	Лукин	11.91	Замыкание вертикального монтажного стыка стенки резервуара (Окончание)	Ленгипроспецнефтемаш г. Москва		
Инв. №			Нач. отд.	Попов					

25610-06 27

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Этап 1.

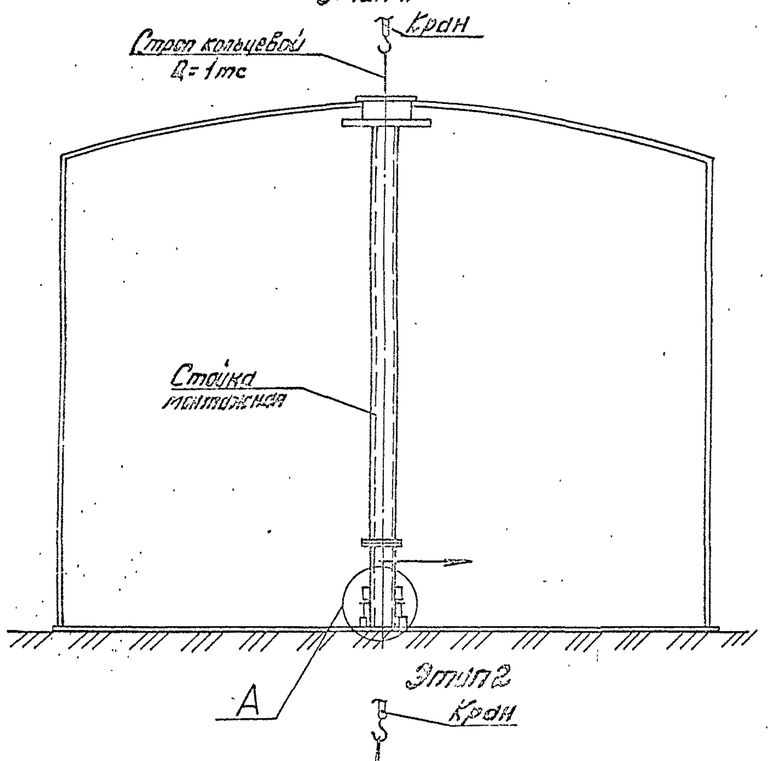

Этап 2

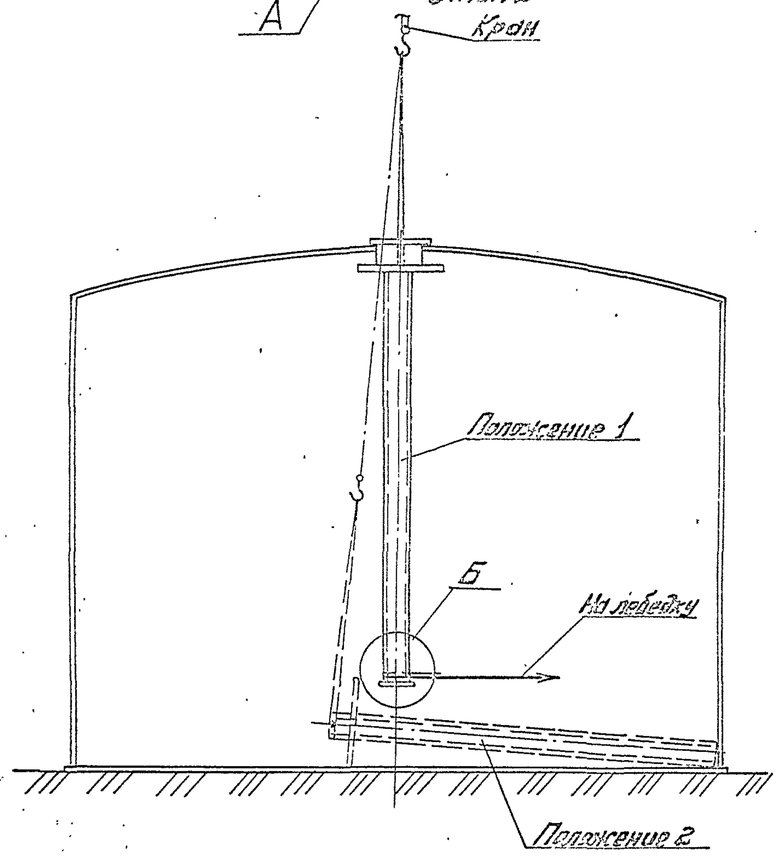

А (1:10)

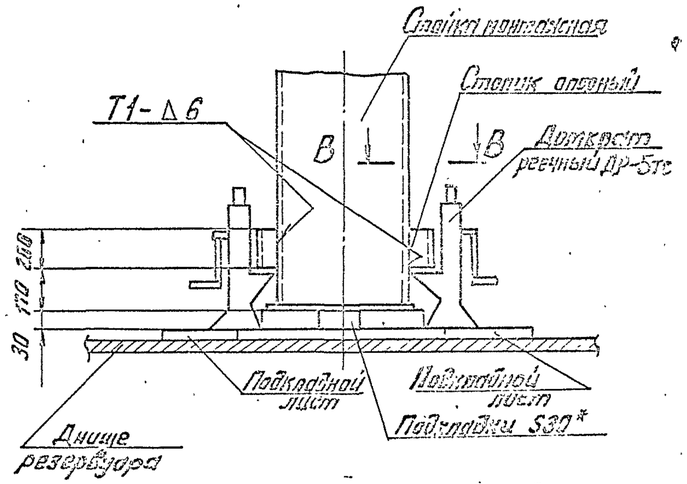

Схема 3. Расположение домкратов.

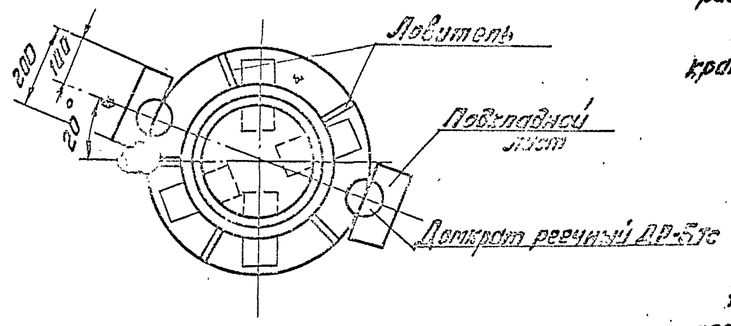

Б (1:20)

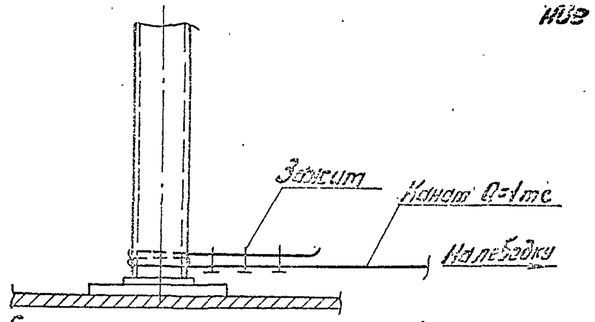

В-В (1:5)



Порядок работ.

1. Демонтаж стойки производить после сборки и сварки крыши.
2. Срезать ограничительные косынки, фиксирующие центральное кольцо крыши на монтажной стойке.
3. Приварить к стойке опорные столики.
4. Установить домкраты под монтажную стойку и убрать из-под стойки пакет подкладок.
5. Произвести строповку стойки на крюк крана (схему строповки см. лист „Установка монтажной стойки")
6. Опустить домкраты так, чтобы стойка встала на подкладной лист, после чего убрать домкраты.
7. Произвести срезку ловителей, фиксирующих стойку.
8. Разболтить фланцевое соединение стойки, приподнять стойку краном и удалить нижнюю часть стойки.
9. Закрепить канат лебедки к низу в верхней части стойки и одновременно опуская стойку сверху, оттянуть её снизу с помощью лебедки. Уложить стойку на днище и произвести срезку раскосов стойки.
10. Удалить верхнюю и нижнюю часть стойки краном через люк лаз.

Указания

1. Лестницу стойки удалить до монтажа последнего щита.
2. При опускании монтажной стойки нахождение людей в резервуаре запрещается.

Привязан:						ТП 704-1-254 с. 92		ПМ
				Гл. инж.	Лещенко			
				Гл. спец.	Попова		11.91	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения нефти и нефтепр. 100 тыс. м³.	Стадия	Лист	Листов
				Н. отд.	Розин		11.91	Демонтаж монтажной стойки	РП	26	1
Инв. №				Инж.	Листова				Гипронефтеспецстрой г. Москва	

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254с.92

А-А (ограждение площадок условно не показано)



В-В (1:20)

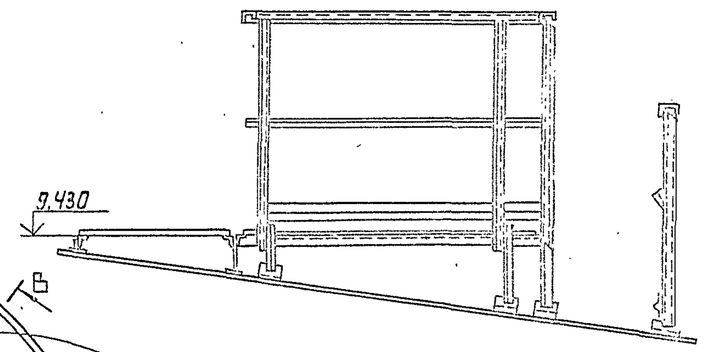

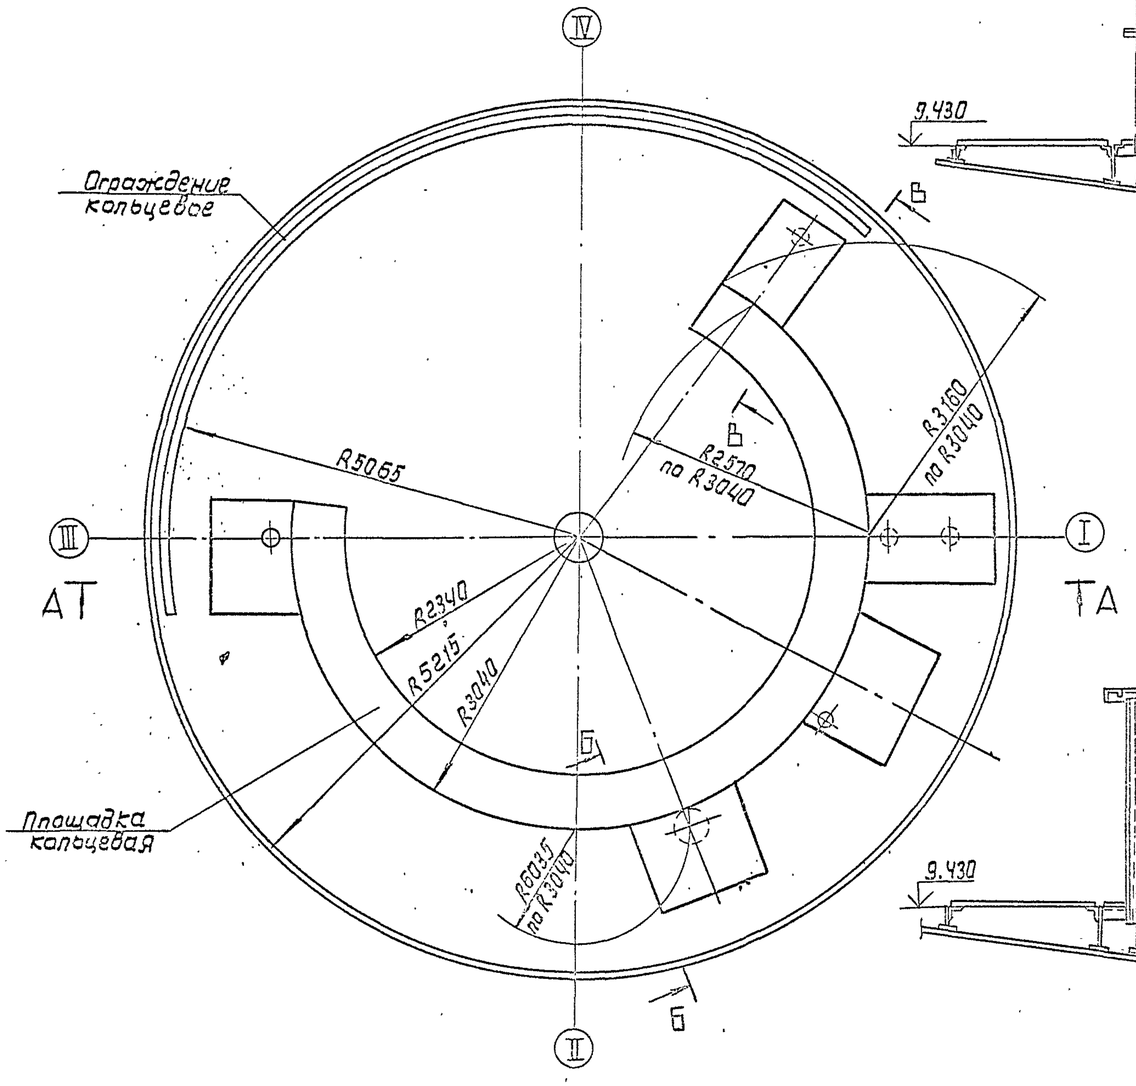

Б-Б (1:20)

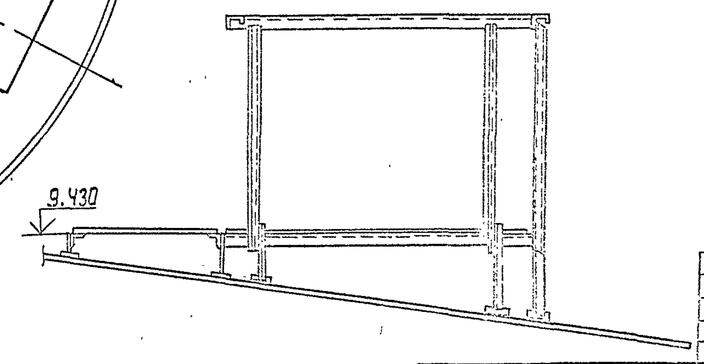

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Установить и приварить на крыше кольцевое ограждение.
2. Произвести разметку крыши под вырезку отверстий люков и патрубков.
3. Вырезать отверстия, установить и приварить люки и патрубки.
4. Установить и приварить на крыше площадки обслуживания с ограждениями.

УКАЗАНИЯ

Разметку крыши под вырезку отверстий, установку люков, патрубков, площадок обслуживания, кольцевого ограждения производить согласно разметке, указанной на чертежах КМ альбома 2.

Привязан:				ТП 704-1-254с.92 ПМ			
				Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб.м.	Стадия	Лист	Листов
		Нач.отд.	Ларионов		РП	27	
		Гл.спец.	Рохин	11.91	Монтаж площадок и ограждения на крыше	ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва	
		Н.контр.	Иванова	11.91			
Инв. №		Инж.	Пак				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

25610-06 29

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Схема 1. Разводка временных трубопроводов.

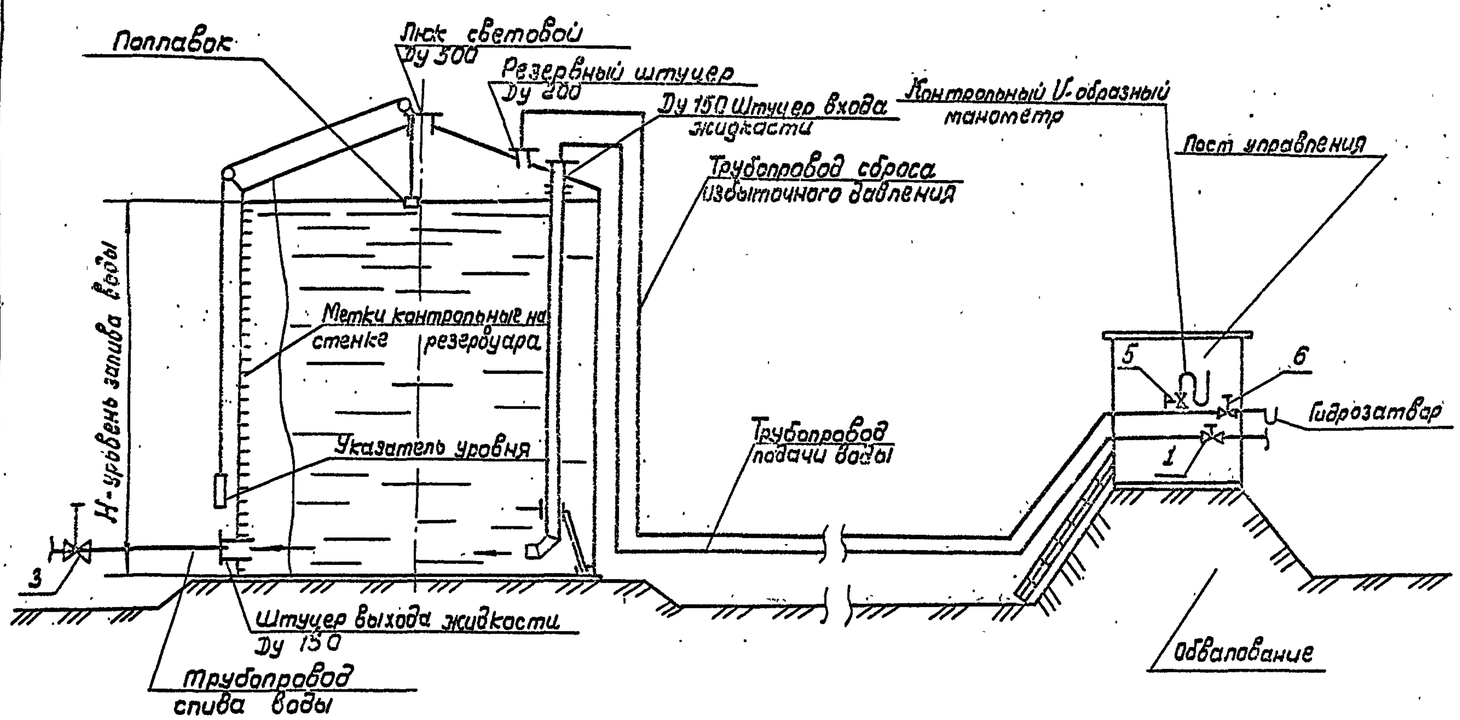

Схема 3. Гидрозатвор.

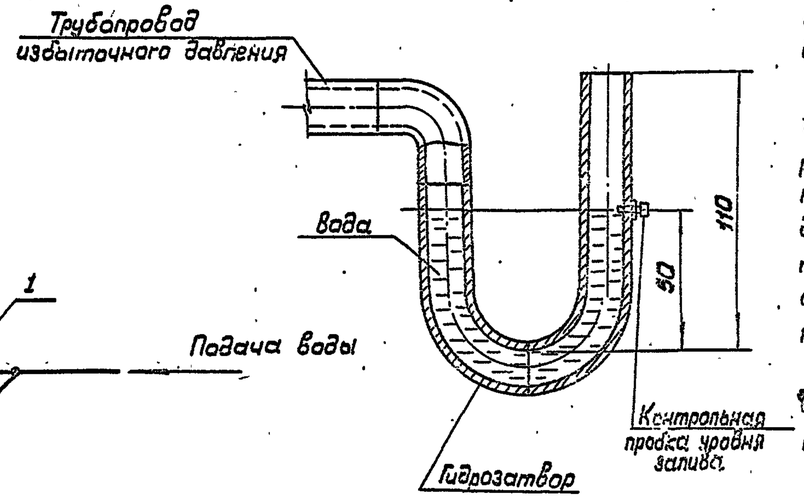

Схема 2. Подача и слив воды.

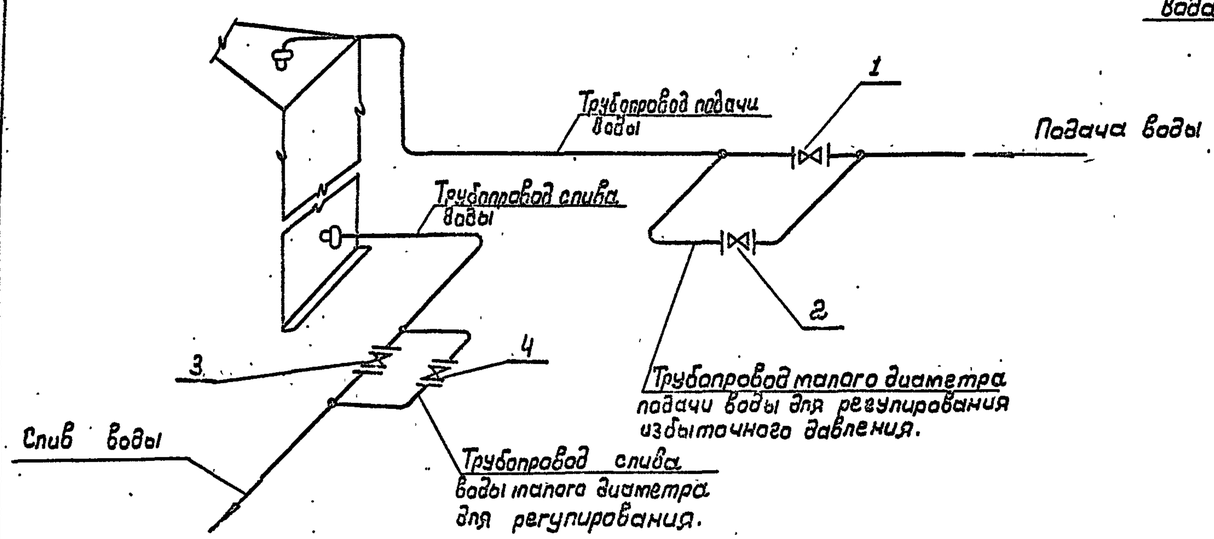

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Подготовительные работы.

1.1. До начала испытаний закончить все сварочные работы и контроль сварных соединений.

1.2. Удалить из резервуара все посторонние предметы.

1.3. Очистить днище и стенку от грязи.

1.4. Произвести осмотр соединений и поверхности днища, нижних поясов стенки, крыши на предмет выявления и устранения возможных прожогов или других повреждений.

1.5. Смонтировать временный подводящий трубопровод подачи и слива воды. Использование проектных трубопроводов для проведения испытаний согласовать при привязке проекта с заказчиком.

Диаметр временного трубопровода определить с учетом максимальной производительности имеющегося насосного оборудования (схемы 1, 2).

1.6. Смонтировать временные подводящие трубопроводы для установки гидравлического U-образного манометра и регулирования давления.

1.7. Все контрольно-измерительные приборы, задвижки для регулирования избыточного давления должны находиться за пределами обвалования, где расположить пост управления. Для этой цели из кровли резервуара вывести трубу необходимого диаметра с отводами для манометра и регулирования давления. Рекомендуемые диаметры труб Ду 50÷200. В конце трубопроводов должны быть поставлены соответствующие задвижки.

1.8. Гидравлический манометр (U-образная трубка). одним концом подсоединяется к отводу трубопровода, который должен быть заглушен и иметь на конце металлический трубчатый переход с наружным диаметром, равным диаметру стеклянной трубы. Другой конец U-образной трубки оставить открытым. Гидравлический манометр собрать из стеклянных трубок диаметром 7÷15 мм, соединенных между собой резиновыми вставками.

Величины избыточного давления измерить в мм. вод. ст. по разности между уровнями воды в U-образной трубке, для чего последнюю закрепить на доске.

Привязан:					ТП-704-1-254 с. 92 ПМ			
					Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб. м.	Стадия	Лист	Листов
			Нач. отд.	Ларионов		РП	28	
			Гл. спец.	Рохин	Испытание резервуара (начало)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
			Н. контр.	Панова				
Инв. №			Инж.	Лак				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254с.92

Таблица 1

Объем резервуара, куб. м.	Разность отметок наружного контура днища, мм			
	при незаполненном резервуаре		при заполненном резервуаре	
	смежных точек на расстоянии 6м по периметру	любых других точек	смежных точек на расстоянии 6м по периметру	любых других точек
700	15	40	30	60

Таблица 2

Номер п/п	Наименование отклонений	Предельные отклонения, мм	Примечания
1	Днище Высота хлопунов	150	Предельная площадь хлопуна на 2 м²
	Стенка		
2	Отклонение внутреннего диаметра на уровне днища	± 40	
3	Отклонение высоты при монтаже	± 20	
4	Отклонения от вертикали образующей стенки по поясам:		
	I	± 10	Замеры производить для каждого пояса на расстоянии до 50мм от верхнего горизонтального шва. Проверку отклонений производить через 6м по окружности резервуара.
	II	± 20	
	III	± 30	
	IV	± 40	
	V	± 45	
	VI	± 50	
5	Крыша Разность отметок смежных узлов верха радиальных балок	20	

ПОРЯДОК РАБОТ /продолжение/

на которой нанести шкалу с миллиметровыми делениями.

До установки манометр должен быть испытан.

1.9. Подготовить автогидроподъемник АГП-12 или другое средство для проведения соответствующих измерений и наблюдений.

1.10. Проверить высотные отметки наружного контура днища и произвести измерения геометрических размеров резервуара в соответствии с требованиями таблиц 1,2.

Если отклонения не превышают допустимых, приступить к испытаниям. При наличии отклонений, превышающих допустимые, они должны быть устранены монтажной организацией до начала испытаний.

1.11. Смонтировать трубопровод для аварийного сброса воды из резервуара, выведенный за пределы обвалования.

Диаметр трубопровода должен обеспечить максимальный сброс воды из резервуара.

1.12. Установить на резервуаре указатель уровня налива воды нанести контрольные метки на стенке (схема 1).

1.13. Заглушить люки и патрубки на стенке резервуара, световые люки на кровле оставить открытыми.

1.14. На время испытания установить границы опасной зоны радиусом не менее двух диаметров резервуара, внутри которой не допускается присутствие людей не связанных с испытаниями.

1.15. Все лица, принимающие участие в испытаниях, должны пройти инструктаж по безопасным методам ведения работ с соответствующим письменным оформлением.

1.16. По окончании всех подготовительных работ, предусмотренных настоящим разделом, представителями монтажной организации, ответственной за проведение прочностных испытаний, и заказчиком составляется акт о готовности резервуара к испытаниям.

Привязан:					ТП 704-1-254с.92 ПМ		
	Нач.отд.	Ларионов			Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб.м.	Стадия	Лист	Листов
	Гл.спец.	Розин		11.91		РП	29	
	Н.контр.	Панов			Испытание резервуара (Продолжение)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
Инв.№	Гл.инж.	Пск						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

2. Испытания резервуара

Испытание резервуара на прочность и устойчивость производить при различных сочетаниях нагрузок: гидростатическое давление, гидростатическое и избыточное давление для испытания сварных швов на плотность.

2.1. Гидравлическое испытание

2.1.1. Открыть все световые люки на крыше резервуара, а также все задвижки и вентили трубопровода, сброса избыточного давления (вакуума) (схема1).

2.1.2. Закрыть задвижки 3,4 трубопровода слива воды (схема2). Задвижка 2 должна быть закрыта.

2.1.3. Открыть задвижку 1 и подать воду в резервуар, налив воды до расчетной высоты H=

Заполнение осуществлять ступенями, по поясам, с промежутками, необходимыми для осмотра. По мере заполнения резервуара водой необходимо визуально наблюдать за состоянием конструкций и сварных соединений стенки. Полный резервуар, залитый водой до проектной отметки, испытать на гидростатическое давление с выдержкой 24 часа. При этом задвижка должна быть закрыта.

Если в процессе испытания и при выдержке под гидростатической нагрузкой на поверхности стенки резервуара или по краям днища не появятся течи и если уровень воды не будет снижаться, резервуар считается выдержавшим гидравлическое испытание.

2.1.4. Если в процессе испытания будут обнаружены отпотины, свищи, течи и трещины в швах поясов стенки (вне зависимости от величины дефекта), испытание должно быть прекращено и вода немедленно слита до уровня на один пояс ниже расположения дефекта.

Обнаруженные дефектные места подлежат удалению и заварке. Исправленные места повторно проверить на герметичность и при отсутствии течи испытание может быть продолжено.

2.1.5. После залива резервуара водой до расчетного уровня и выдержки под нагрузкой 24 часа произвести следующие измерения:

1) горизонтальности наружного контура днища и определения осадки основания;

2) отклонений образующих стенки от вертикали и местных отклонений стенки.

Указанные измерения должны сопоставляться с замерами до залива резервуара.

2.1.6. Гидравлическое испытание необходимо проводить при температуре окружающего воздуха +5°С и выше. При необходимости испытания резервуара в зимних условиях водой должны быть приняты меры по предотвращению замерзания воды в трубках и задвижках, а также обмерзания стенок резервуара.

2.2. Испытание сварных швов крыши на плотность.

2.2.1. Слить воду в резервуаре до высоты.

2.2.2. Закрыть все люки и патрубки на крыше резервуара, проверить их герметичность. Открыть вентили 5,6 контрольного манометра и гидрозатвора (схема 1). Все остальные задвижки 1.2.3.4. по схемам 1.2 при этом должны быть закрыты.

2.2.3. Залить воду в гидрозатвор до уровня контрольной пробки (схема 3).

2.2.4. Закрыть задвижку 1 и подавать воду по трубопроводу малого диаметра, открыв вентиль 2. Довести давление до 100мм вод.ст. и закрыть вентиль 2.

Контроль давления вести по U-образному манометру.

2.2.5. Произвести контроль сварных швов крыши обмыливанием. Все обнаруженные дефектные места отметить, после чего сбросить давление. Исправить дефектные места и повторить контроль, создав давление 100мм вод. ст.

3. Требования безопасности труда

3.1. До начала испытаний приказом по организации, на которую возложено проведение испытаний, назначить ответственное лицо-руководителя испытаний.

3.2. Перед проведением испытаний все работники, принимающие участие в них, обязательно должны пройти инструктаж по безопасным методам ведения работ непосредственно на местах их выполнения, с соответствующим письменным оформлением.

3.3. Установленная граница опасной зоны должна быть ограждена предупредительными знаками.

Площадка внутри опасной зоны должна обеспечивать свободный доступ к резервуару и задвижкам, снабжена инвентарными трапами для прохода через траншеи, предупредительными знаками и т.д.

3.4. Выполнять работы на крыше резервуара разрешается только при наличии ограждения.

3.5. Работы внутри резервуара производить только под непосредственным надзором лица, ответственного за проведение испытаний.

3.6. Для наблюдения за состоянием конструкций во время испытаний в ночное время сам резервуар, а также все места установки приборов, приспособлений, лестниц, проходы и т.п. должны быть хорошо освещены.

3.7. На все время испытаний нахождение лиц, не участвующих в испытаниях, внутри зоны обвалования запрещается.

3.8. Осмотр состояния конструкций резервуара при испытаниях и проведении замеров производить только лицам, назначенными руководителем испытаний.

3.9. Во время повышения избыточного давления нахождение лиц, участвующих в испытаниях, в зоне обвалования не разрешается.

3.10. Допуск к осмотру конструкций резервуара разрешается не ранее чем через 10мин. после достижения установленных рабочих нагрузок.

3.11. Производить остукивание молотком или кувалдой стенки резервуара, наполненного водой, запрещается.

3.12. Производить испытание кровли резервуара на прочность и герметичность во время дождя не разрешается.

3.13. При испытаниях крыши резервуара за показаниями U-образного манометра и состоянием конструкций установить постоянное наблюдение с безопасного расстояния (за обвалованием резервуара).

3.14. В процессе испытаний, когда резервуар залит водой и создано испытательное давление, подходить к резервуару или подниматься на крышу строго запрещается.

Подходить к резервуару для производства работ разрешается только после выдержки конструкции под нагрузкой не менее 30мин. и после сброса давления.

3.15. До испытаний крыши резервуара избыточным давлением на люках крыши установить предохранительную арматуру (клапаны, гидрозатворы), рассчитанную на соответствующие испытательные нагрузки.

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254с. 92

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Привязан:

Инв.№

Гл.инж.проекта	Ларионов		
Гл.спец.	Ролин		11.91
Н.контр.	Панова		11.91
Инж.	Пак		

ТП 704-1-254с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения нефти емкостью 700 куб.м.

Стадия	Лист	Листов
РП	30	

Испытание резервуара (окончание)

ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ г. Москва

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Схема 1. Сварка шва №1

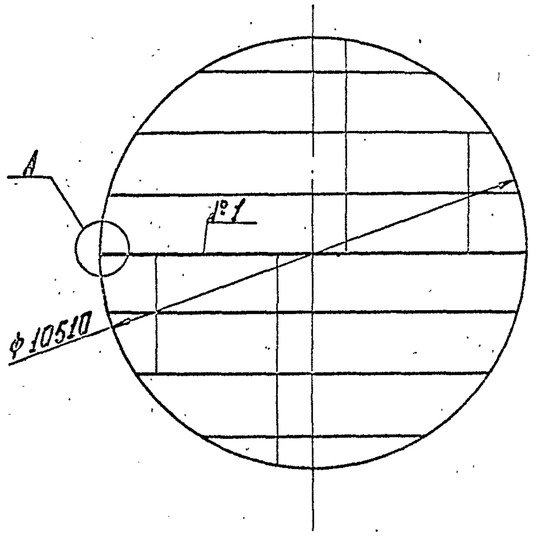

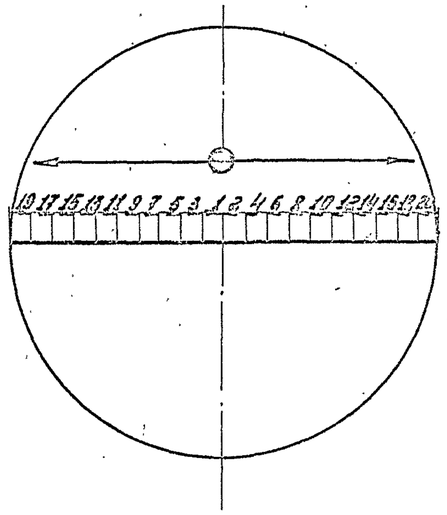

А

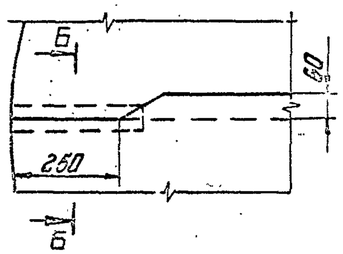

Б-Б



Порядок работ

1. Сборку элементов днища производить согласно технологии монтажа (стр. 11). При сборке обеспечить величину нахлёста листа 60 мм и зазор $6^{+1,0}_{-0,5}$ мм на краевых участках шва L=250 мм.

2. Прихватку и сварку днища производить способом ручной электродуговой сварки электродами типа Э-42А марки УОНИ 13/45 диаметром 3,0 и 4,0 мм.

3. Произвести прихватку элементов днища швом №1-Д4 30/250.

4. Произвести сварку шва №1. Сварку выполнять участками согласно схеме сварки.

5. Произвести контроль выполненного шва №1 внешним осмотром и измерением. Проверить герметичность методом вакуумирования.

Контроль перефирийных участков шва №1 (по l=250 мм) произвести методом радиографии.

Характеристика сварных соединений днища

Номер шва	Сечение шва и размеры	Тип шва	Положение шва	Толщина соединяемых деталей, мм	Длина шва, м	Масса н. м., кг	Расход электродов марки УОНИ 13/45 ф3,0	Расход электродов марки УОНИ 13/45 ф4,0
1	60	Н-Д4	Нижнее	4+4	10,01	1,35	0,9	1,8
	8; $2^{+1,0}_{-0,5}$	С5	"	"	0,5	0,1	0,2	–

Условные обозначения:

— сварной шов

Размещение сварщика и общее направление сварки.

3 — Номер технологического участка шва и направление его сварки.

Привязан:					ТП 704-1-254 с. 92		ПМ
			Нач отд.	Первушов			
			Гл. спец.	Рогин		4.91	
			Гл. спец.	Чернышов			
			Н. контр.	Панова		4.91	
Инв. №			Инж.	Зашина			

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб. м. — Сварка днища

Стадия	Лист	Листов
РП	31	

Гипронефтеспецстрой Минхимнефтемаш г. Москва

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Сварка стенки с днищем и обвязочным уголком

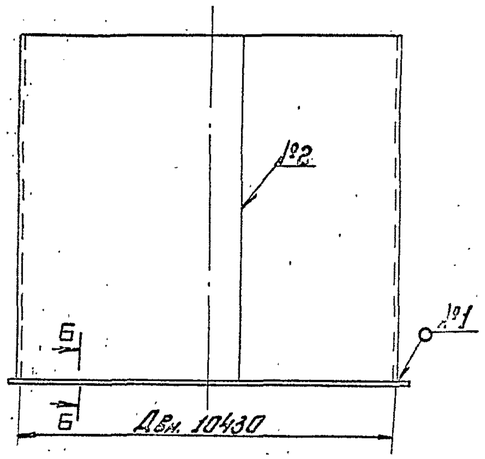

Сварка шва №2

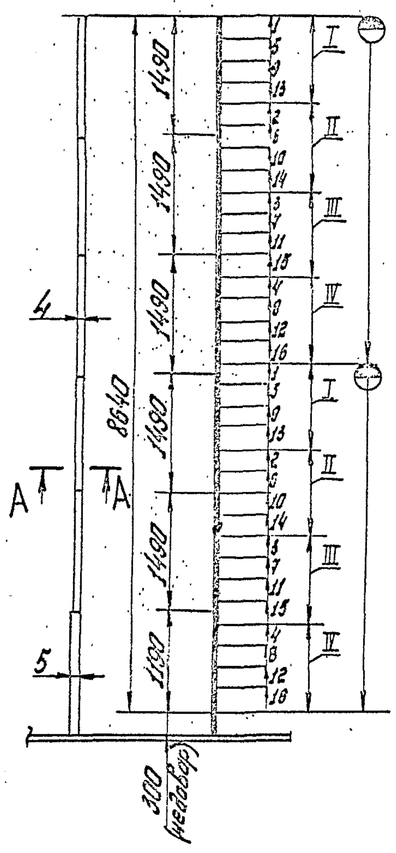

А-А (г:1)

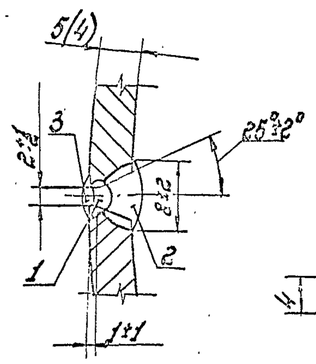

Б-Б (г:1)

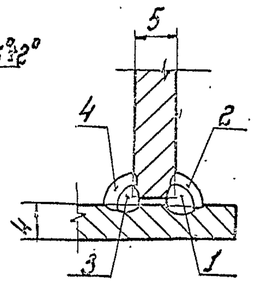

Схема 1. Сварка шва №1

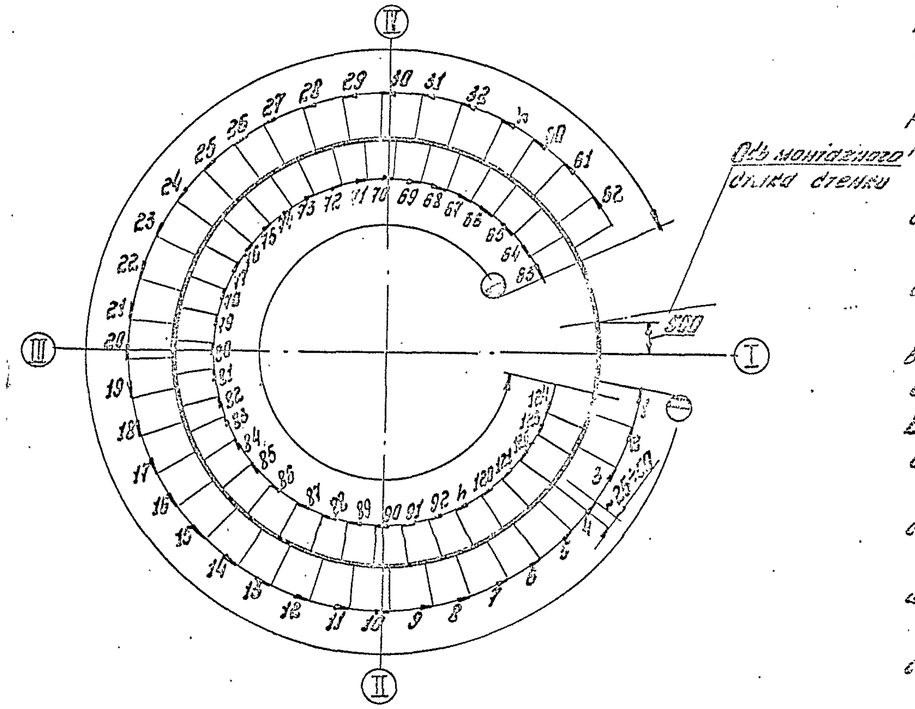

Схема 3. Доварка пересечения шва №1 со швом №2

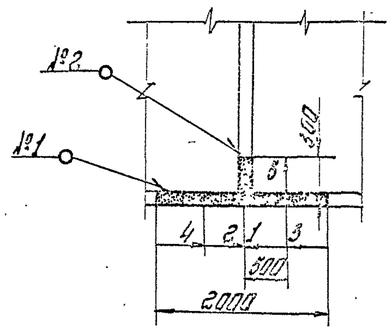

Условные обозначения:

- Сварной шов
- Размещение сварщика и общее направление сварки
- 5 Номер технологического участка шва и направление его сварки

Порядок работ

1. Разворачивание рулона стенки и замыкание вертикального монтажного стыка производить согласно технологии монтажа (стр. 25).

2. Прихватку и сварку швов №1; 2 выполнять способом ручной электродуговой сварки электродами типа Э-42А марки УОНИ 13/45 диаметром 3,0 и 4,0 мм.

3. Сварку швов №1; 2 рекомендуется выполнять двумя сварщиками при одновременной их работе на разных высотах.

4. По мере разворачивания рулона производить прихватку швом 11-Д4-50/250 с наружной стороны стенки.

5. Произвести сварку наружной стороны шва №1. Сварку выполнять в последовательности, указанной в табл. 1 и схеме 1.

Внимание! По мере сварки шва №1 производить установку и прихватку щитов кровли.

Участки шва №1 длиной по 1 м от вертикального стыка №2 довариваются после сварки шва №2.

6. Произвести контроль качества наружной стороны шва №1 на герметичность смачиванием керосином.

7. Произвести сварку шва №1 с внутренней стороны согласно табл. 1 и схеме 1.

8. Произвести обработку кромок вертикального стыка см. сеч. А-А. Обработку производить с углом раскрытия кромок на внутреннюю сторону механическим способом армирования абразивными кругами.

9. После установки стяжных приспособлений произвести сварку шва №2. Сварку выполнять послойно двумя сварщиками одновременно участками ℓ=270 мм согласно схеме 2.

После сварки 2х слоев с внутренней стороны произвести выборку дефектов корня шва с наружной стороны и сварку корневого шва с наружной стороны.

Внимание! Участок шва №2, примыкающий к днищу (ℓ=300 мм) не доваривать.

10. Произвести доварку шва №1 и №2 согласно схеме 3.

11. Произвести контроль качества швов №1; 2 100% внешним осмотром.

Шов №1 проверить на герметичность с внутренней стороны методом вакуумирования при перепаде давления 500÷540 мм рт. ст. Шов № 2 проверить методом радиографии в объёме 100% протяженности.

Привязан:				ТП 704-1-254 с. 92			ПМ
			Нач.отд. Лубянов	Разработка стальной вертикальных цилиндрических для хранения мазута емкостью 100 куб. м	Стадия	Лист	Листов
			Гл.спец. Рахин 11.91		РП	32	
			Ст.инж. Чернышов	Сварка стенки (начало)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
			Инжинж. Ганнова 11.91				
Инв.№			Инж. Дышина				

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Последовательность работ по сварке при разворачивании рулона стенки

Таблица 1

Порядковый номер операции	Содержание работ	Эскиз
1	Начало разворачивания рулона стенки L=3,0м и прихватка с наружной стороны 11·Δ4·50/250 на длине 2,0 м	
2	Продолжение разворачивания рулона стенки, прихватки с днищем. Установка и прихватка начального щита крыши и начала сварки шва №1	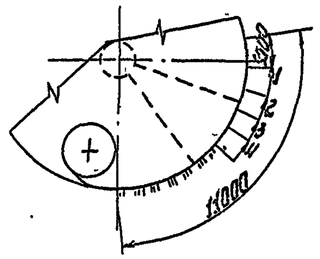
3	Окончание разворачивания рулона прихватки и сварки шва №1 с наружной стороны, установки и прихватки щитов крыши. Обработка кромок и сварка шва №2	
4	Доварка участков шва №1 (l=2,0 м) и шва №2 (l=0,3м)	
5	Сварка шва №1 с внутренней стороны	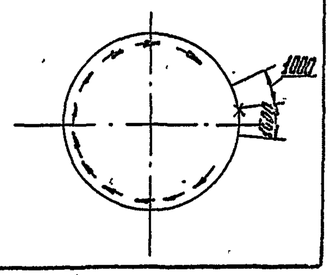

Характеристика монтажных сварных соединений стенки, стенки с днищем

Номер шва	Сечение шва и размеры	Тип шва	Положение шва	Толщина соединяемых деталей, мм	Длина одного шва, м	Масса н. м., кг	Расход электродов марки УОНИ 13/45, кг	
							Ф3,0 мм	Ф4,0 мм
1		13-Δ4	Нижнее	5+4	32,8	8,73	7,0	10,5
2		С23	Вертикальн.	5+5 4+4	1,5 1,5	0,54 1,88	1,1 3,8	– –
Итого:							12,0	14,0

Указание

Анкерное крепление стенки см. чертежи КМ

Привязан:				ТП 704-1-254 с. 92		ПМ
Инв. №	Нач. отд. Лобуанов; Гл. инж. Розин; Гл. спец. Чернышов; Н. конт. Иванова; Инж. Ушина			Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб. м. Сборка стенки (окончание)	Стадия: РП; Лист: 33; Листов:	Гипрон. Трест монтаж г. Москва

25610-06 35

Монтажные сварные соединения крыши





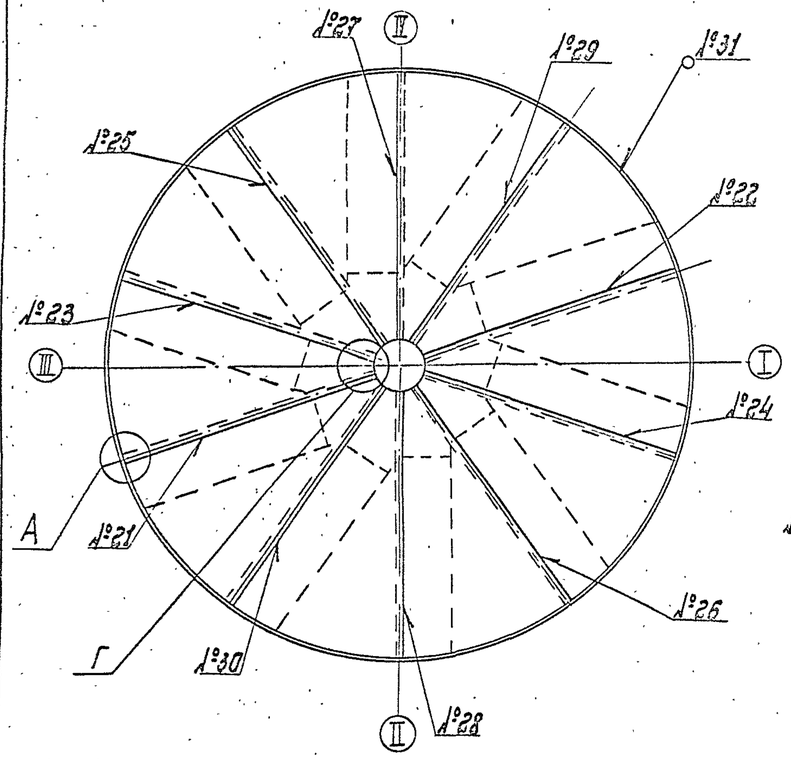

А

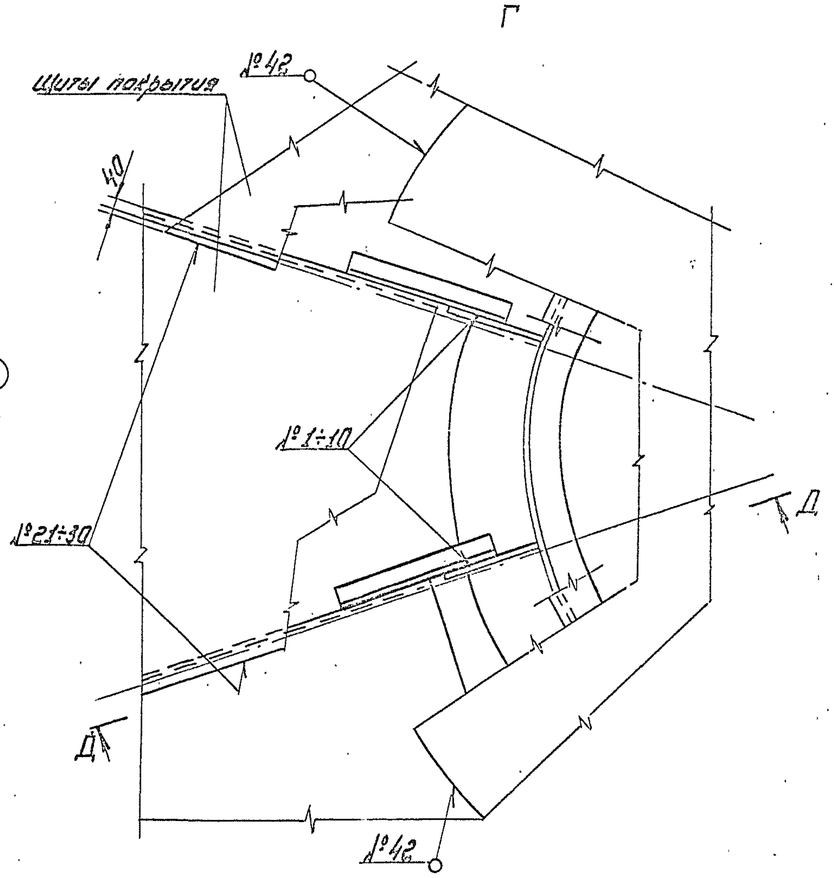

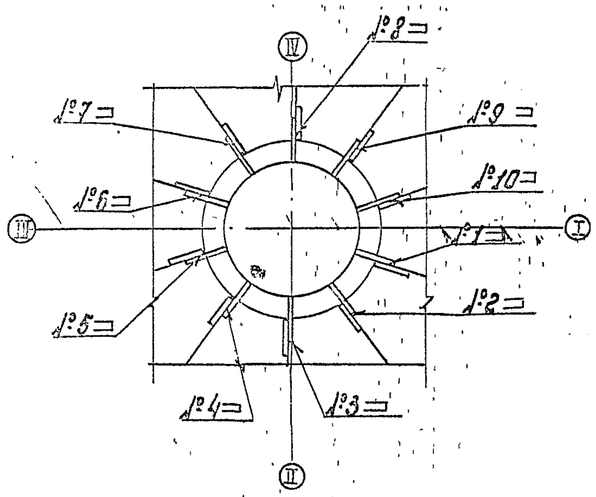

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Сборку элементов конструкции крыши выполнять в соответствии с технологией монтажа, стр.22

2. Прихватку и сварку всех швов производить способом ручной электродуговой сварки электродами типа Э-42А марки УОНИ 13/45 диаметром 3,0 и 4,0 мм

3. Произвести прихватку стыков №1÷30 и сварку швов №1÷20. Прихватку стыков №21÷31 выполнять последовательно по мере разворачивания рулона стенки и установки щитов в соответствии со схемой 1.

4. Произвести контроль швов №1÷20 и прихваток стыков №21÷31 100% внешним осмотром и измерением

5. Произвести сварку швов №21÷31. Сварка швов №21÷31 выполнять одновременно двумя сварщиками схемы 2.

При сварке радиальных швов №21÷30 произвести доварку листов покрытия на участке 300 мм не сваренных на заводе-изготовителе щитов.

6. Произвести установку накладок 350×100×8 и покрытия центрального щита, прихватку и сварку швов №31÷42.

Сварку кольцевого шва №42 выполнять согласно схемы

7. Произвести контроль швов №21÷42 100% внешним осмотром и измерением.

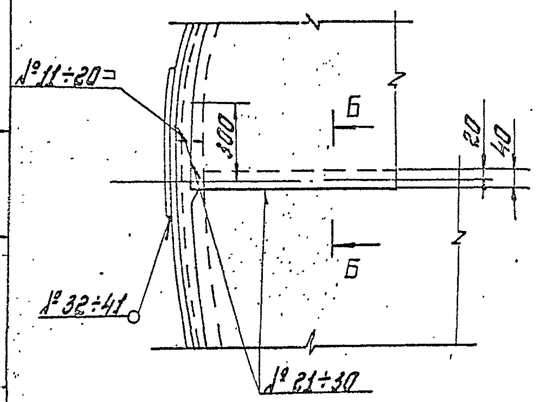

Б-Б



Д-Д

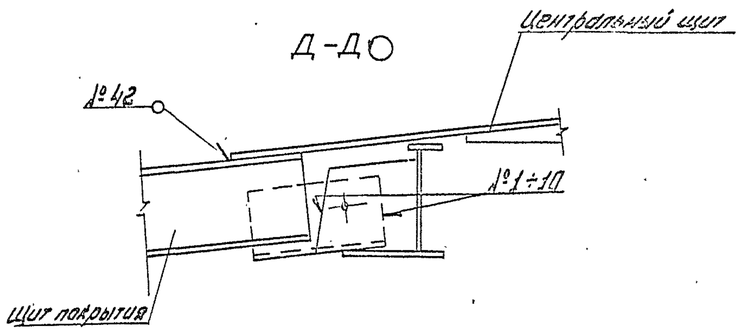

Привязан:					ТП 704-1-254 с. 92 ПМ		
			Инж.	Первова	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб.м.	Стадия	Лист	Листов
			Гл.спец.	Розин		РП	34	
			Гл.спец.	Ивинский	Сварка крыши (начало)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
			Нач.отд.	Пимова				
Инв.№			Нач.	Зашина				

25610-06 36

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Характеристика монтажных сварных соединений крыши

Таблица

Номер шва	Сечение шва и размеры	Тип шва	Положение шва	Толщина соединяемых деталей, мм	Кол. швов	Длина одного шва, м	Масса м. м, кг	Расход электродов типа Э-42А марки УОНИ-13/45, кг: ф3,0	ф4,0
1-10		Н2-∆8	Вертикальное нижнее	8+8	10	0,53	4,7	3,0	6,4
11-20		С17	Вертикальное нижнее	5,5+5,5	10	0,09 0,06	0,55	1,0	1,2
21-30		Н1-∆4	Наклонное	4+4	10	4,2	5,6	4,0	7,2
31		Н1-∆4	Нижнее	4+5,5	1	33,0	4,4	3,0	5,8
32-41		Н1-∆4	Нижнее Вертикальное Потолочное	8+4	10	0,9	1,2	1,0	1,4
42		Н1-∆4	Нижнее	4+4	1	8,4	1,2	1,0	1,4
						Всего:	13,0		23,4

Схема 1. Прихватка стыков № 21÷31

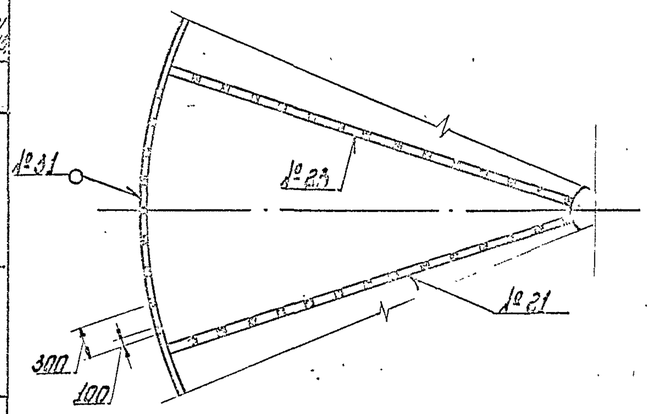

Схема 3. Сварка кольцевого шва № 42

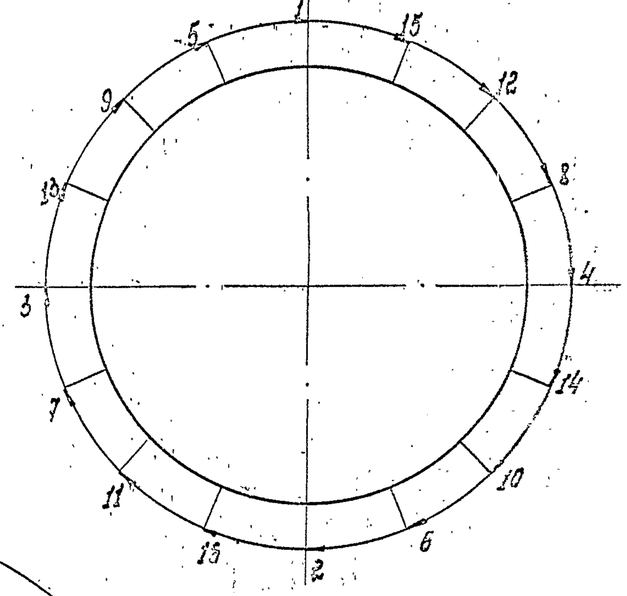

Схема 2. Сварка швов 21÷31

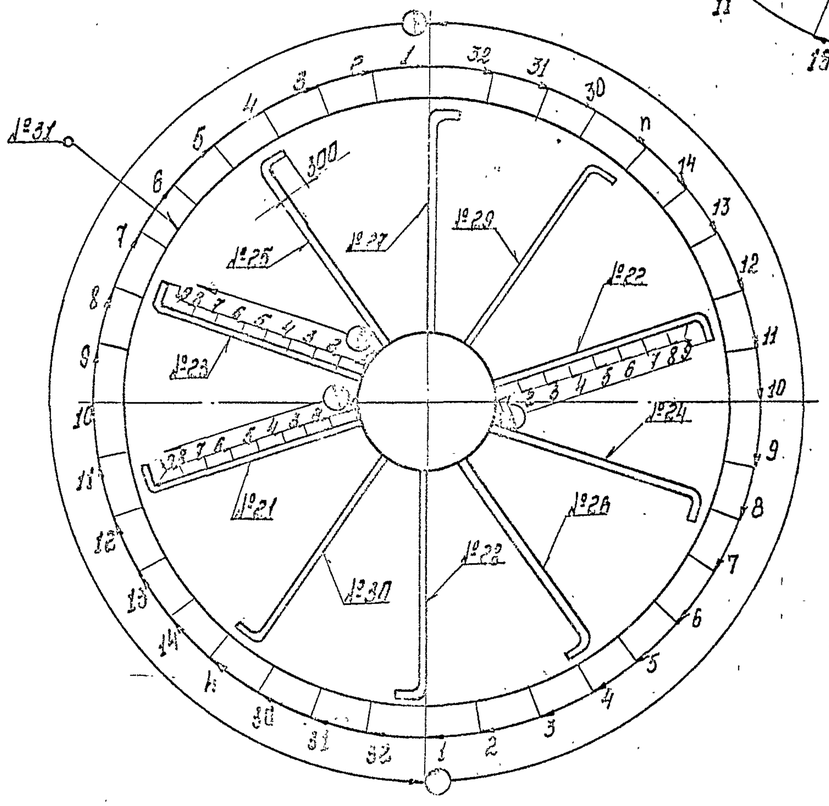

Условные обозначения:

- Сварной шов
- Размещение сварщика и общее направление сварки
- Номер технологического участка шва и направление его сварки

Привязан:					ТП 704-1-254 с.92			ПМ
			Нач. отд.	Кравцов				
			Гл. спец.	Рохин	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м.	Стадия	Лист	Листов
			Гл. спец.	Чернышов		ПП	35	
			Н. контр.	Панова	"Сварка крыши (окончание)"	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
Инв. №			Инж.	Жукова				

25610-06 37

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Монтажные сварные соединения врезок люков и патрубков.

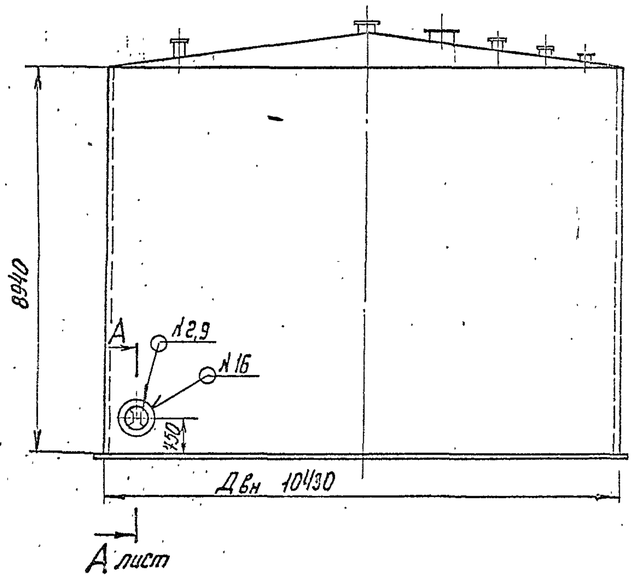

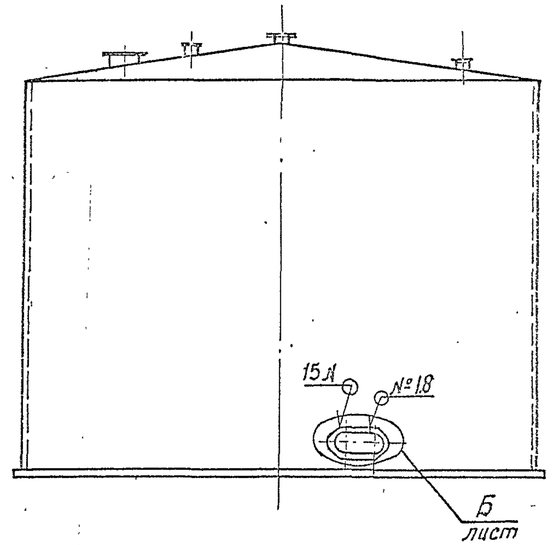

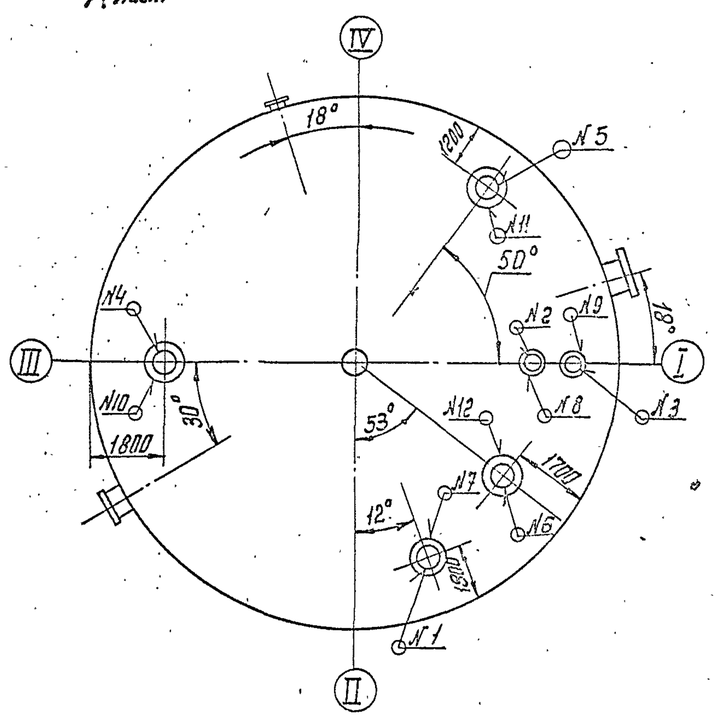

Врезка патрубков в стенке резервуара

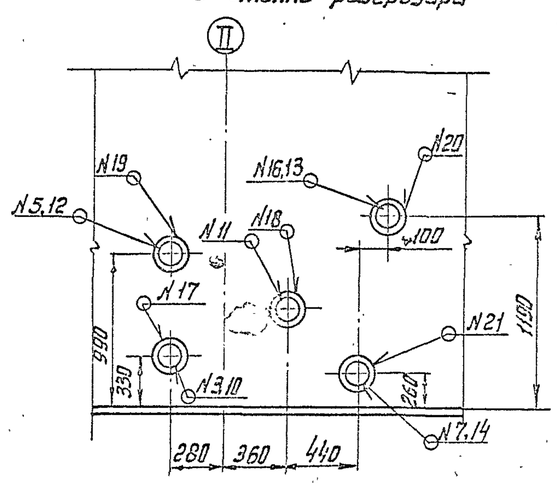

Порядок работ

1. Произвести разметку и вырезку отверстий под установку люков и патрубков, вырезку отверстий выполнять кислородной резкой с учетом припуска; не менее 4,0 мм на последующую механическую обработку торцов реза и зазора под сварку. Обработать армированными абразивными кругами торцы резов со снятием слоя металла ~2,0 мм

2. Прихватку и сварку швов люков и патрубков выполнять ручной электродуговой сваркой электродами типа Э42А марки УОНИ 13/45 диаметром 3,0 и 4,0 мм.

3. Произвести прихватку труб патрубков и люков прерывистым швом Т1-Δ4 50/250.

4. Произвести сварку швов №1-12 в покрытии резервуара. Сварку выполнять технологическими участками при послойном заполнении катета.

5. Произвести контроль качества выполненных швов 100% внешним осмотром и измерением.

6. Произвести сварку швов №1÷7 в стенке резервуара.

7. Проверить швы №1÷7 100% внешним осмотром, измерением и на геометричность смачиванием керосина.

8. Произвести сварку швов №8÷21 в стенке резервуара.

9. Проверить швы №8÷21 100% внешним осмотром и измерением.

10. Проверить герметичность швов №1÷12 в покрытии резервуара методом создания избыточного давления воздуха до 100 мм вод. ст. при гидроиспытаниях резервуара, с последующим определением мест неплотностей обмыливанием швов.

11. Установить, прихватить и сварить ограждения швами Т1-Δ4 и Н1-Δ4.

Привязан:				ТП 704-1-254 с. 92			ГПИ
	Нач отд.	Пузиков		Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб. м.	Ст.	Лист	Листов
	Гл спец.	Росин	11.91		РП	36	
	Гл инж.	Чернышов		Сварка люков, патрубков и ограждений (начало)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
	Н. контр.	Панова					
Инв. №	Инж.	Ильякова					

25610-06 38

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Типовое соединение патрубков

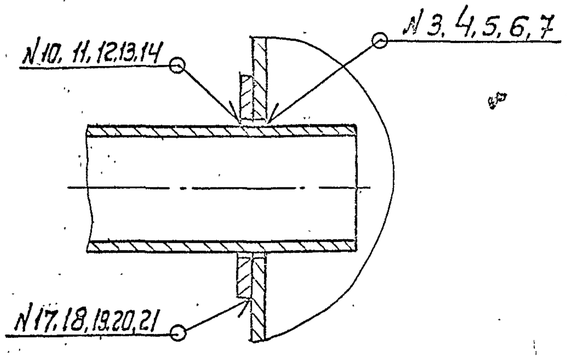

Б лист

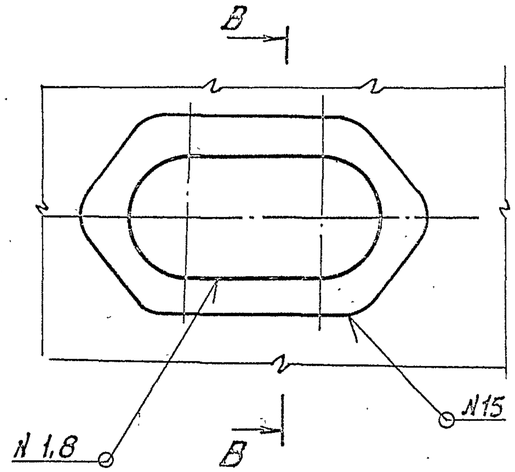

Схема сварки швов № 2, 9, 16 в стенке резервуара

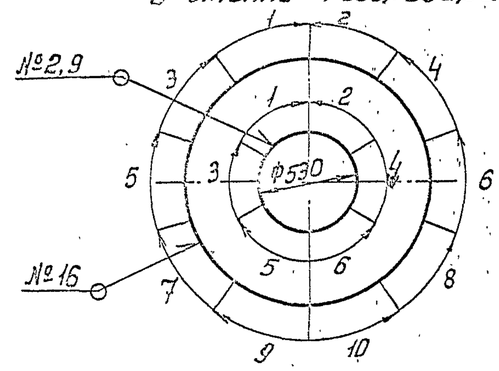

Схема сварки швов № 3, 4, 10, 11, 17, 18, в стенке резервуара

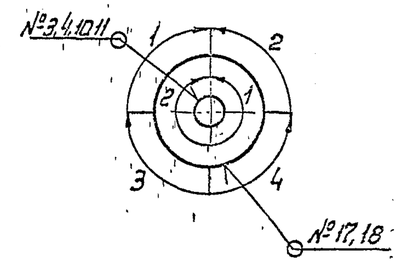

А-А лист

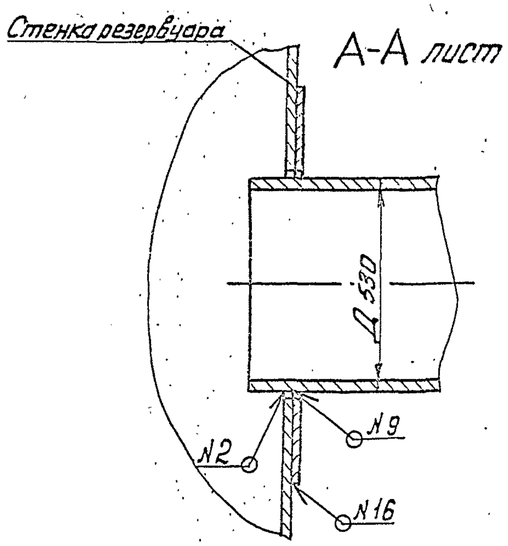

В-В

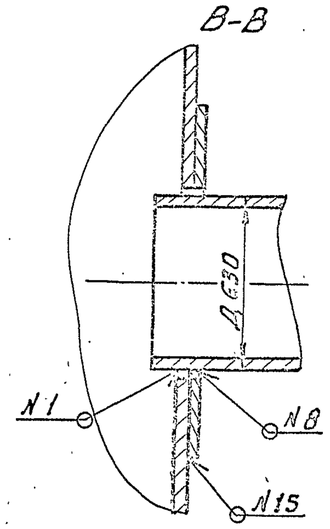

Схема сварки швов № 1, 8, 15 в стенке резервуара

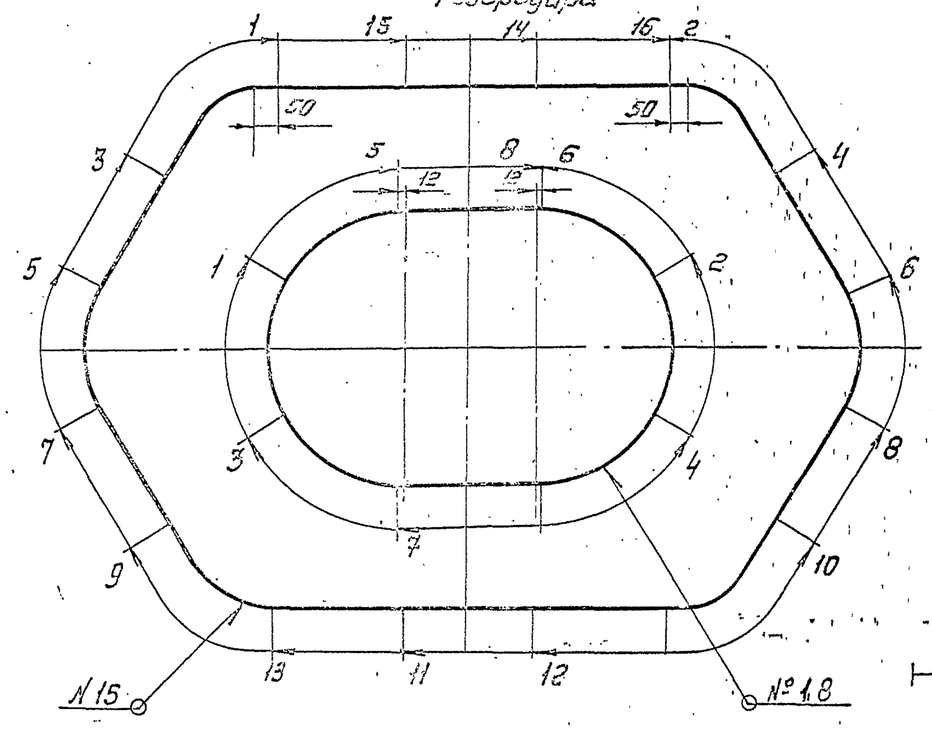

Схема сварки швов № 1, 7, в покрытии резервуара

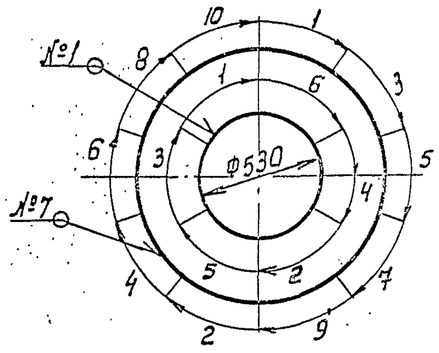

Схема сварки швов № 2÷5 и № 8÷11 в покрытии резервуара



Условные обозначения

3 — порядковый номер участка и направление сварки

Приблуан:				ТП 704-1-254 с. 92 ПМ			
	Нач. отд.	Парфанов		Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб. м.	Стадия	Лист	Листов
	Гл. спец.	Рязкин	11.91		РП	37	
	Гл. спец.	Чернышов		Сварка люков, патрубков и перекрытий (продолжение)	Гипронефтеспецмонтаж г. Москва		
	Н. контр.	Панова					
Инв. №	Инж.	Янькова					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

25610-06 39

Характеристика монтажных сварных соединений люков и патрубков

Номер шва	Сечение шва и размеры, мм	Тип шва	Положение шва	Толщина свариваемых деталей, мм	Длина одного шва, м	Масса наплавленного металла, кг	Расход электродов УОНИ 13/45, кг	
							ф3,0 мм	ф4,0 мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Люки и патрубки в покрытии резервуара								
1		Т1-△4	Нижнее	5+4	1,54	0,21	0,12	0,3
2,3		Т1-△4	Нижнее	4+6	0,499	0,133	0,1	0,17
4		Т1-△4	Нижнее	4+4	1,54	0,21	0,42	—
5,6		Т1-△4	Нижнее	4+6	2,2	0,6	1,2	—
7		Н1-△4	Нижнее	4+4	3,14	0,42	0,24	0,6
8,9		Н1-△4	Нижнее	4+4	1,0	0,27	0,2	0,34
10		Н1-△4	Нижнее	4+4	3,14	0,42	0,24	0,6
11,12		Н1-△4	Нижнее	4+4	4,4	1,2	0,8	1,6
Люки и патрубки в стенке резервуара								
1		Т1-△5	Вертикальное неповоротное	5+5	2,6	0,51	0,35	0,7
2		Т1-△5	то же	5+5	1,68	0,33	0,26	0,4
3		Т1-△5	—"—	4+5	0,5	0,1	0,2	—

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		Т1-△4	Вертикальное неповоротное	4+5	0,34	0,05	0,1	—
5		Т1-△3	Тоже	3+5	0,18	0,02	0,1	—
6		Т1-△3	—"—	3+5	0,14	0,02	0,1	—
7		Т1-△3	—"—	2+5	0,10	0,01	0,1	—
8		Т6	—"—	5+5	2,6	0,83	0,7	1,0
9		Т1-△5	—"—	5+5	1,68	0,33	0,26	0,4
10		Т1-△4	—"—	4+5	0,5	0,07	0,14	—
11		Т1-△4	—"—	4+5	0,34	0,05	0,1	—
12		Т1-△3	—"—	3+5	0,18	0,02	0,1	—
13		Т1-△3	—"—	3+5	0,14	0,02	0,1	—
14		Т1-△3	—"—	2+5	0,10	0,01	0,1	—
15		Н1-△5	—"—	5+5	5,2	1,2	1,2	1,4
16		Н1-△5	—"—	5+5	3,14	0,68	0,46	0,9
17					1,0	0,22	0,1	0,3
18					0,7	0,15	0,1	0,2
19					0,4	0,09	0,1	—
20					0,35	0,08	0,1	—
21					0,3	0,07	0,1	—
Соединения элементов площадок и ограждений по чертежам КМ шва Н1-△4							10	7,5
					Итого:		18,2	16,5

Альбом 6

Типовой проект 704-1-254 с. 92

Подп. и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

Н.контр.	Панова		
Нач.	Пинкова		

ТП 704-1-254 с. 92 ПМ

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 700 куб. м.

Сборка-лукой патрубков и ограждений (продолжение)

Стадия	Лист	Листов
РП	38	

Гипронефтеспецстрой г. Москва
